


- 凡例
- : 西側増築工事
 - : 東側増築工事
 - : 改修工事
 - : 先行工事
 - : 仮設室工事


【凡例】

- 仮囲い(成形鋼板)
- ガードマン(常駐)
- 各種動線
 - 通学路
 - 給食運搬車ほか
 - 工事車両
- 足場

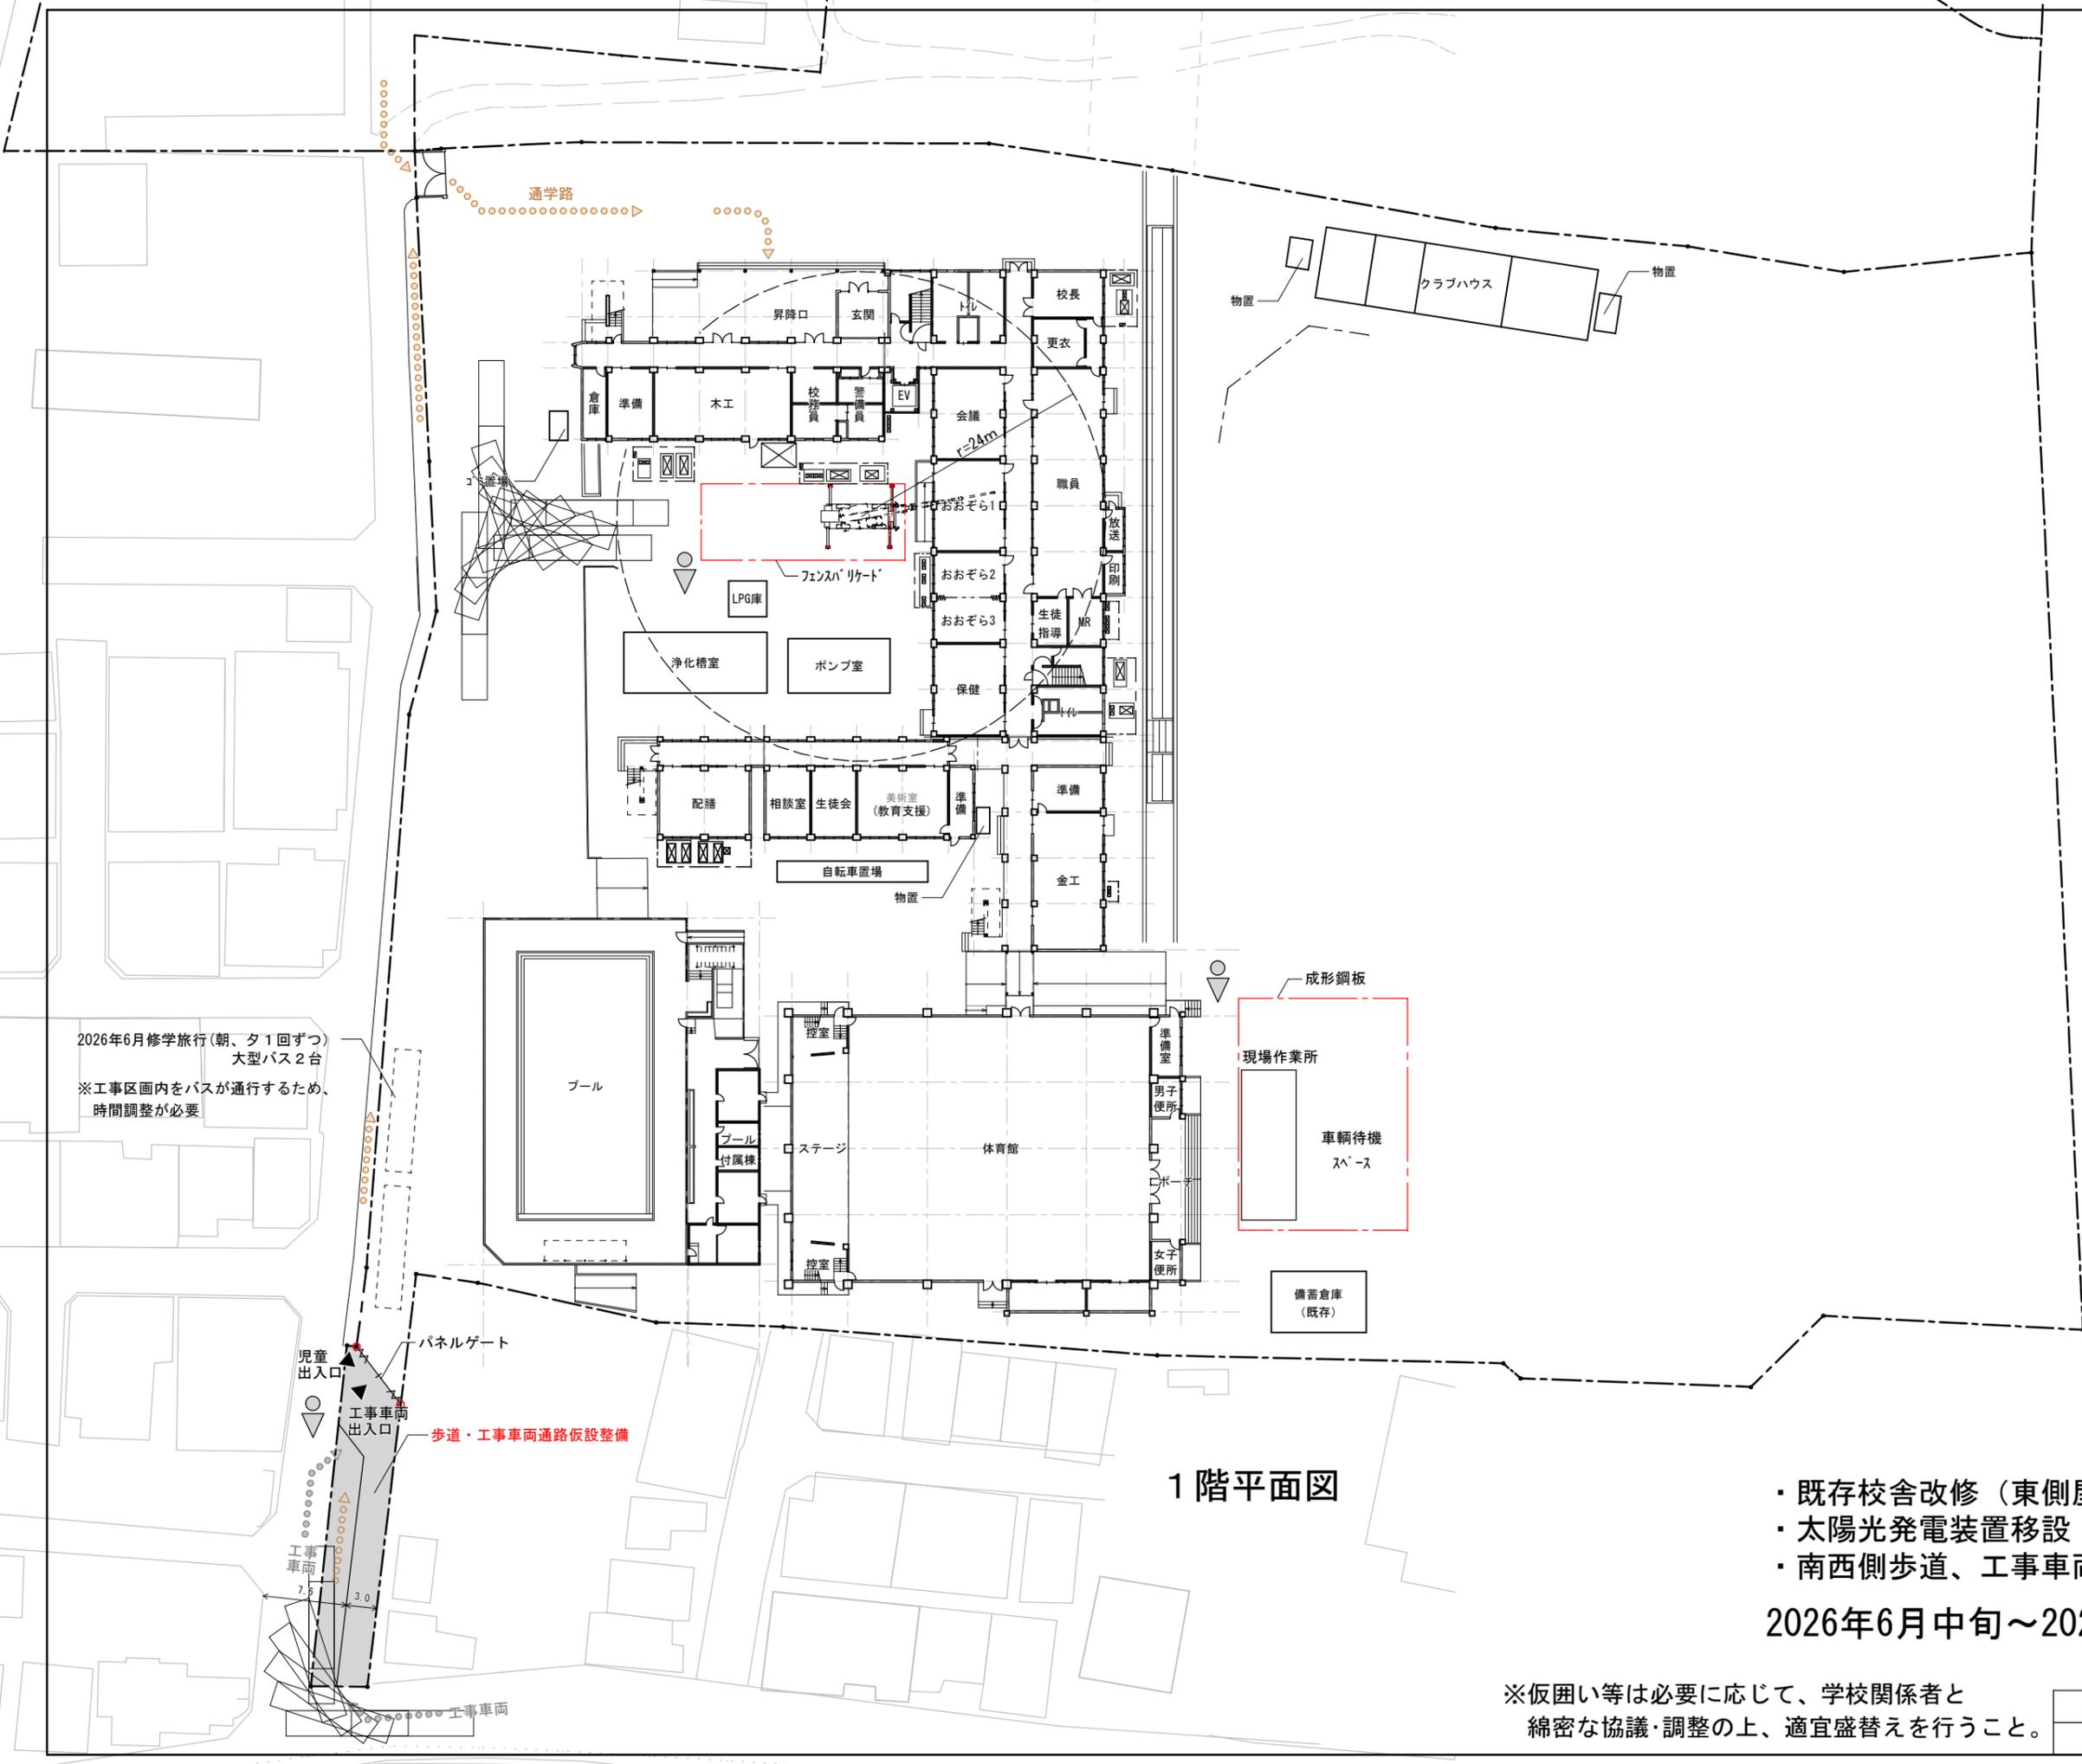


- ・既存校舎改修(東側屋上防水)
 - ・太陽光発電装置移設
 - ・南西側歩道、工事車両通路仮設整備
- 2026年6月中旬～2026年11月中旬(5ヶ月)

※仮囲い等は必要に応じて、学校関係者と綿密な協議・調整の上、適宜盛替えを行うこと。

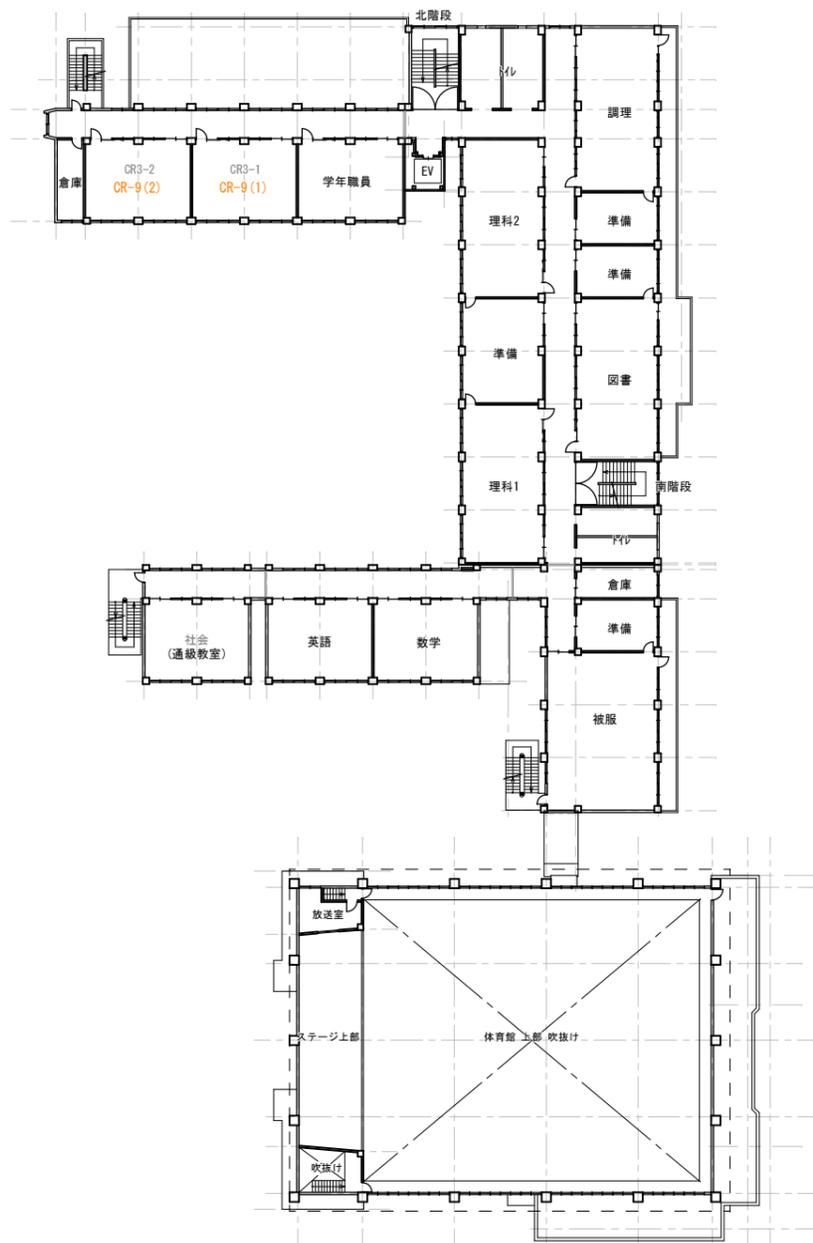


2階平面図

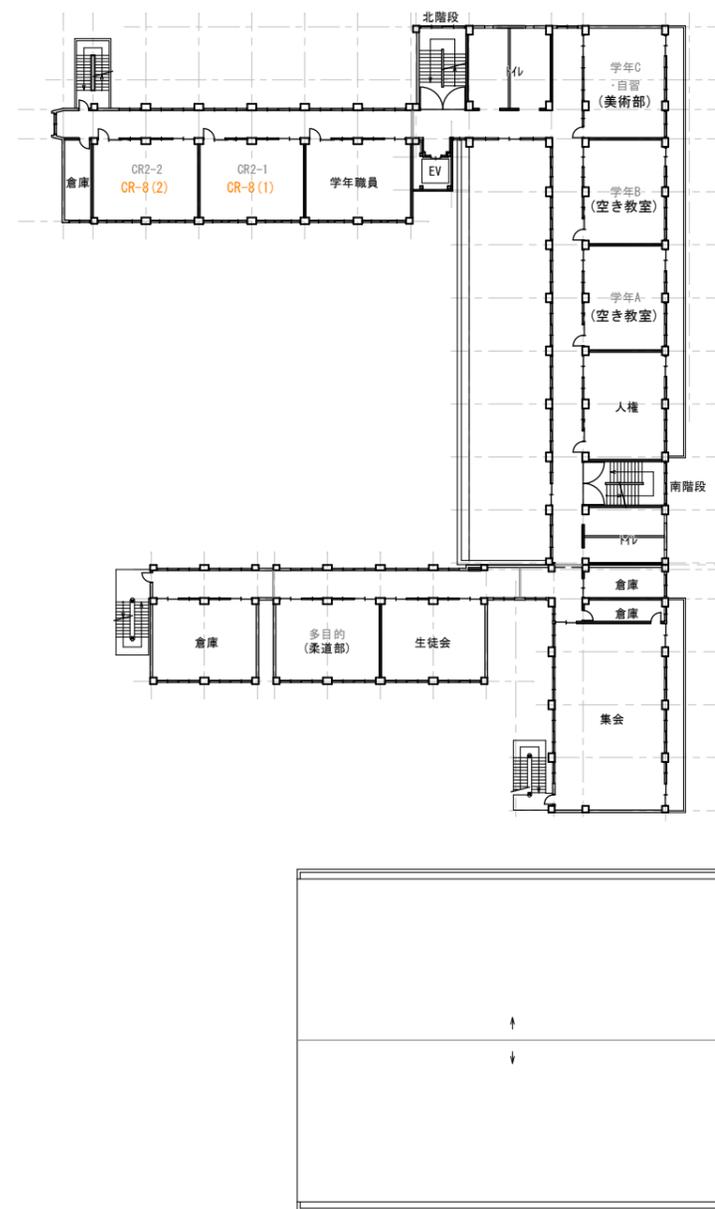


3階平面図


- ・ 既存校舎改修（東側屋上防水）
- ・ 太陽光発電装置移設
- ・ 南西側歩道、工事車両通路仮設整備

2026年6月中旬～2026年11月中旬（5ヶ月）



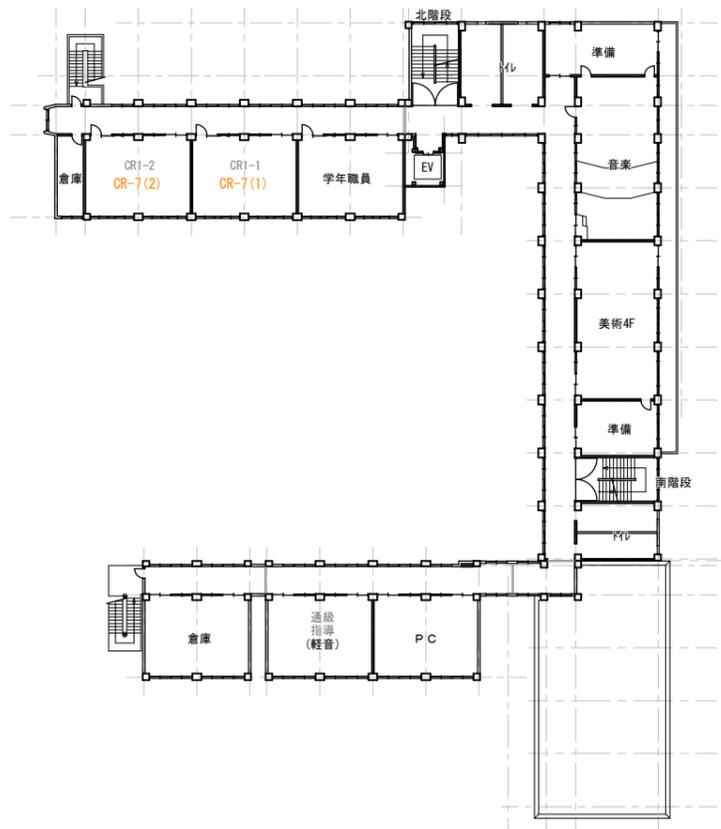


4階平面図

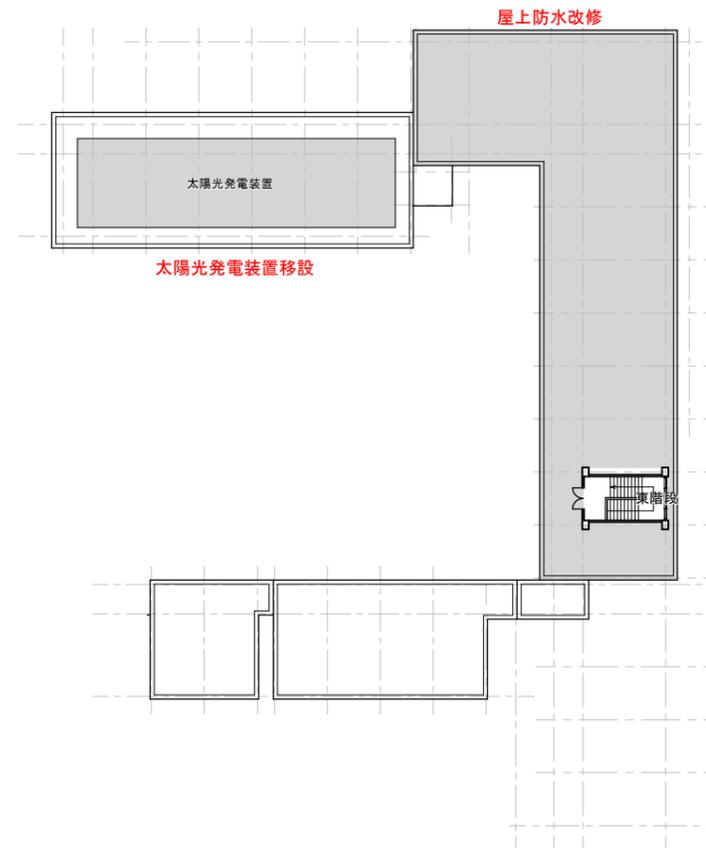

R階平面図

- ・既存校舎改修（東側屋上防水）
- ・太陽光発電装置移設
- ・南西側歩道、工事車両通路仮設整備




2026年6月中旬～2026年11月中旬（5ヶ月）

【凡例】

- 仮囲い(成形鋼板)
- ガードマン(常駐)
- 各種動線
- 通学路
- 給食運搬車ほか
- 工事車両
- 足場

- 汚水系統
- 雑排水系統
- 給水系統
- × × × 盛替(撤去)部分

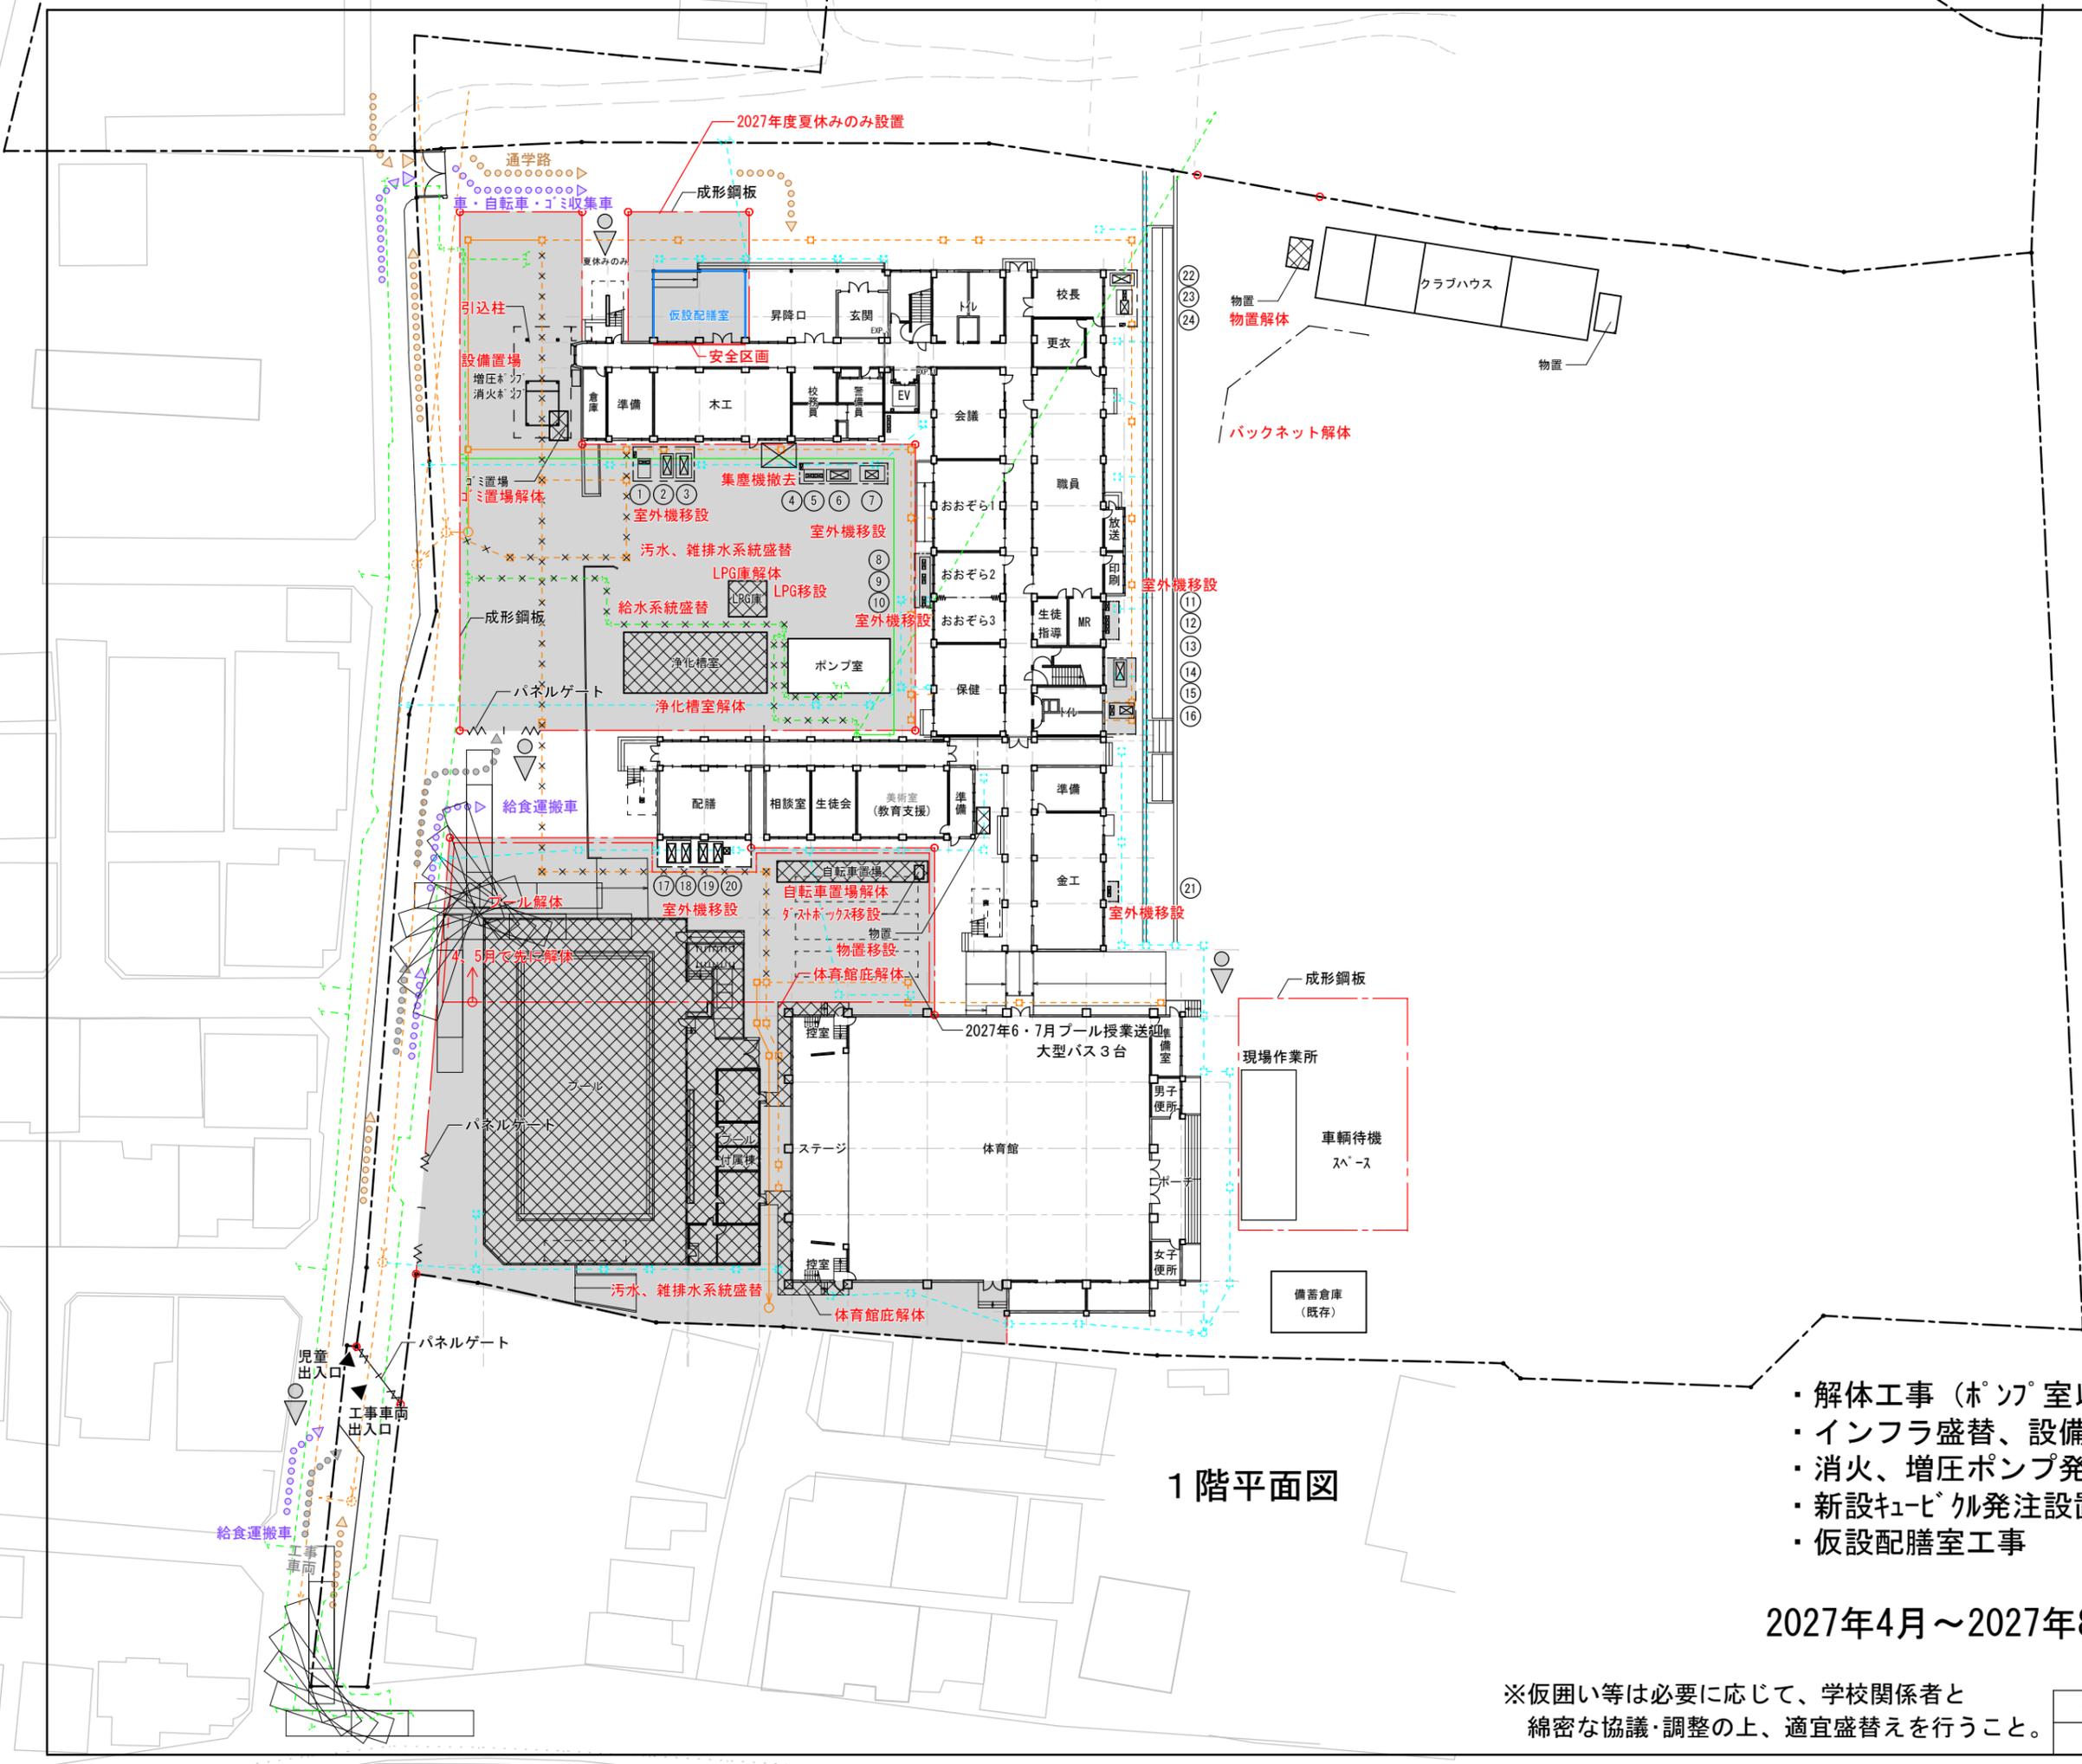


1階平面図


- ・解体工事(ポンプ室以外)
- ・インフラ盛替、設備置場工事
- ・消火、増圧ポンプ発注設置
- ・新設キュービクル発注設置
- ・仮設配膳室工事

2027年4月～2027年8月(5ヶ月)

※仮囲い等は必要に応じて、学校関係者と綿密な協議・調整の上、適宜盛替えを行うこと。

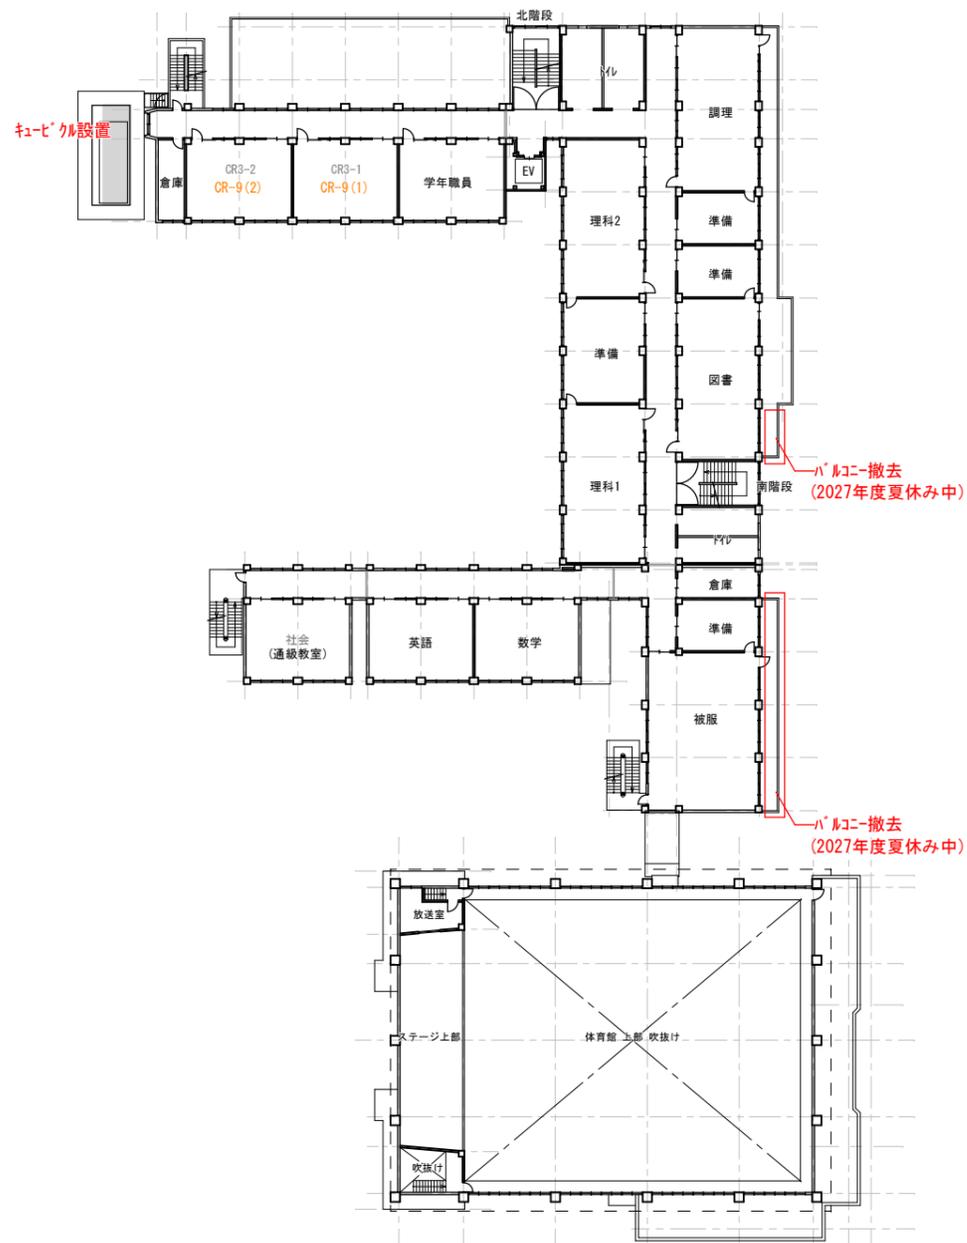


2階平面図

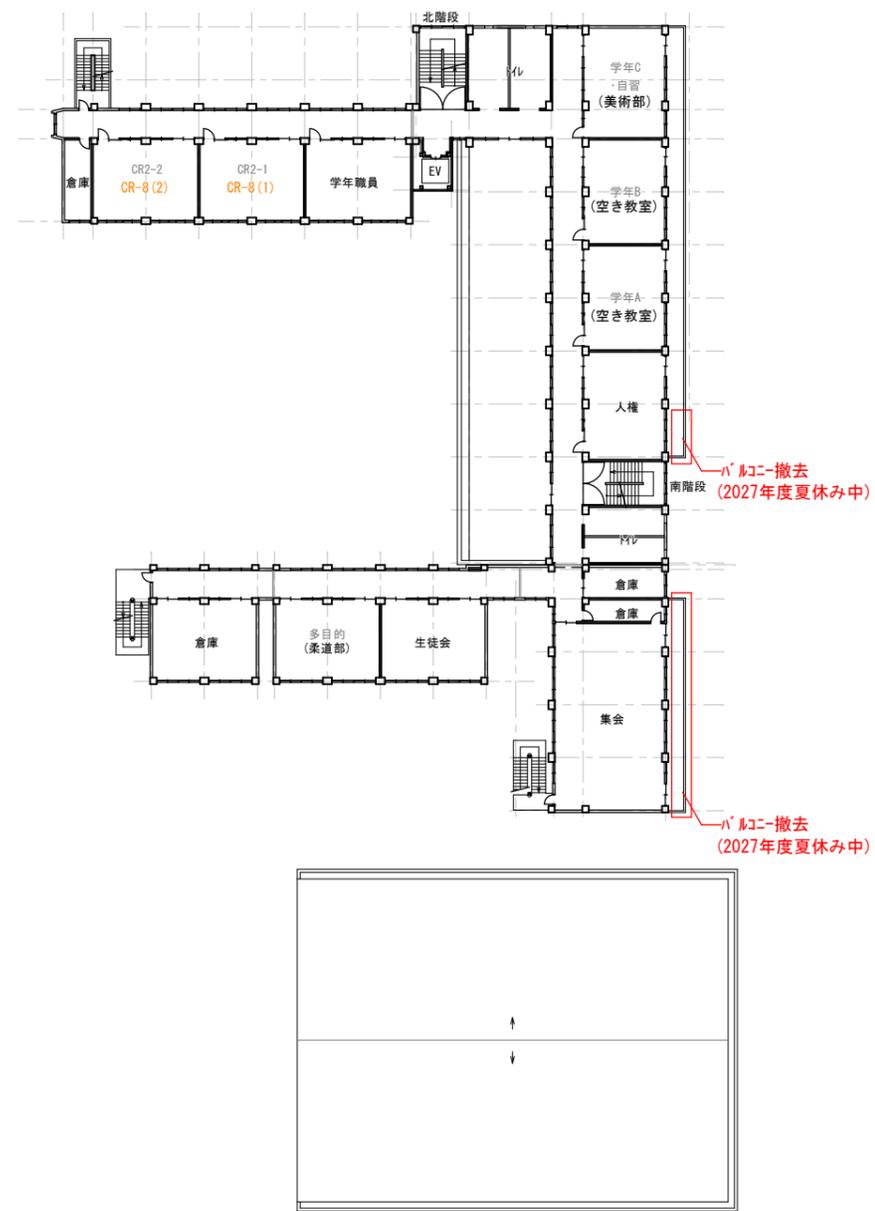


3階平面図


- ・解体工事 (ポンプ室以外)
- ・インフラ盛替、設備置場工事
- ・消火、増圧ポンプ発注設置
- ・新設キュービクル発注設置
- ・仮設配膳室工事



2027年4月～2027年8月 (5ヶ月)

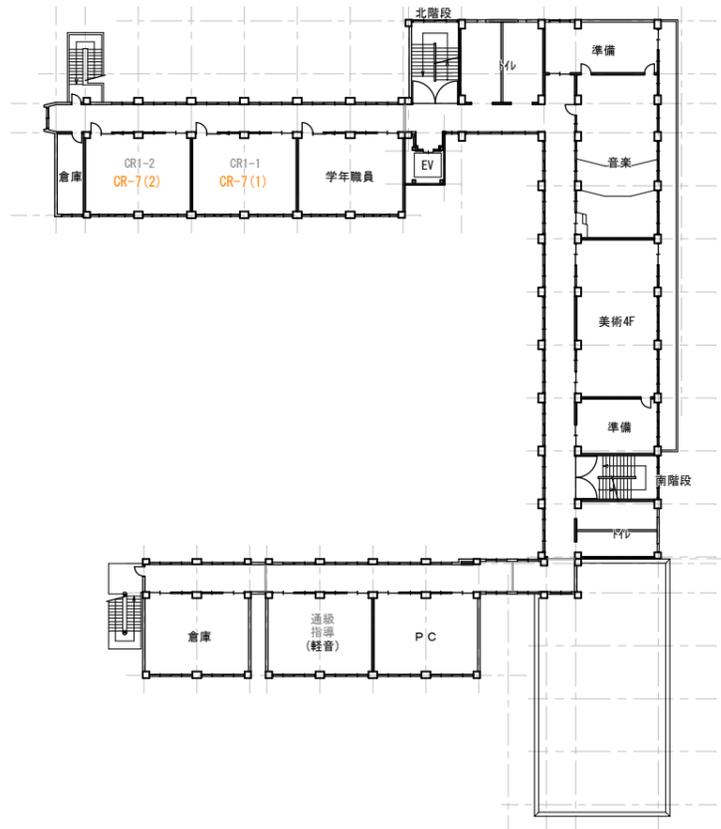

4階平面図

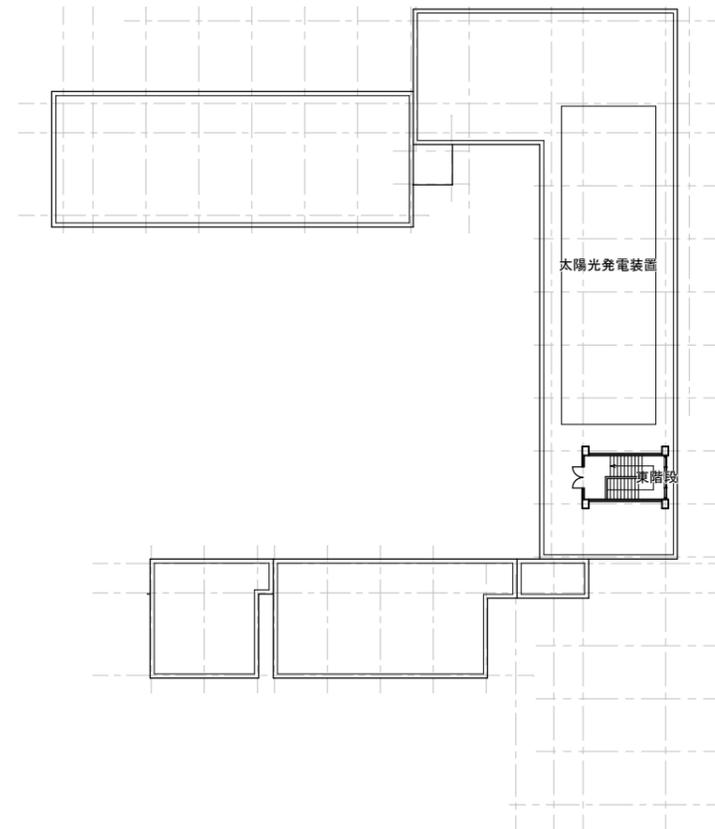

R階平面図

- ・解体工事（ポンプ室以外）
- ・インフラ盛替、設備置場工事
- ・消火、増圧ポンプ発注設置
- ・新設キュービクル発注設置
- ・仮設配膳室工事



2027年4月～2027年8月（5ヶ月）

【凡例】


- 仮囲い(成形鋼板)
- ガードマン(常駐)
- 各種動線
- 通学路
- 給食運搬車ほか
- 工事車両
- 足場

仮移転範囲

機械設備工事での対応


室内機 改修機器リスト

室名	改修内容	既存機器番号
北棟 1階		
仮設配膳室	機器新設	—
金工・木工室	そのまま再利用	—
金工・木工準備室	そのまま再利用	—
東棟 1階		
金工室	機器撤去・再取付	PAC-2
南棟 1階		
配膳室	機器撤去・再取付	BMA-2-1×2

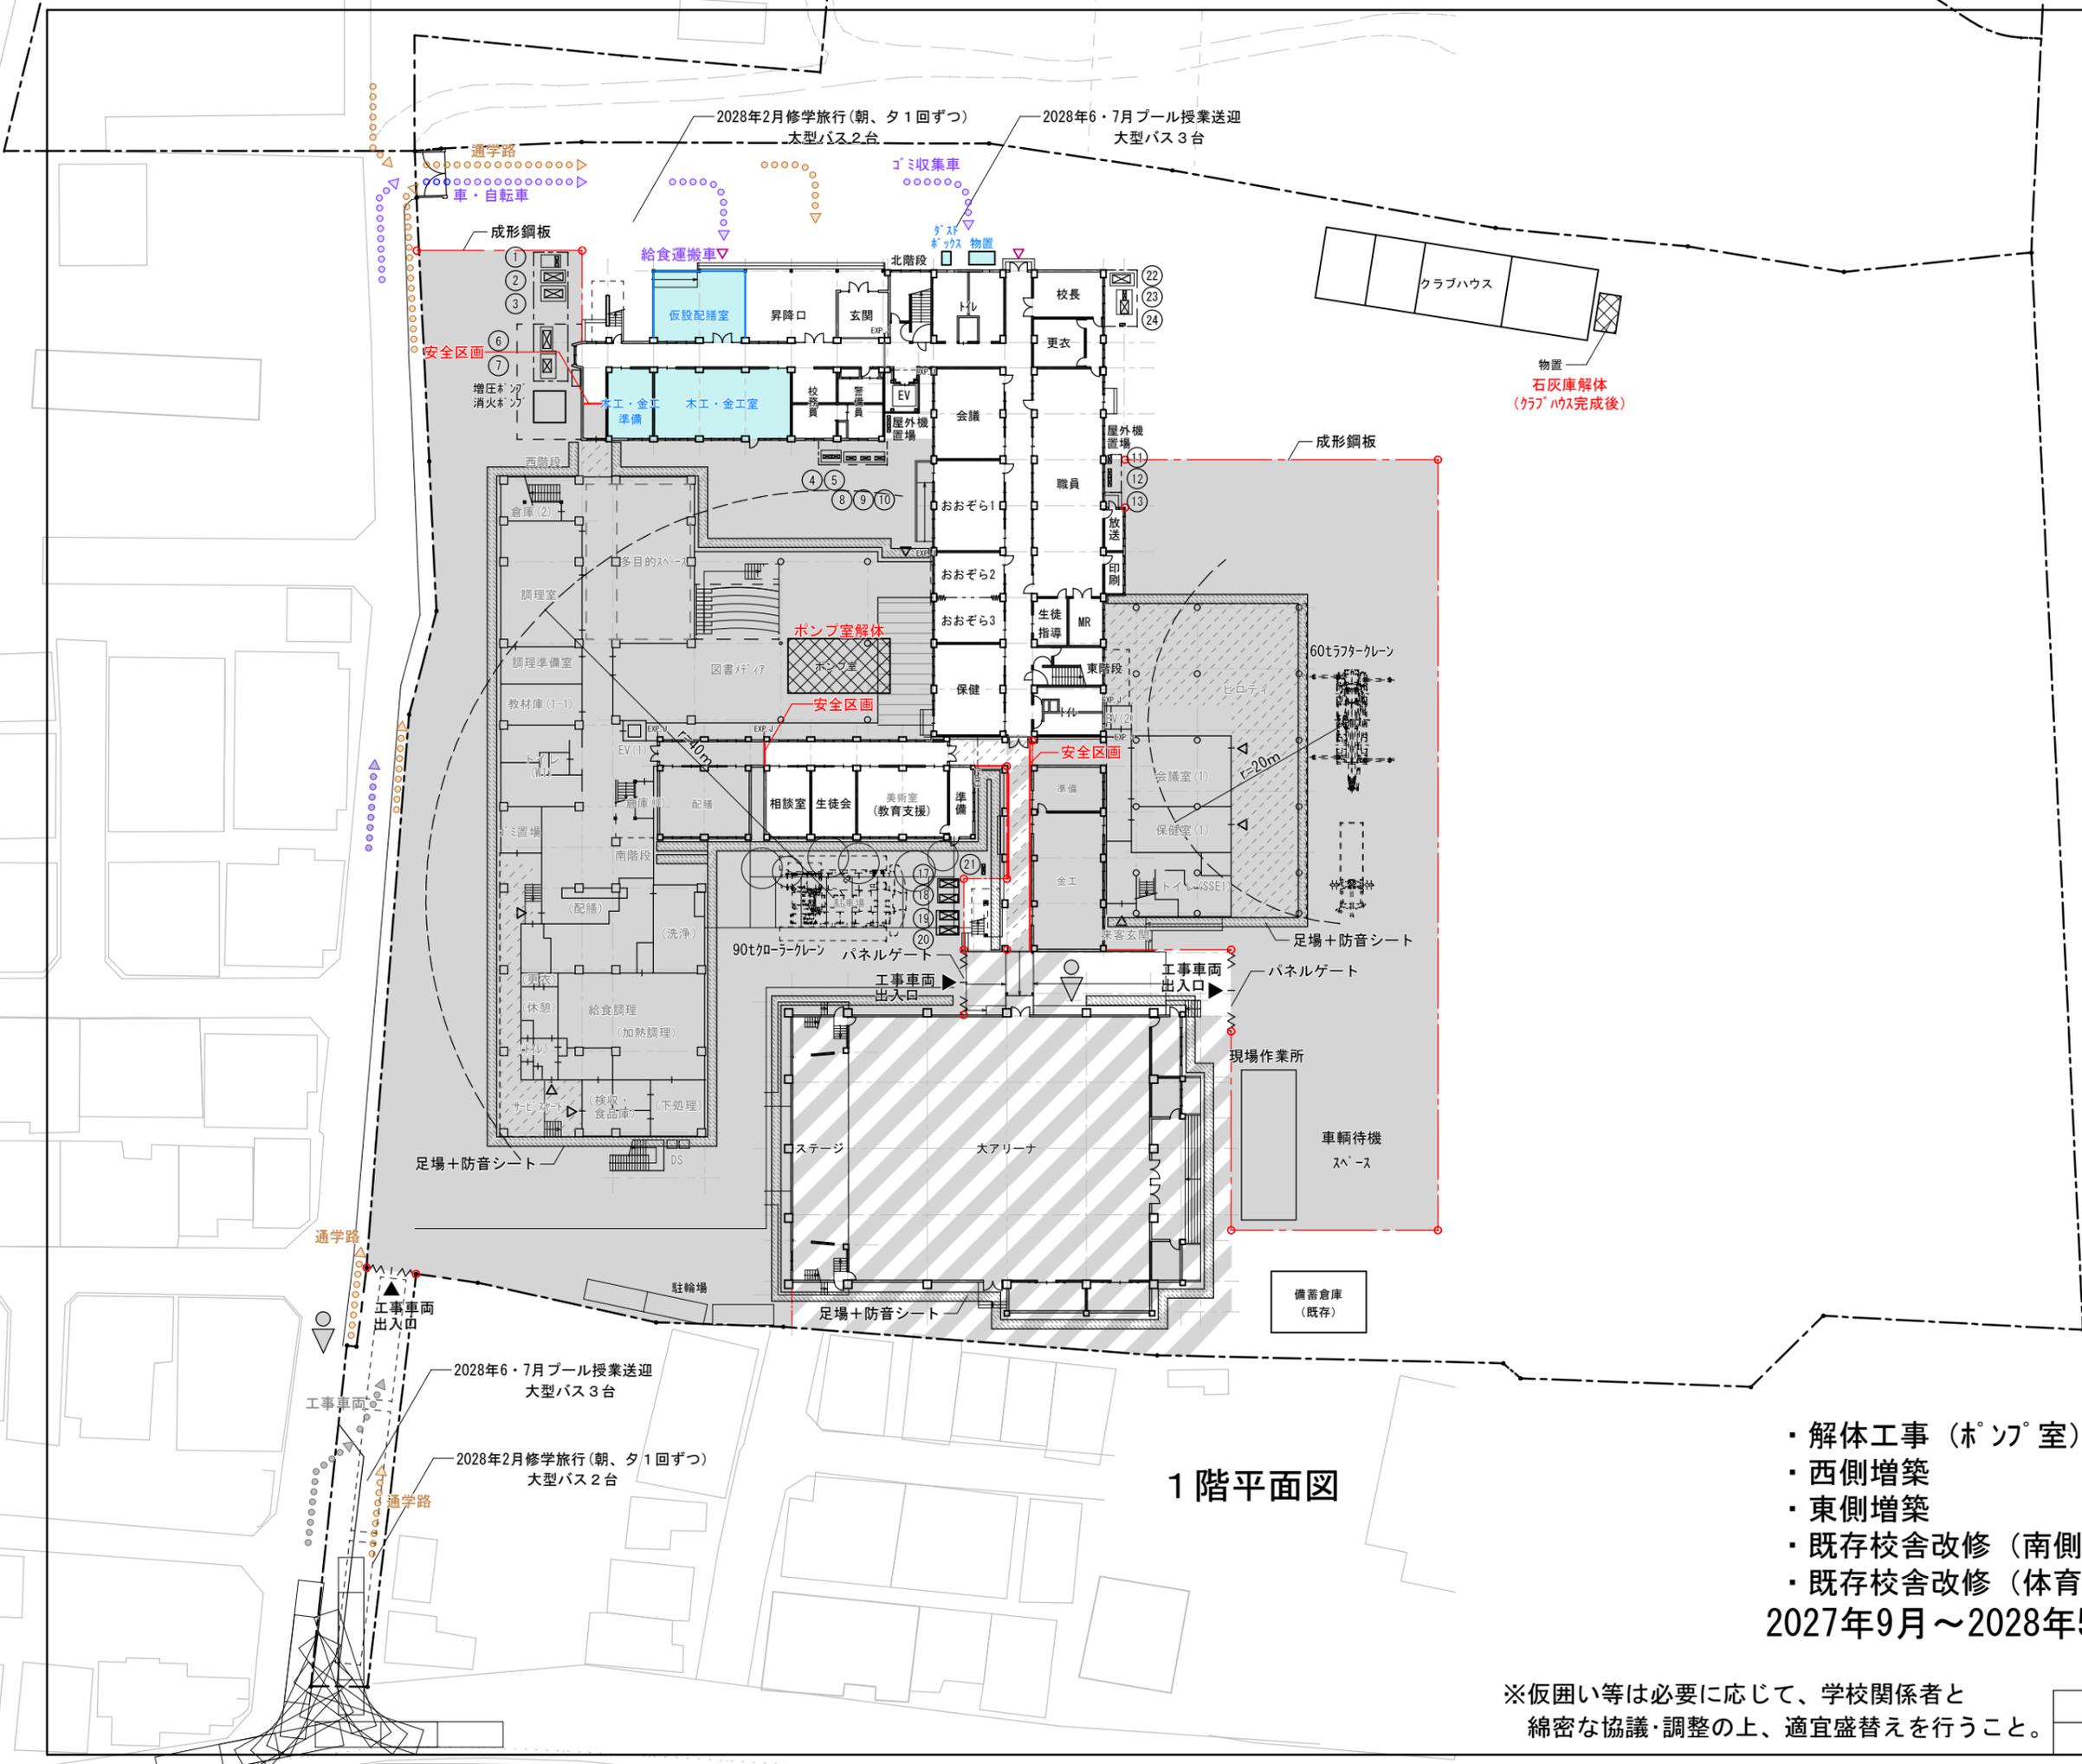

1階平面図

- ・解体工事 (ホップ室)
 - ・西側増築
 - ・東側増築
 - ・既存校舎改修 (南側)
 - ・既存校舎改修 (体育館外部)
- 2027年9月～2028年5月 (9ヶ月)



※仮囲い等は必要に応じて、学校関係者と綿密な協議・調整の上、適宜盛替えを行うこと。

【凡例】


- 仮囲い(成形鋼板)
- ガードマン(常駐)
- 各種動線
- 通学路
- 給食運搬車ほか
- 工事車両
- 足場

仮移転範囲

機械設備工事での対応

室内機 改修機器リスト


室名	改修内容	既存機器番号
北棟 1階		
仮設配膳室	機器新設	—
金工・木工室	そのまま再利用	—
金工・木工準備室	そのまま再利用	—
東棟 1階		
金工室	機器撤去・再取付	PAC-2
南棟 1階		
配膳室	機器撤去・再取付	BMA-2-1×2

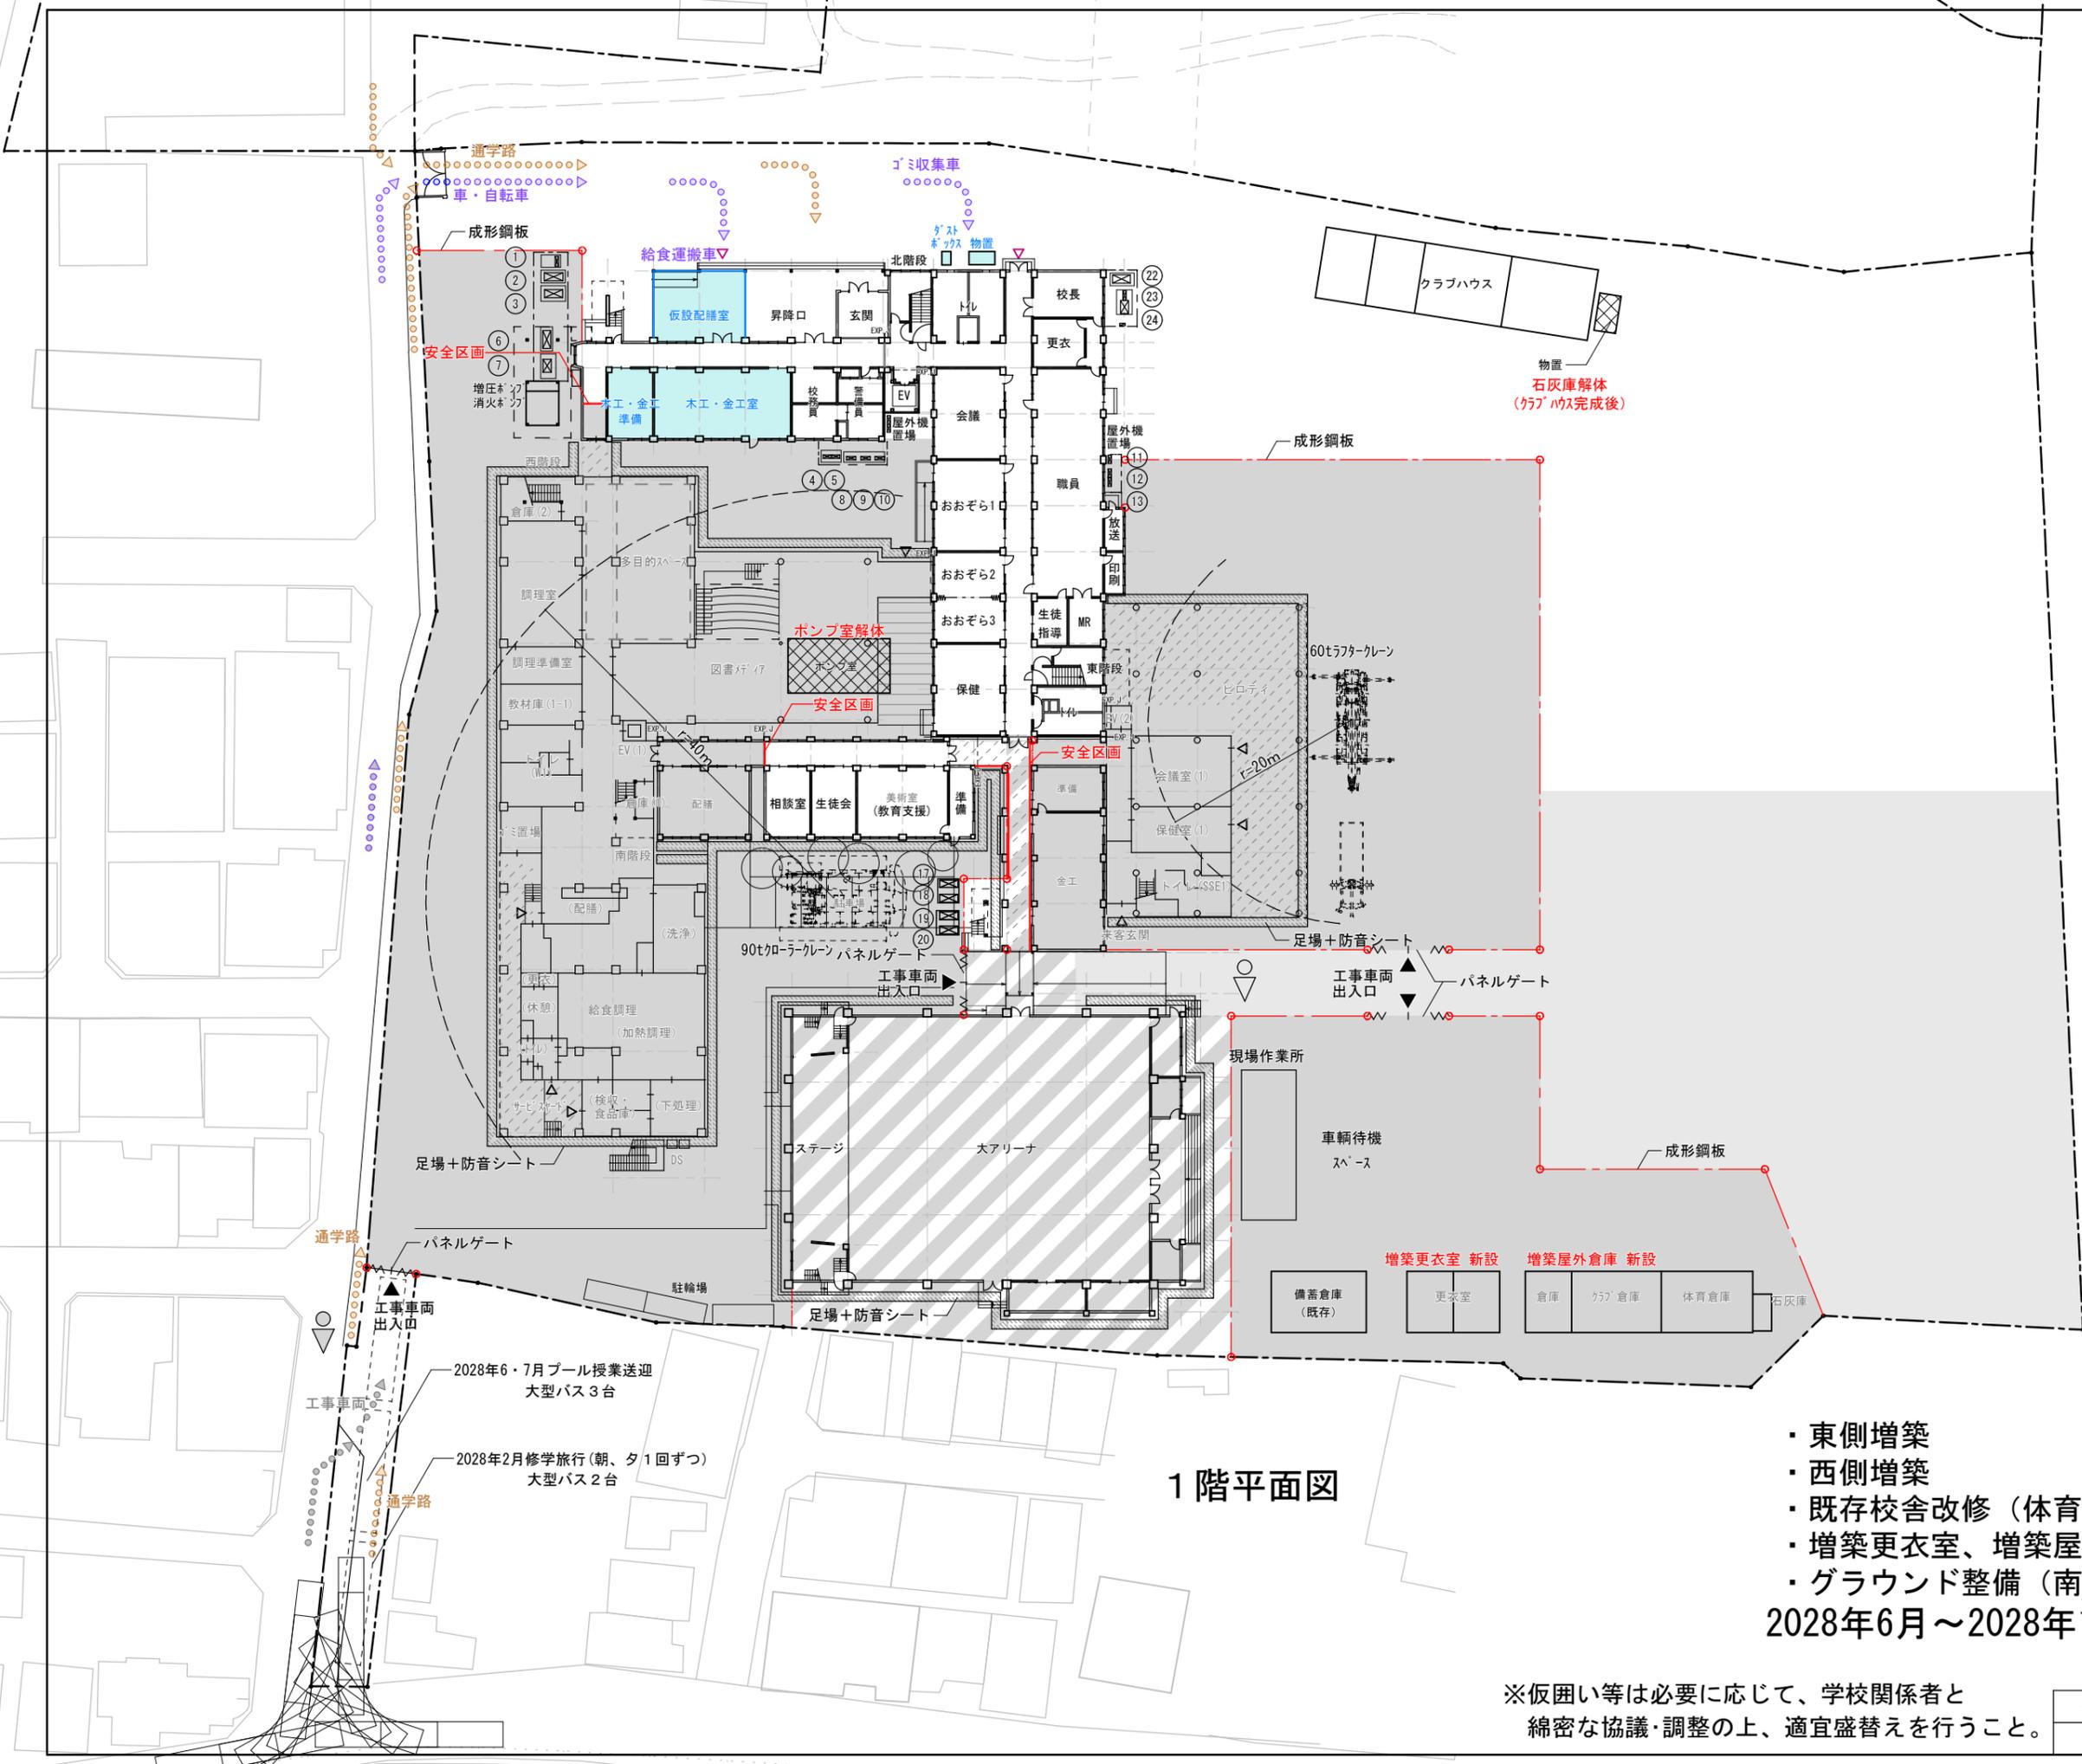

1階平面図

- ・ 東側増築
 - ・ 西側増築
 - ・ 既存校舎改修 (体育館内部)
 - ・ 増築更衣室、増築屋外倉庫新設
 - ・ グラウンド整備 (南側)
- 2028年6月～2028年10月 (5ヶ月)


※仮囲い等は必要に応じて、学校関係者と綿密な協議・調整の上、適宜盛替えを行うこと。



仮移転範囲

機械設備工事での対応


室名	改修内容	既存機器番号
北棟 2階		
数学室	そのまま再利用	—
東棟 2階		
調理・被服室	そのまま再利用	—
調理・被服準備室	空調なし	—
被服室	機器撤去・再取付	PAC-3
南棟 2階		
社会室	機器撤去・再取付	BMA-1-1×2

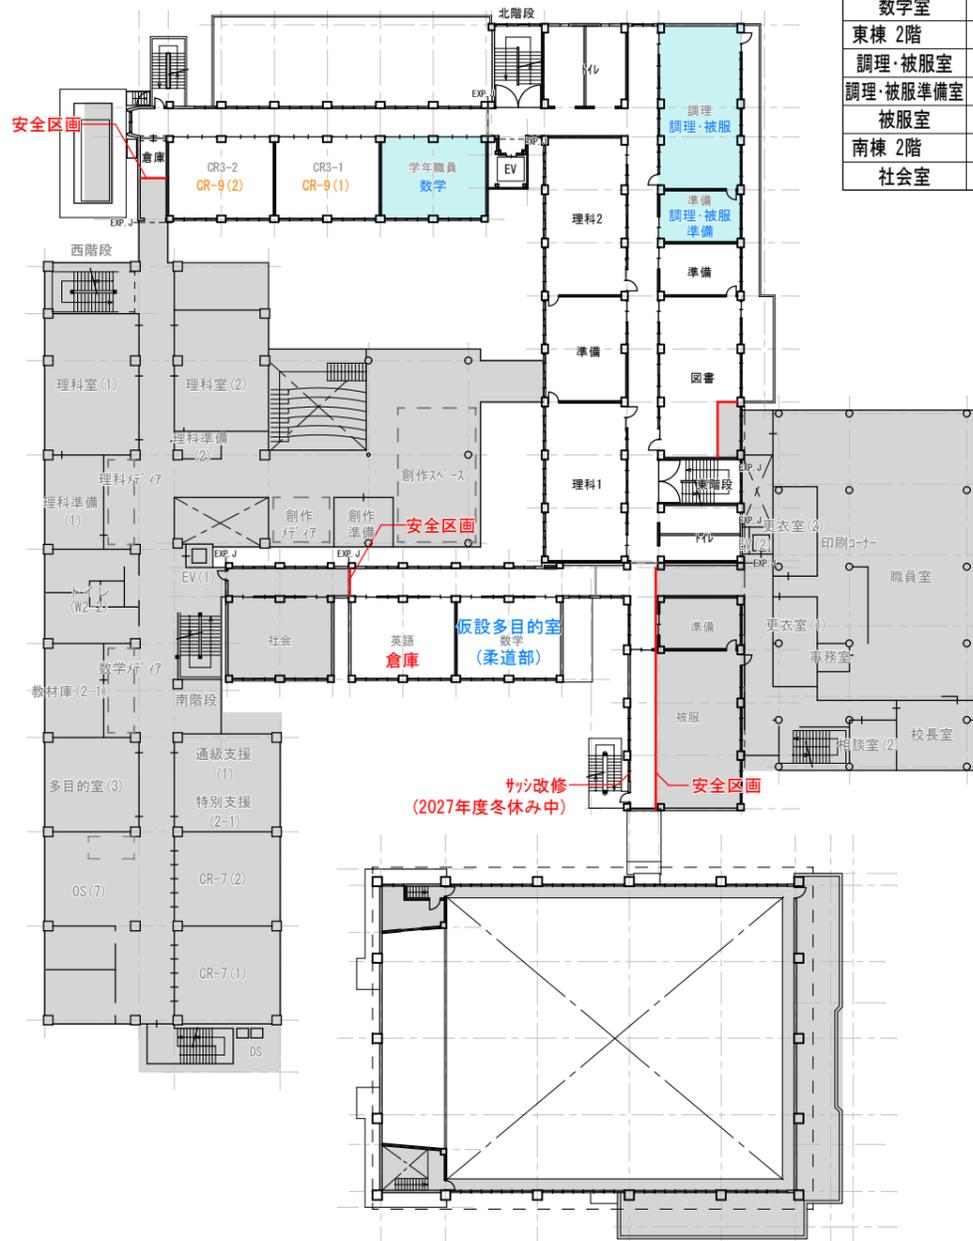

2階平面図

機械設備工事での対応


室名	改修内容	既存機器番号
北棟 3階		
英語室	そのまま再利用	—
東棟 3階		
(空き教室)人権	そのまま再利用	—
集会室	機器撤去・再取付	BMA-10-1×3
南棟 3階		
倉庫	機器撤去・再取付	BMA-12-1×2

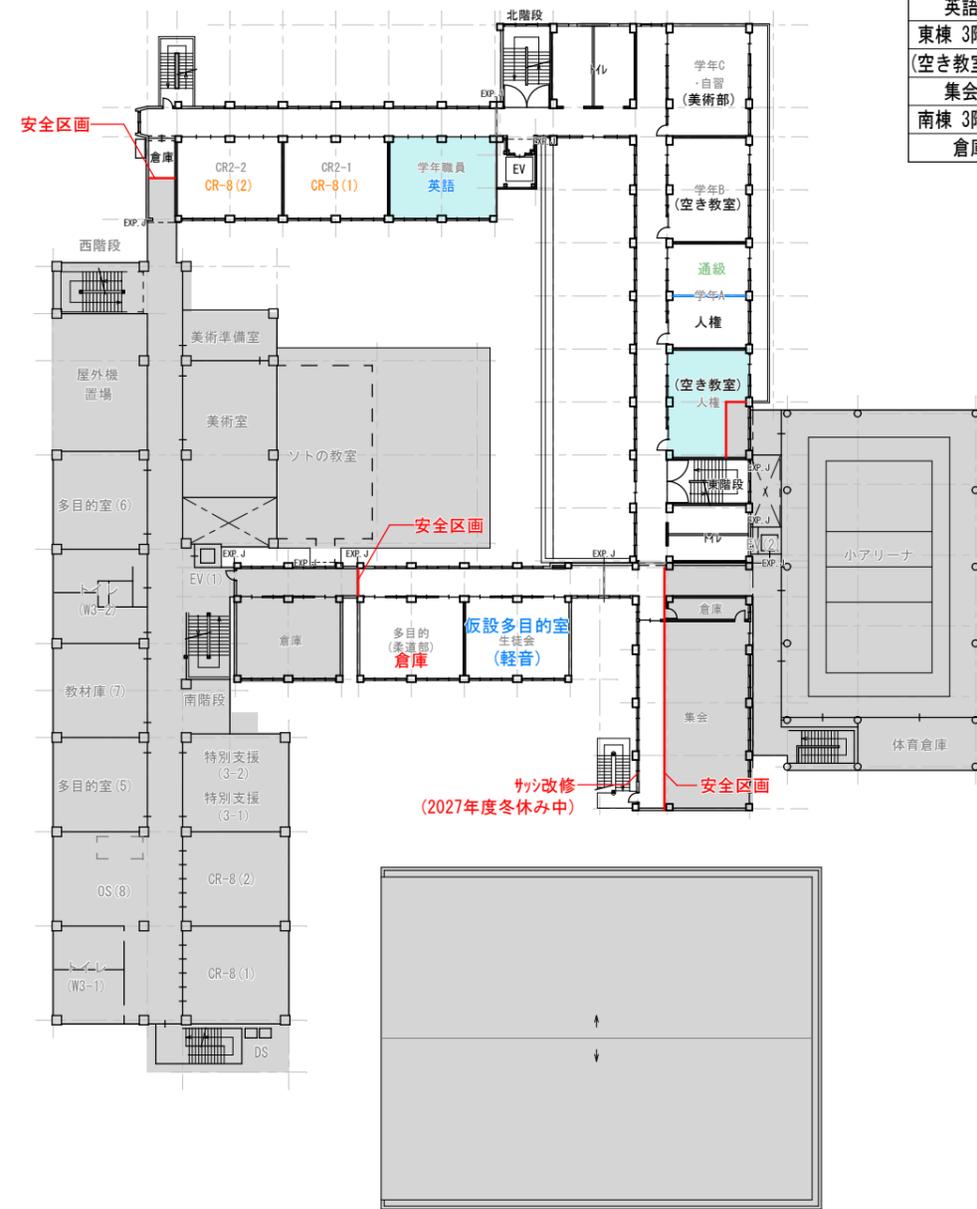

3階平面図

- ・解体工事 (ホップ室)
- ・西側増築
- ・東側増築
- ・既存校舎改修 (南側)
- ・既存校舎改修 (体育館外部・内部)
- ・クラブハウス新設 (グラウンド)
- ・グラウンド整備 (南側)


2027年9月～2028年10月 (14ヶ月)




仮移転範囲

機械設備工事での対応
室内機 改修機器リスト

室名	改修内容	既存機器番号
北棟 4階 社会・通級教室	そのまま再利用	—
南棟 4階 倉庫	機器撤去・再利用	ACP-5

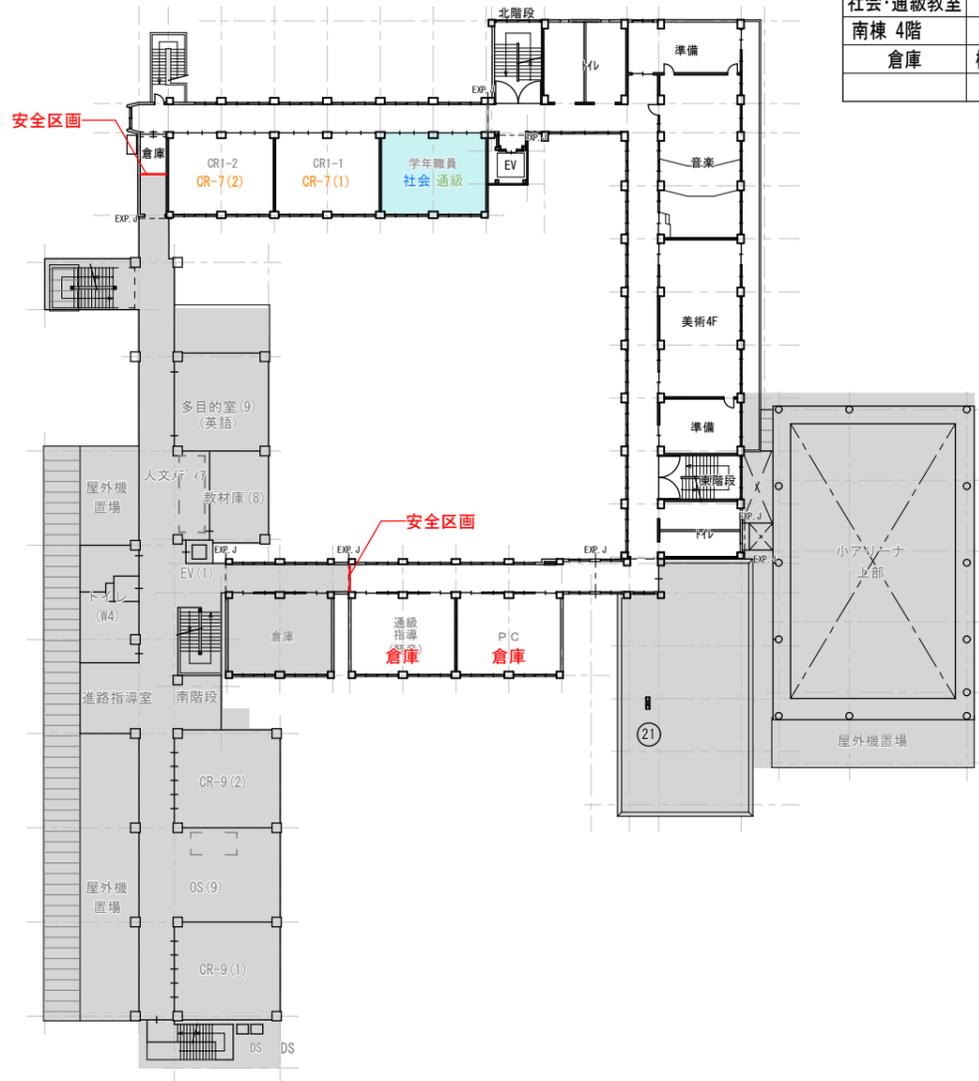

4階平面図

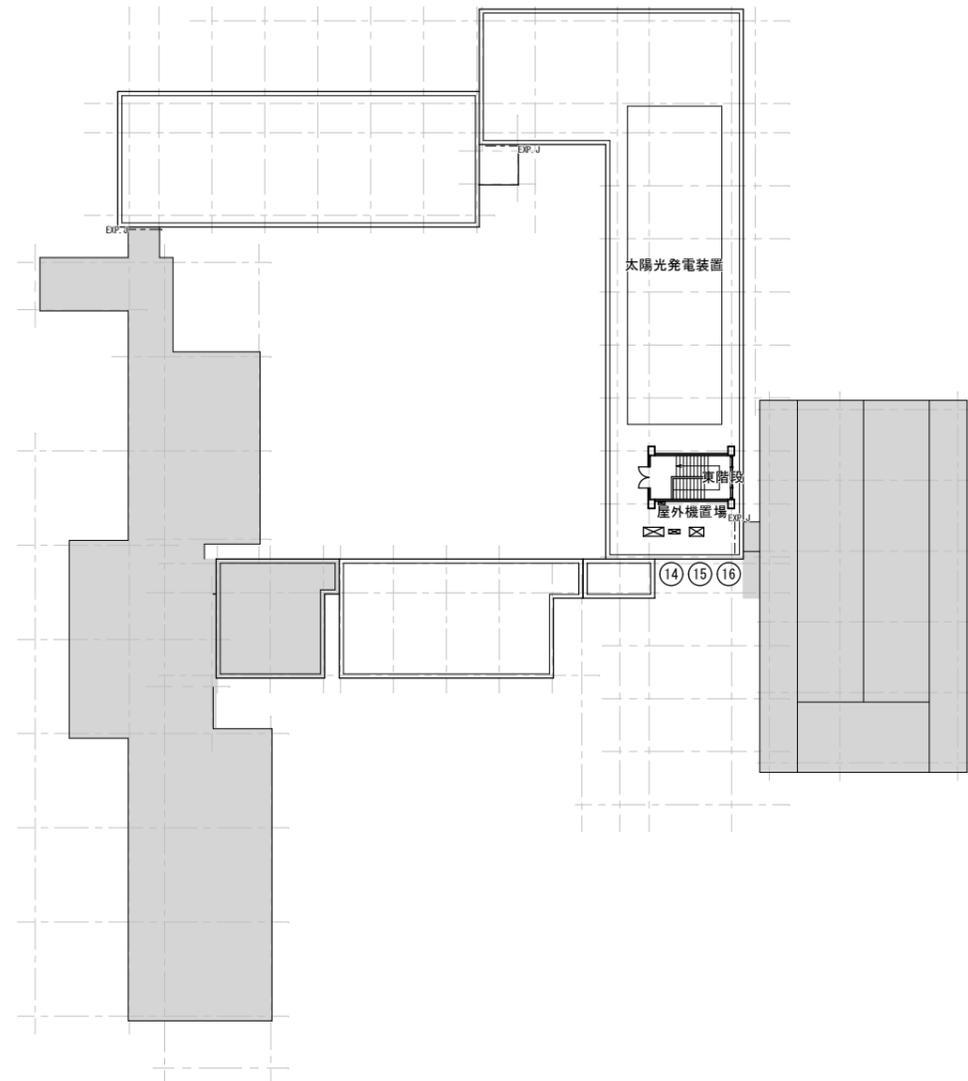

R階平面図

- ・解体工事 (ホップ室)
- ・西側増築
- ・東側増築
- ・既存校舎改修 (南側)
- ・既存校舎改修 (体育館外部・内部)
- ・クラブハウス新設 (グラウンド)
- ・グラウンド整備 (南側)

2027年9月～2028年10月 (14ヶ月)




【凡例】

- 仮囲い(成形鋼板)
- ガードマン(常駐)
- 各種動線
- 通学路
- 給食運搬車ほか
- 工事車両
- 足場

仮移転範囲

機械設備工事での対応
室内機 改修機器リスト


室名	改修内容	既存機器番号
南棟 1階		
相談室	機器撤去・再取付	BMA-6-1
生徒会	機器撤去・再取付	BMA-6-1
美術室	機器撤去・再取付	BMA-6-1×2
東棟 1階		
相談室	空調なし	—
生徒会		
美術室(教育支援室)	そのまま再利用	—

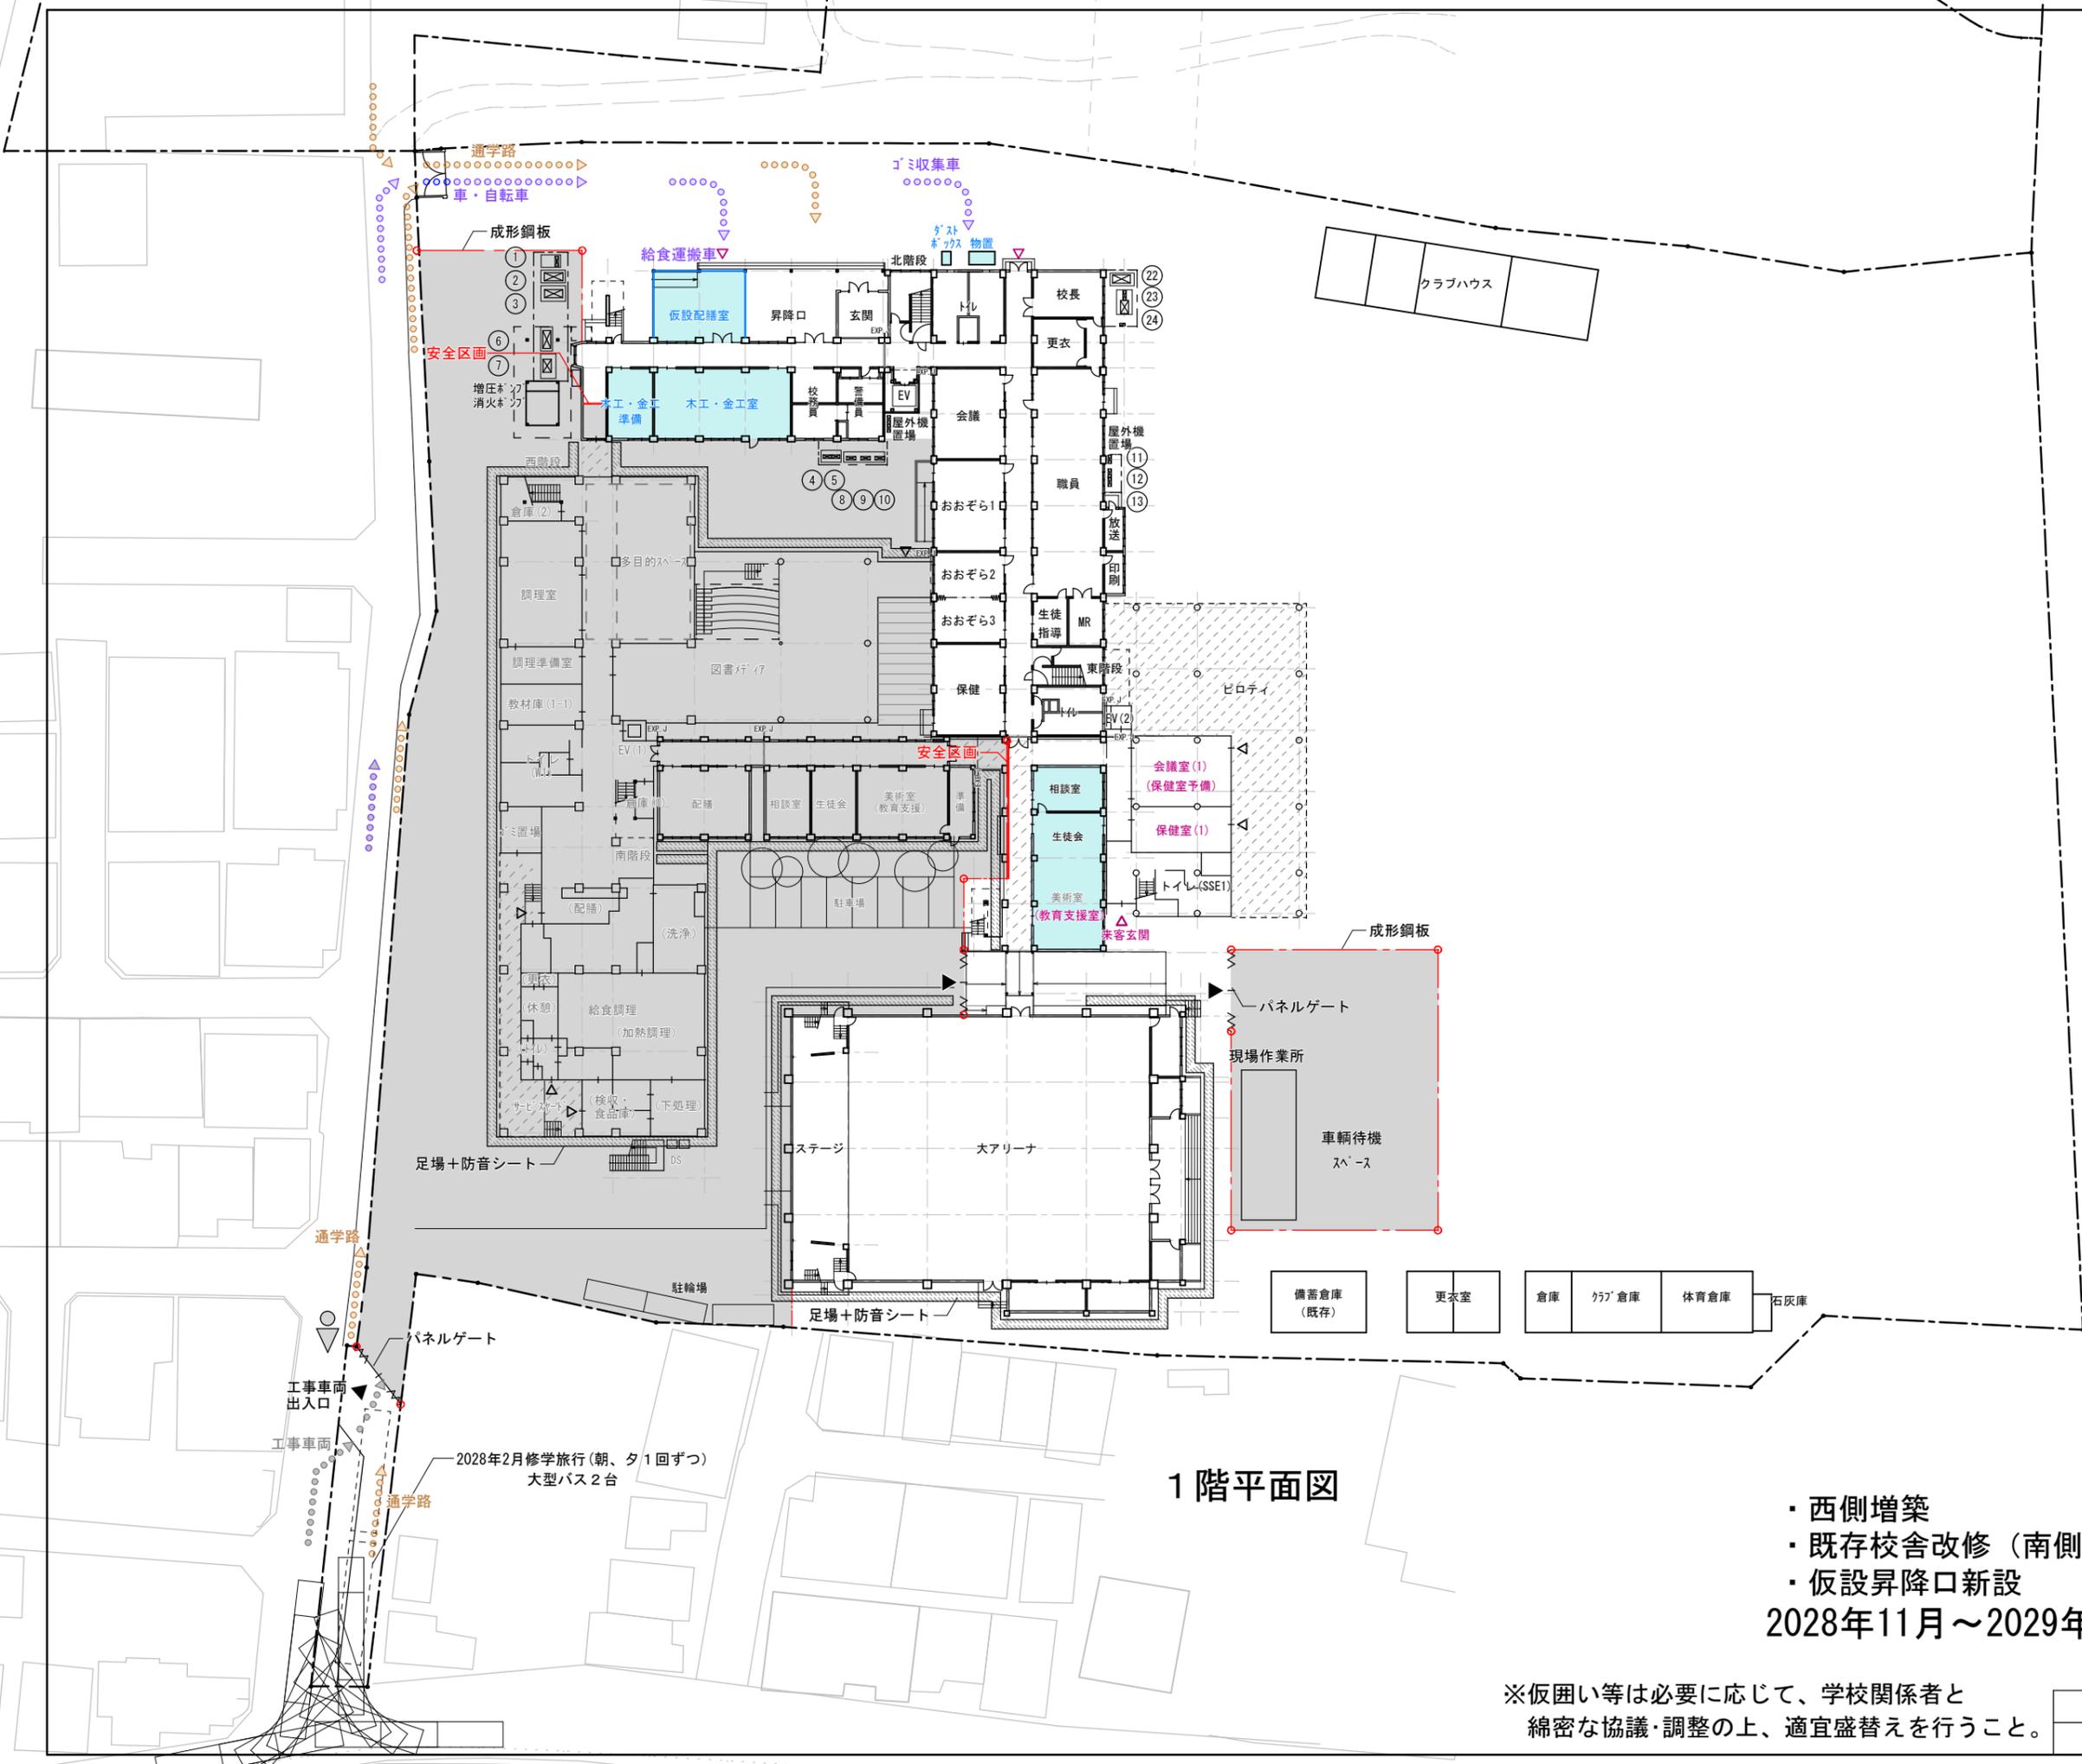

1階平面図

- ・西側増築
- ・既存校舎改修(南側)
- ・仮設昇降口新設

2028年11月～2029年2月(4ヶ月)



※仮囲い等は必要に応じて、学校関係者と綿密な協議・調整の上、適宜盛替えを行うこと。


仮移転範囲

機械設備工事での対応

室内機 改修機器リスト		
室名	改修内容	既存機器番号
南棟 2階		
英語	機器撤去・再取付	BMA-9-1×2
数学	機器撤去・再取付	BMA-9-1×2
東棟 2階		
仮設多目的室	そのまま再利用	—

機械設備工事での対応

室内機 改修機器リスト		
室名	改修内容	既存機器番号
南棟 3階		
多目的室	機器撤去・再取付	BMA-9-1×2
生徒会	機器撤去・再取付	BMA-6-1×2
東棟 3階		
仮設多目的室	そのまま再利用	—

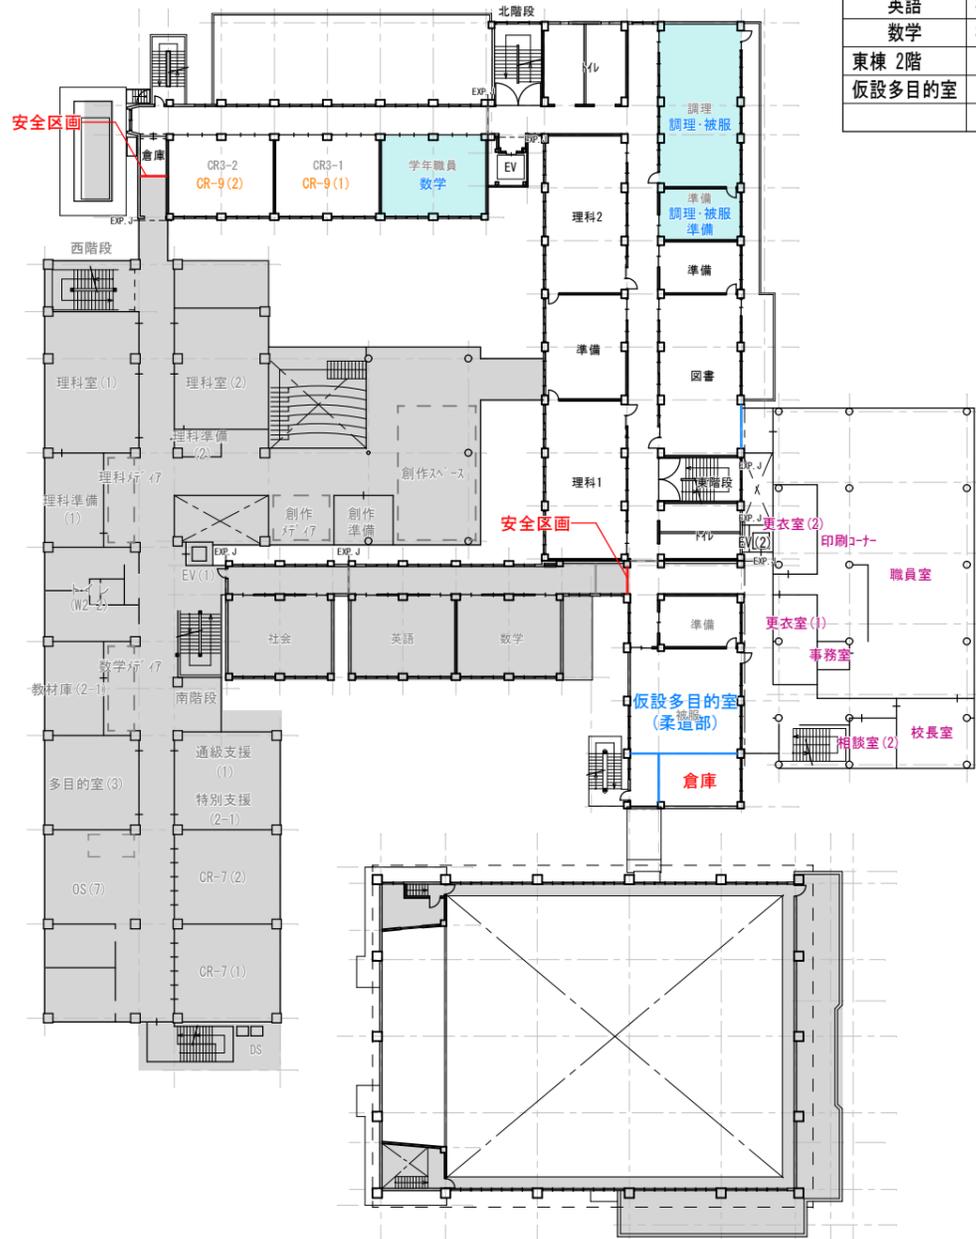


2階平面図



3階平面図

- ・西側増築
- ・既存校舎改修（南側）
- ・仮設昇降口新設


2028年11月～2029年2月（4ヶ月）




仮移転範囲

機械設備工事での対応
室内機 改修機器リスト

室名	改修内容	既存機器番号
南棟 4階		
通級・指導	機器撤去・再利用	BMA-1-1×2
PC	新設	-

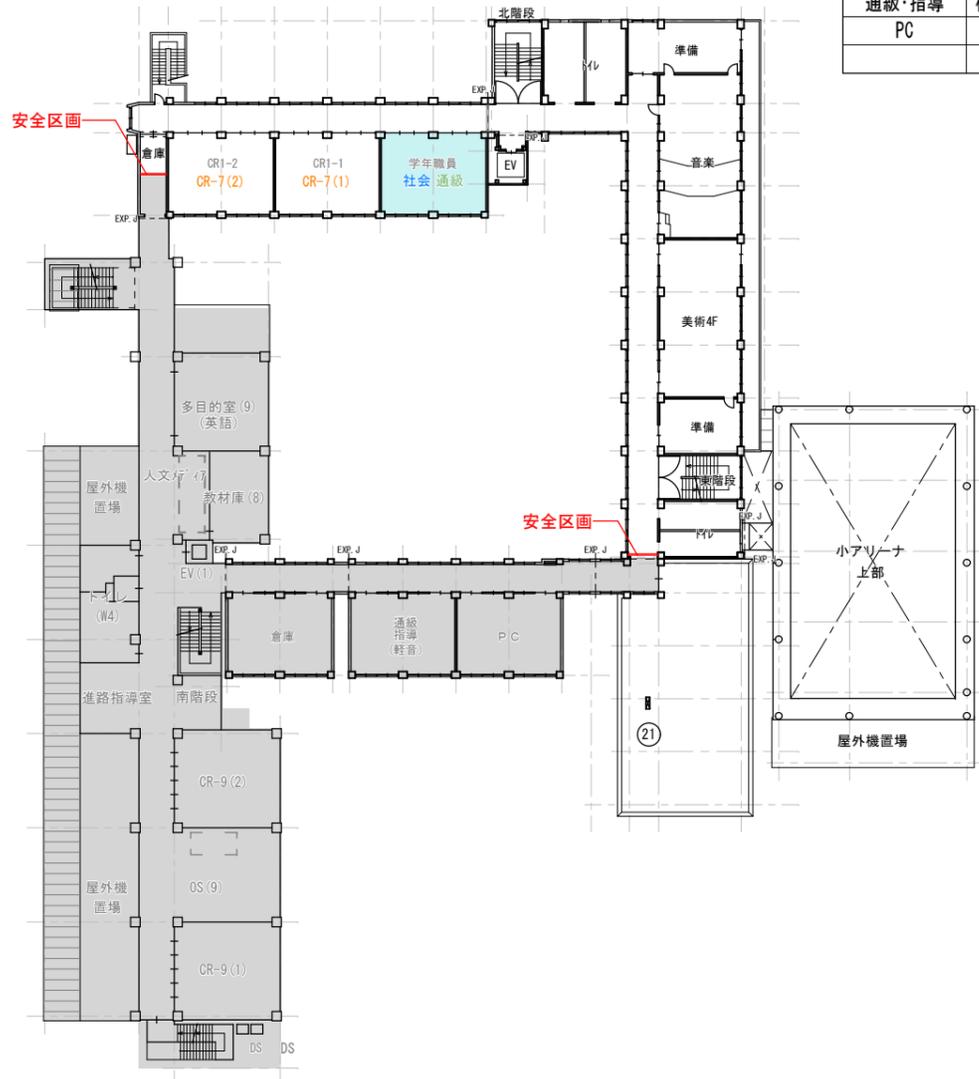

4階平面図

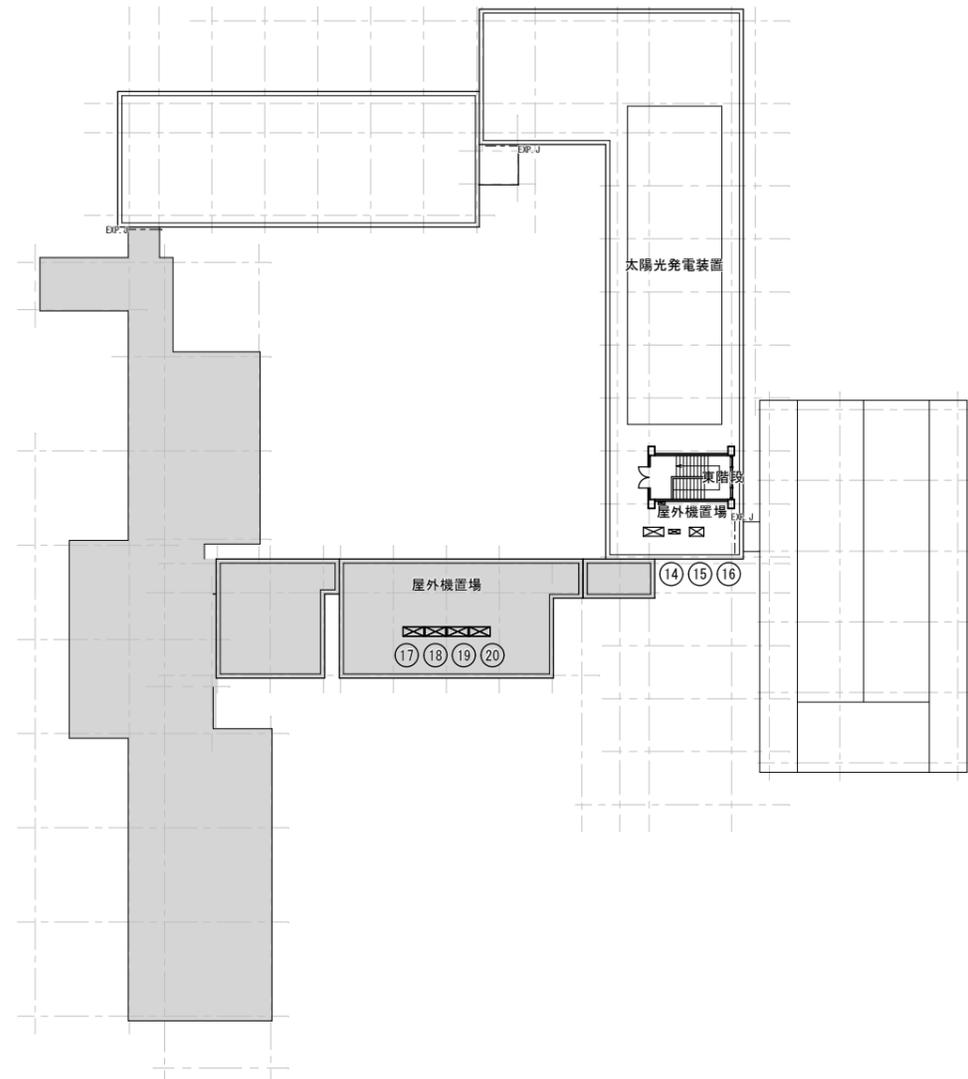

R階平面図

- ・西側増築
 - ・既存校舎改修（南側）
 - ・仮設昇降口新設
- 2028年11月～2029年2月（4ヶ月）




【凡例】

- 仮囲い(成形鋼板)
- ガードマン(常駐)
- 各種動線
- ▶ 通学路
- ▶ 給食運搬車ほか
- ▶ 工事車両
- 足場

仮移転範囲

機械設備工事での対応
室内機 改修機器リスト

室名	改修内容	既存機器番号
南棟 1階		
公務員・警備員 2-1期にて設置 済		—

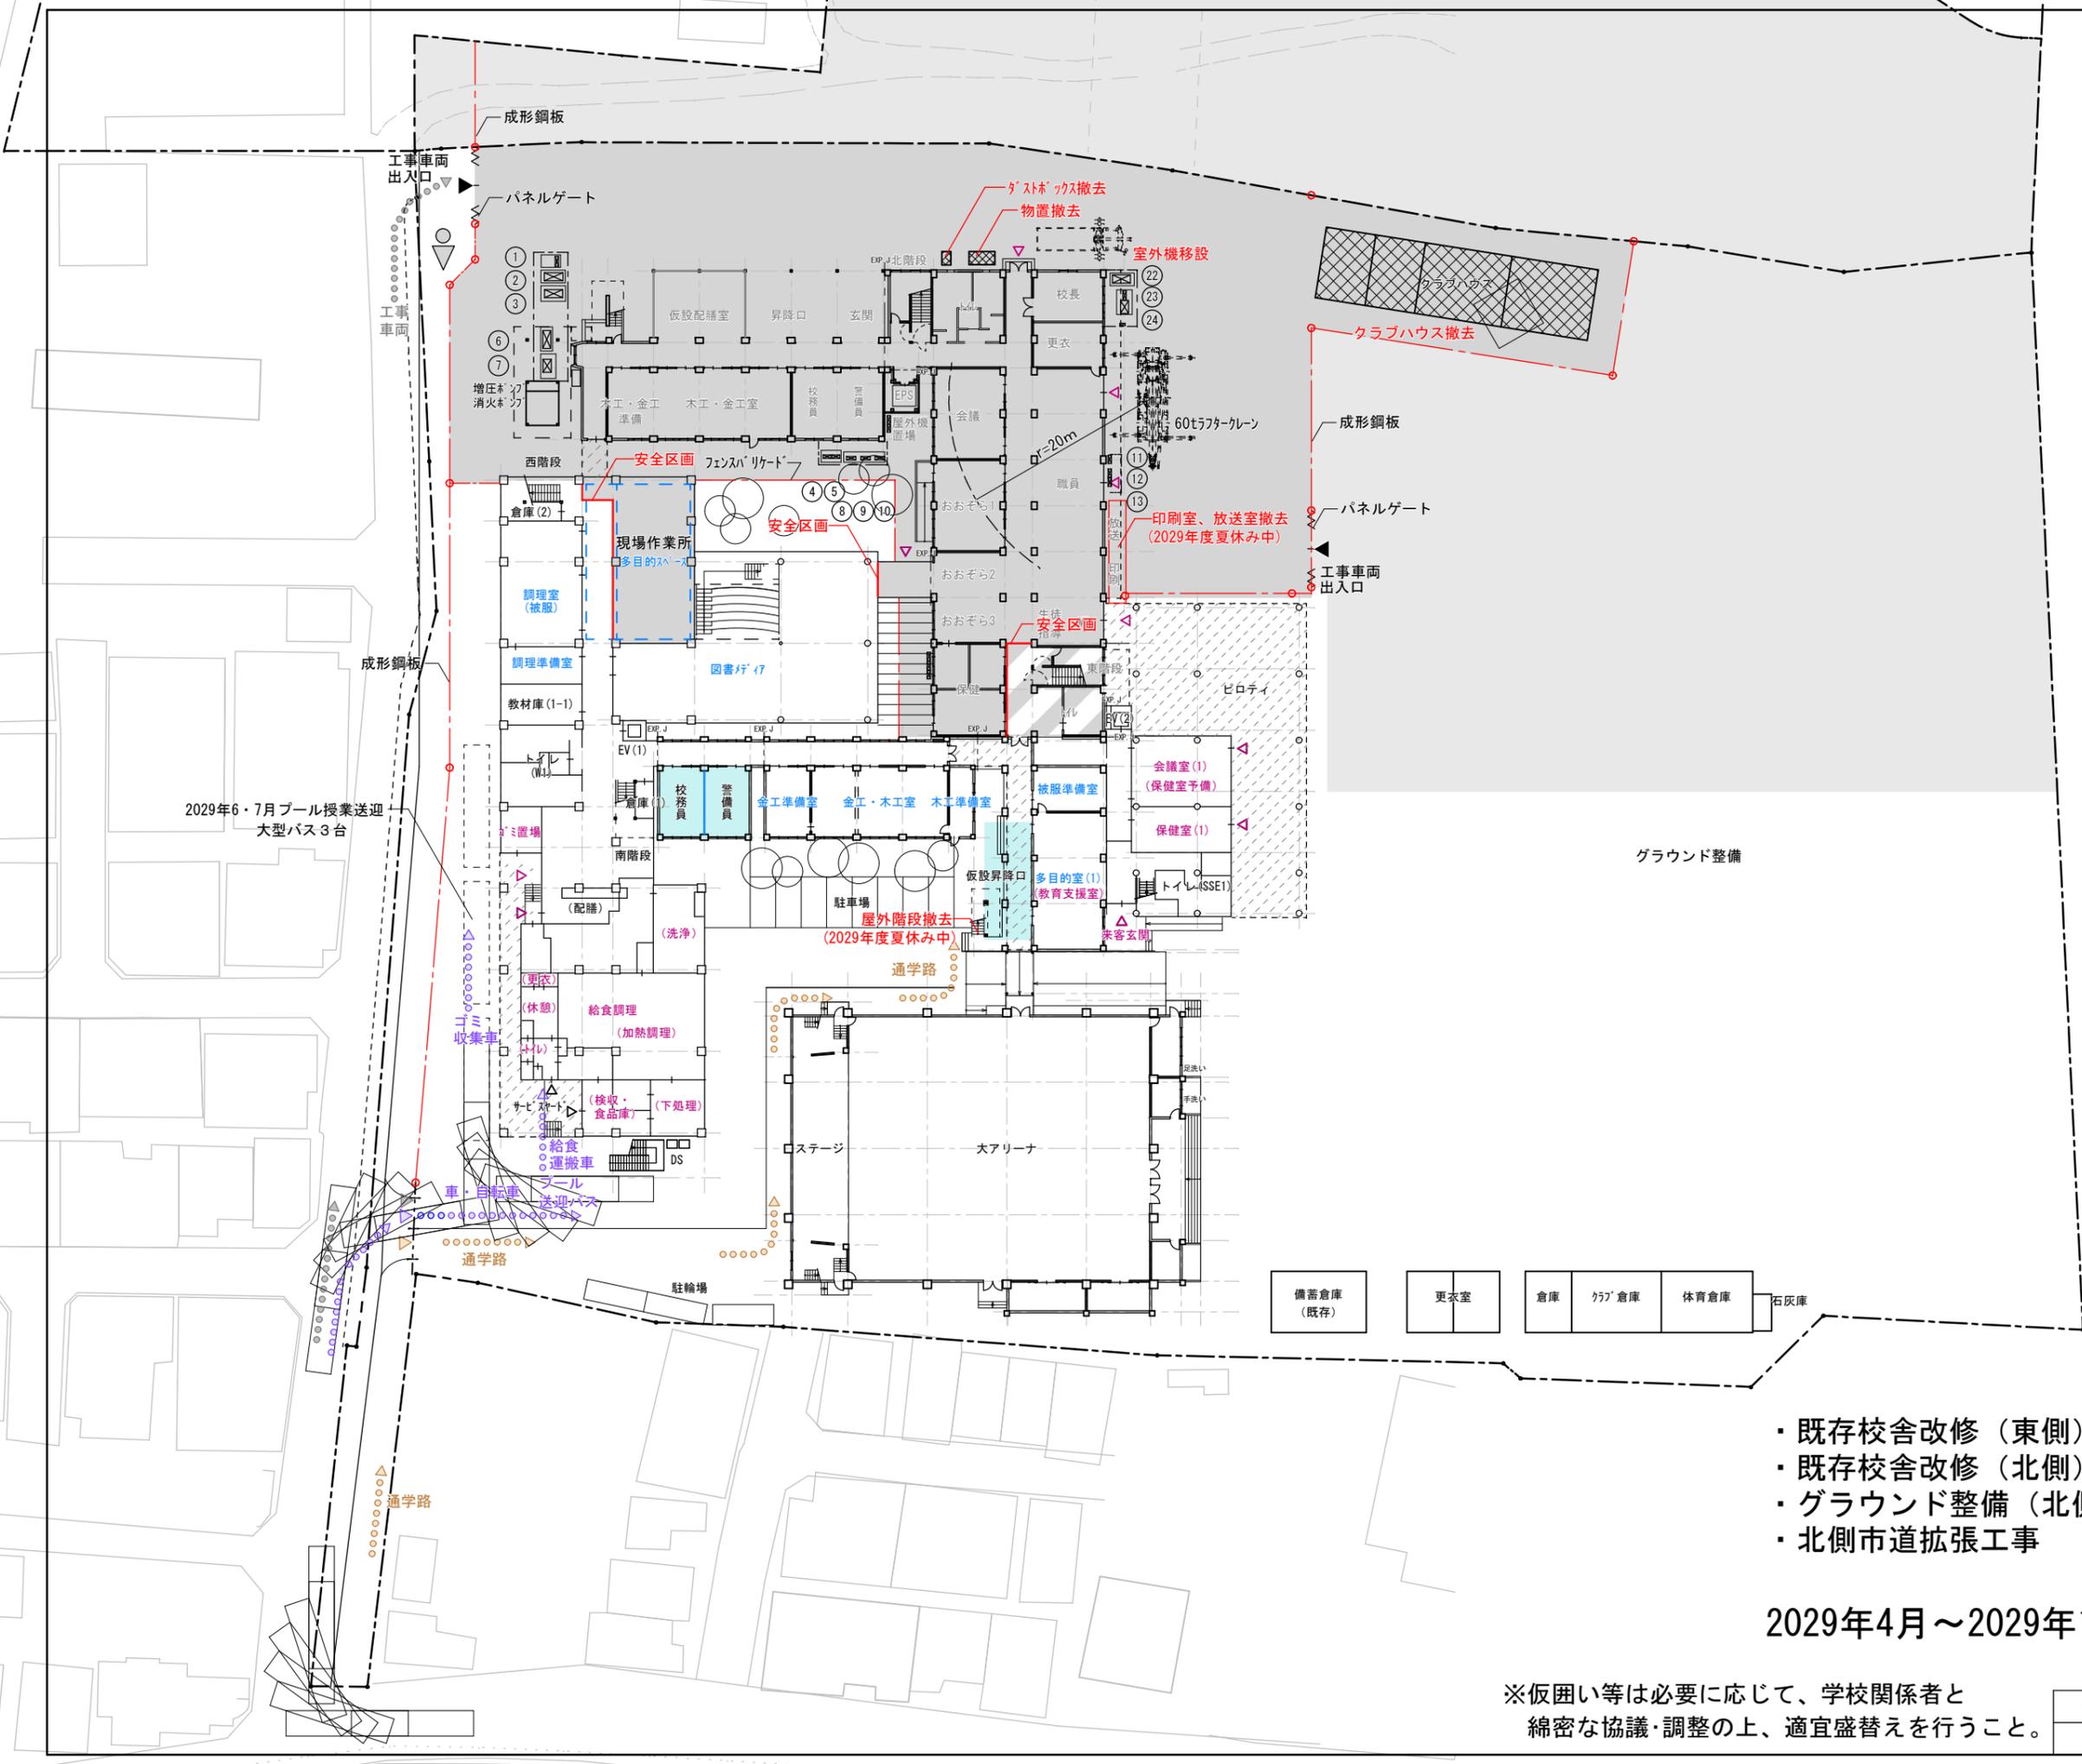


2029年6・7月プール授業送迎
大型バス3台

- ・既存校舎改修（東側）
- ・既存校舎改修（北側）
- ・グラウンド整備（北側）
- ・北側市道拡張工事

2029年4月～2029年10月（7ヶ月）



※仮囲い等は必要に応じて、学校関係者と
綿密な協議・調整の上、適宜盛替えを行うこと。



仮移転範囲

機械設備工事での対応
室内機 改修機器リスト

室名	改修内容	既存機器番号
南棟 2階		
更衣室(2-1)	2-1期にて設置 済	—
更衣室(2-2)	2-1期にて設置 済	—

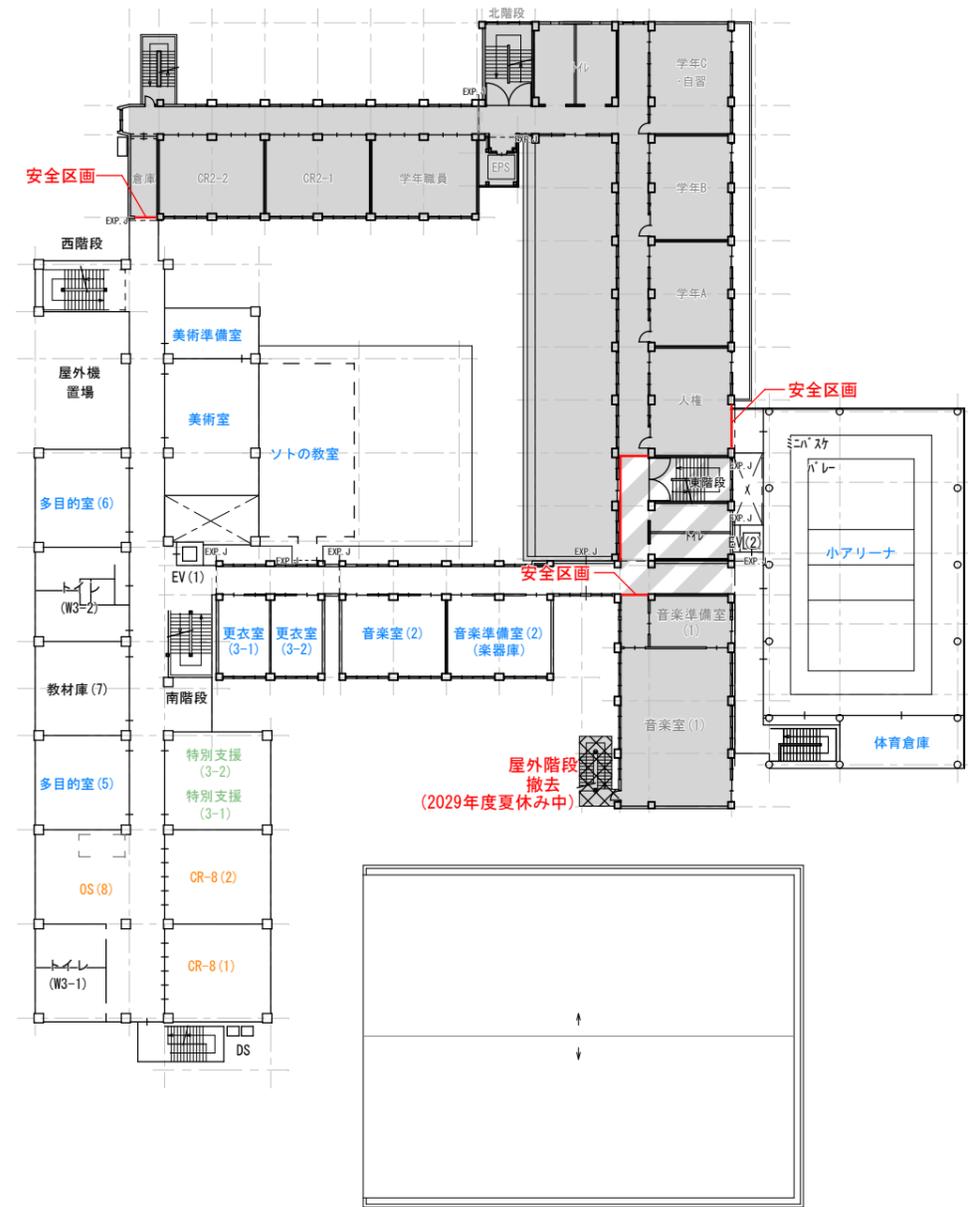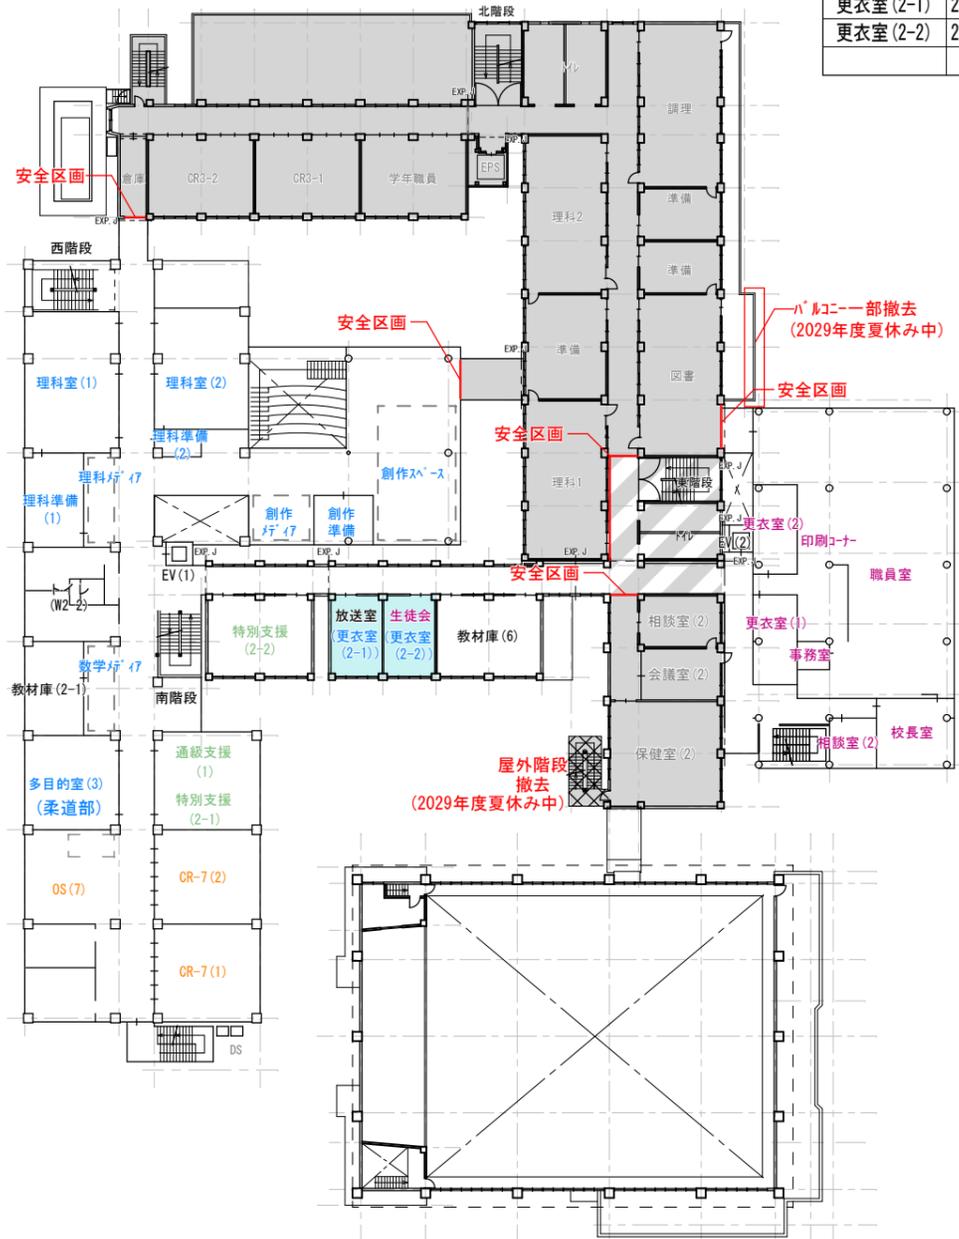



3階平面図

- ・既存校舎改修（東側）
- ・既存校舎改修（北側）
- ・グラウンド整備（北側）
- ・北側市道拡張工事



2029年4月～2029年10月（7ヶ月）

仮移転範囲

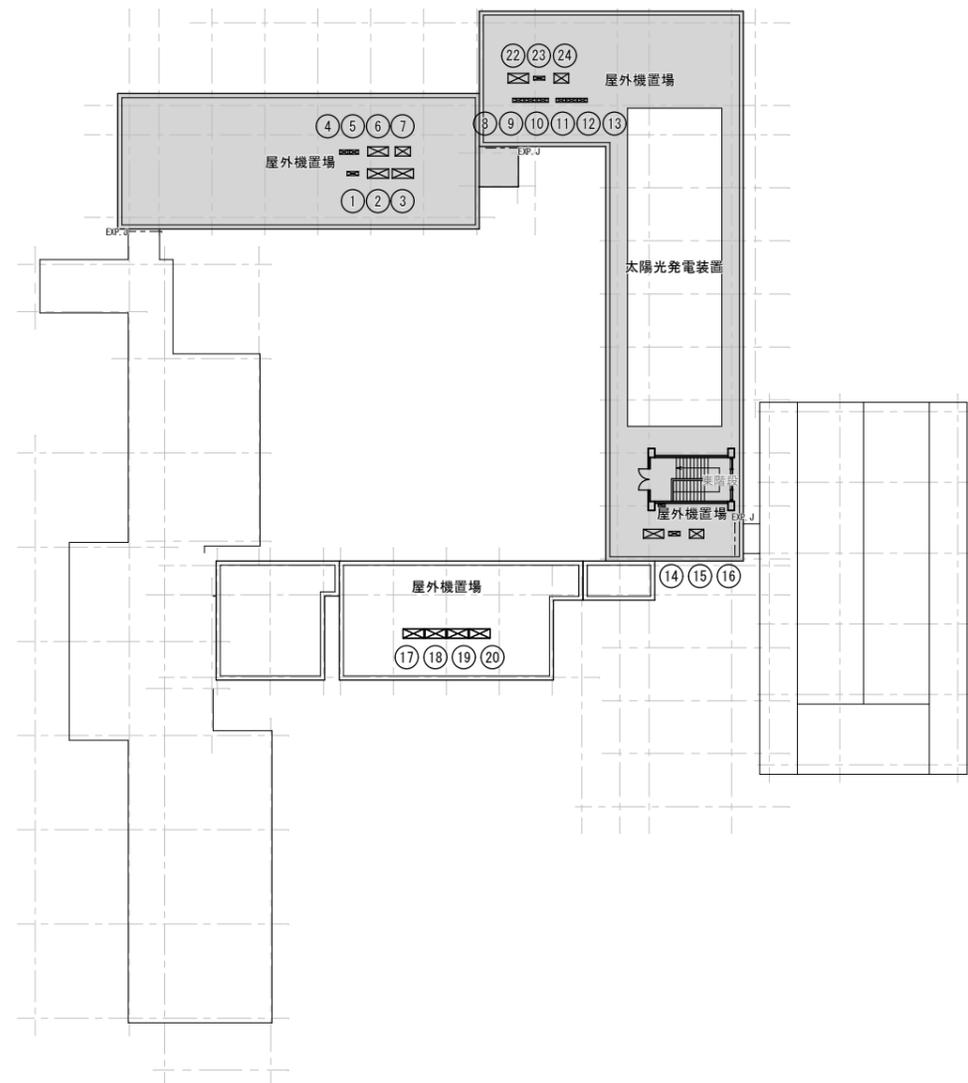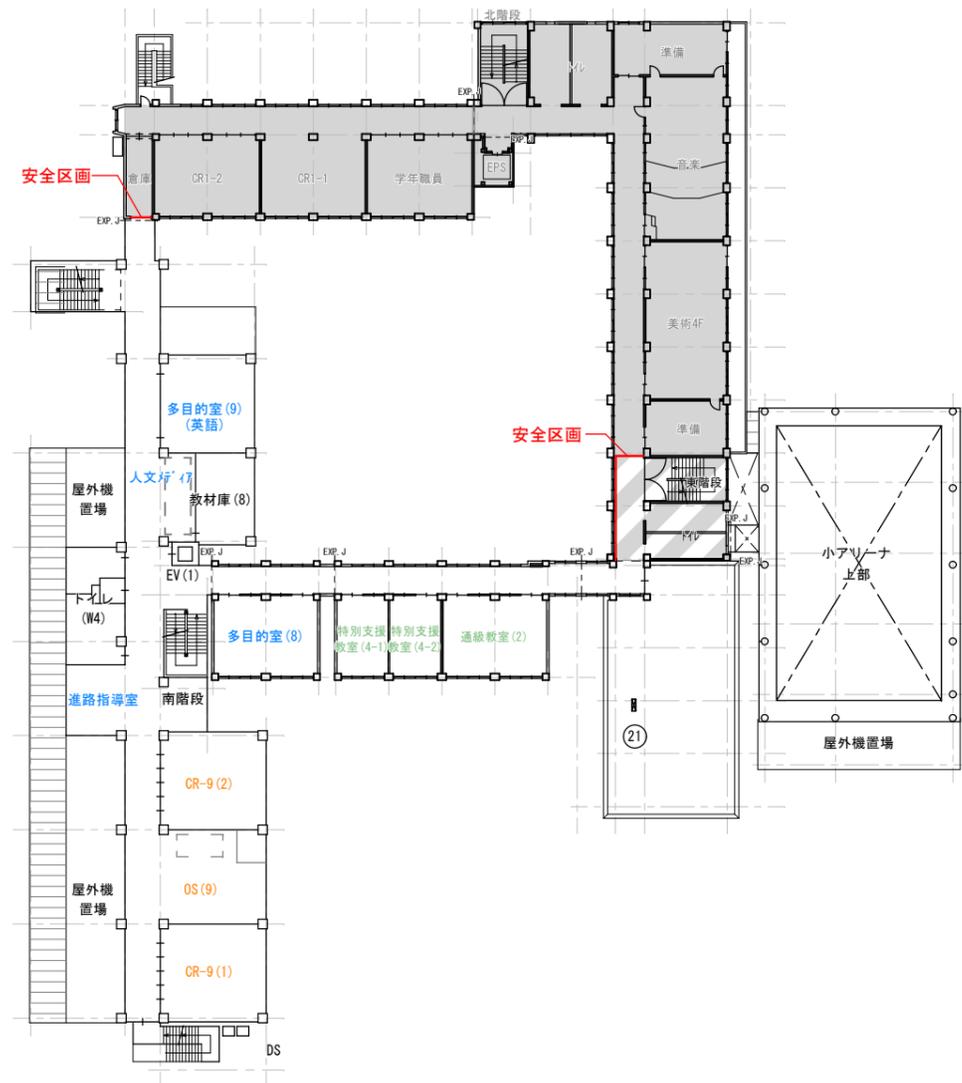

R階平面図

- ・既存校舎改修（東側）
- ・既存校舎改修（北側）
- ・グラウンド整備（北側）
- ・北側市道拡張工事



2029年4月～2029年10月（7ヶ月）

【凡例】


- 仮囲い(成形鋼板)
- ガードマン(常駐)
- 各種動線
- 通学路
- 給食運搬車ほか
- 工事車両
- 足場

仮移転範囲

機械設備工事での対応

室内機 改修機器リスト

室名	改修内容	既存機器番号
東棟 1階		
心の教室(2)	機器撤去・再取付	BMA-3-1×2
校務員室	機器撤去・再取付	BMA-3-1×2
特別支援(1-1)	機器撤去・再取付	BMA-3-2×2
多目的室(2)	機器撤去・再取付	BMA-3-2×2
警備員室	機器撤去・再取付	AC-2
放送室	機器撤去・再取付	AC-2
相談室(1)	機器撤去・再取付	AC-2

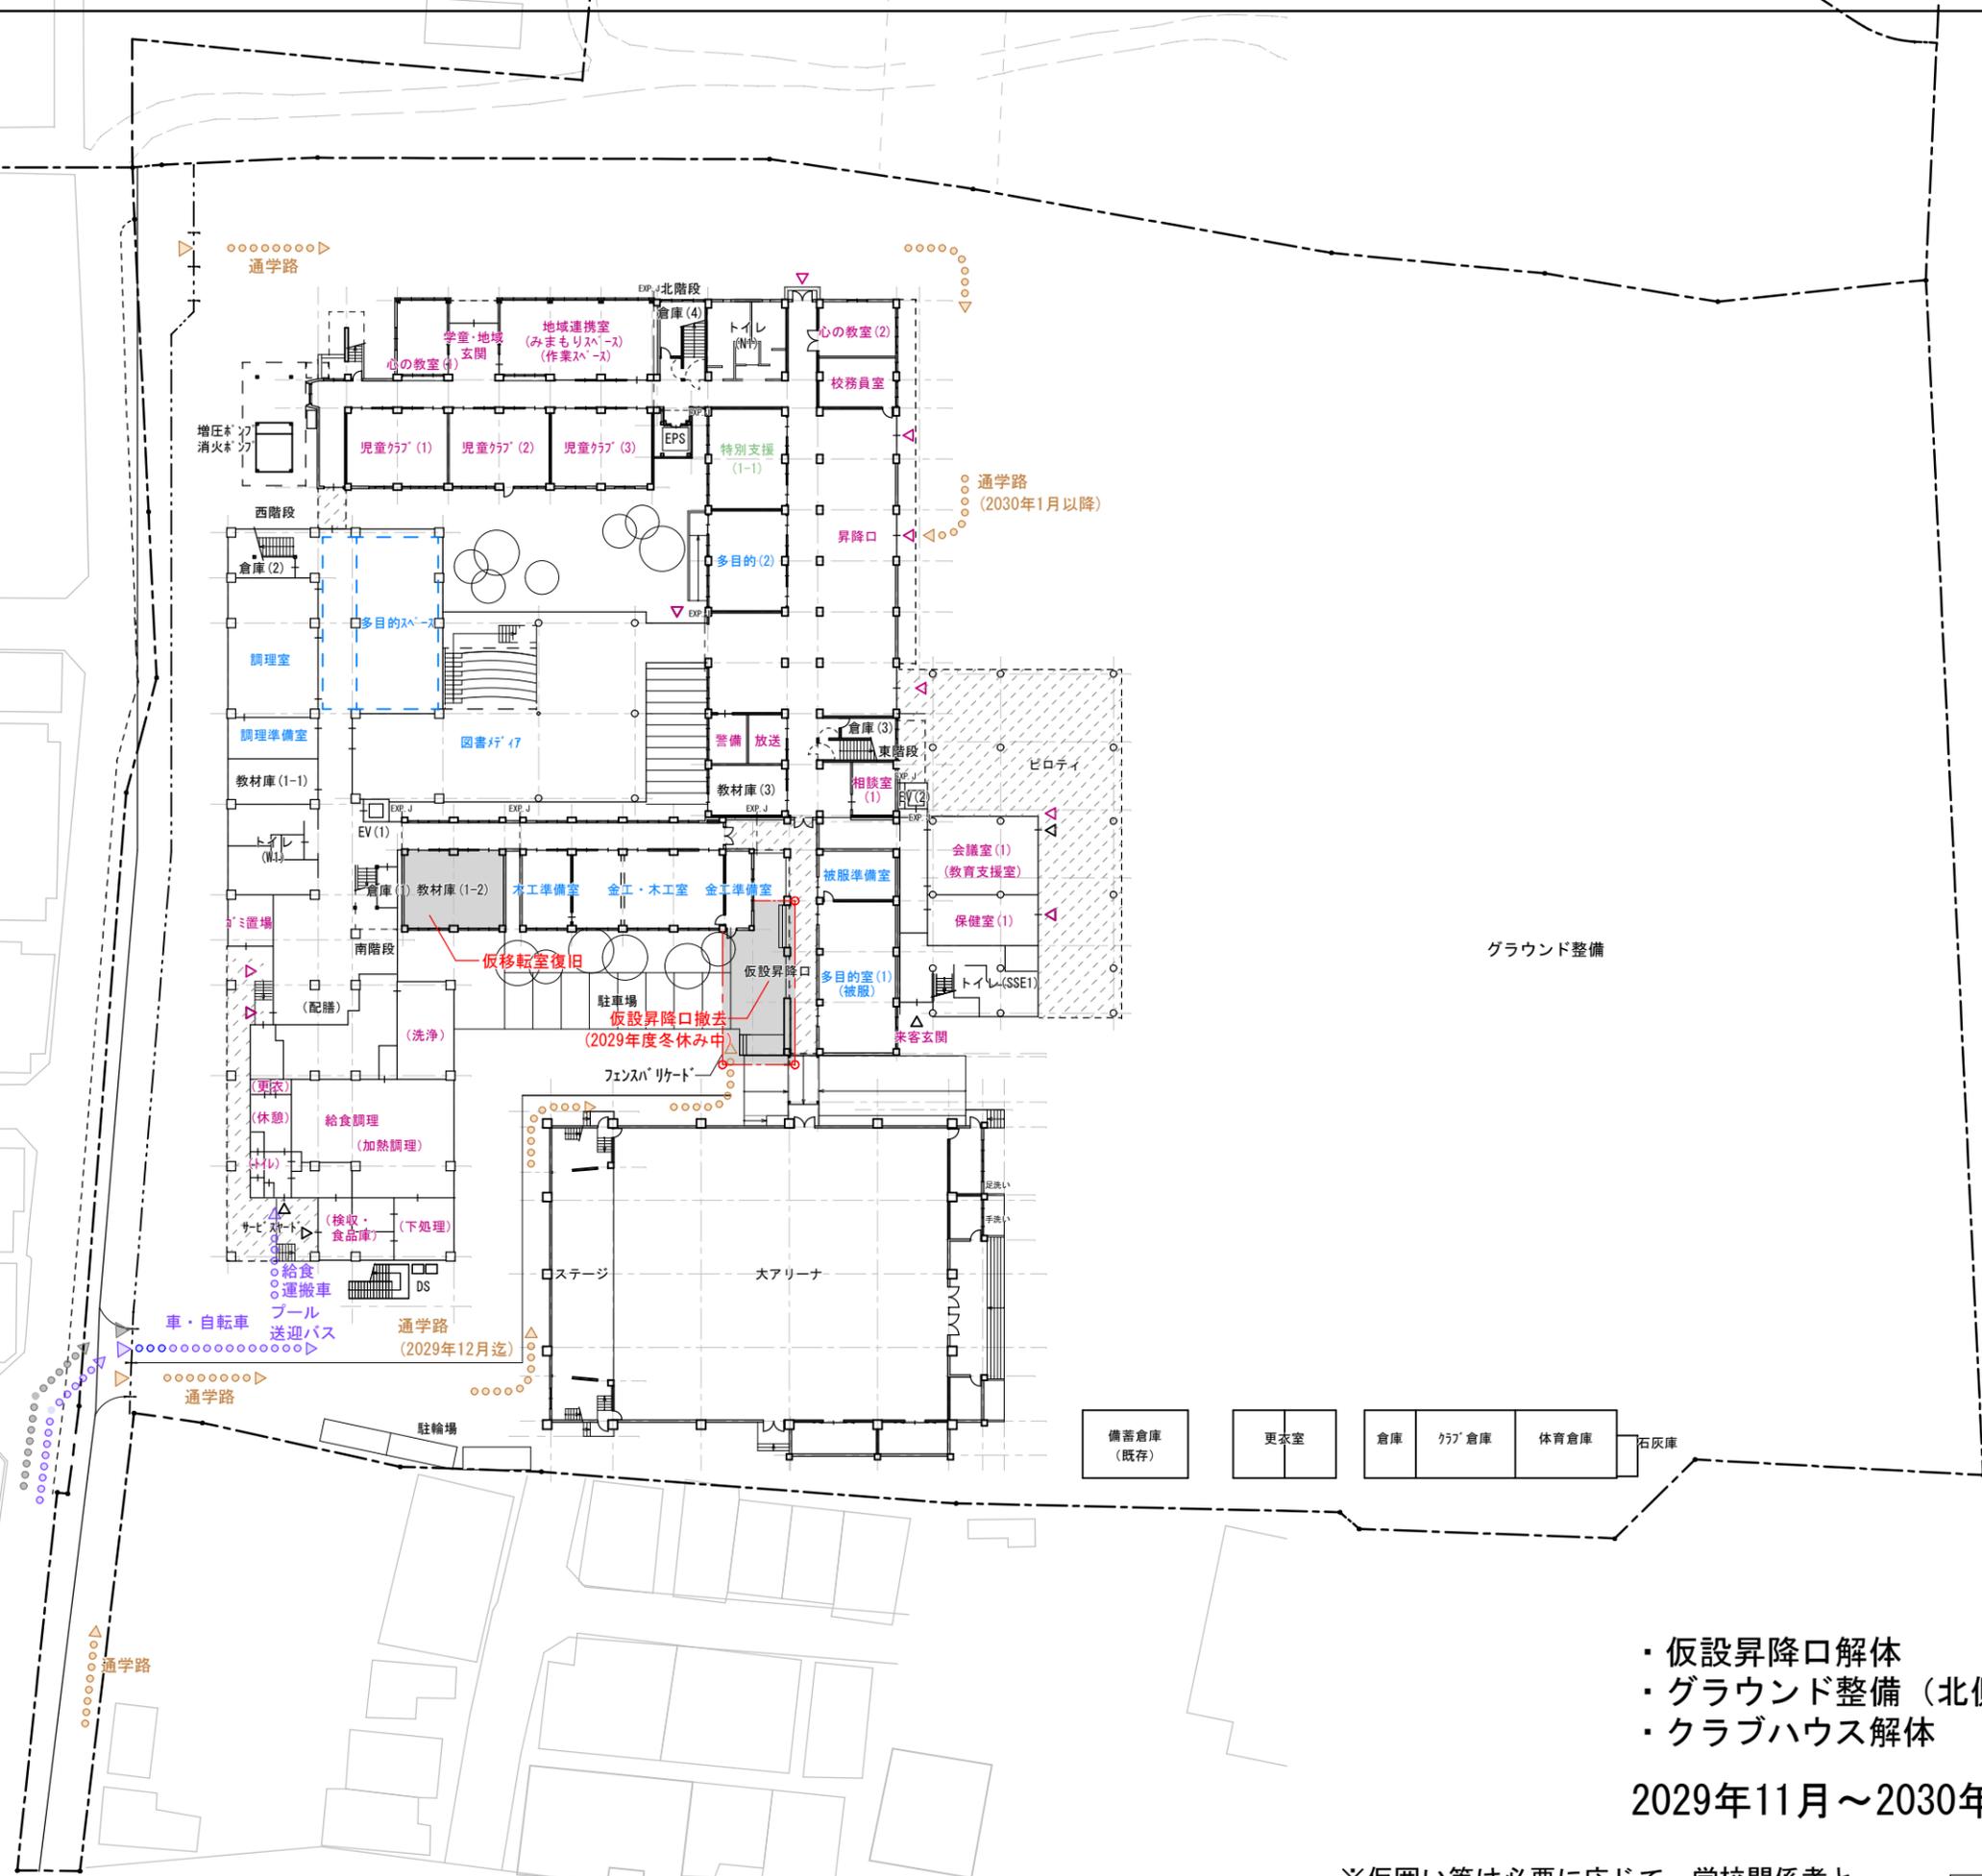

グラウンド整備

- ・ 仮設昇降口解体
- ・ グラウンド整備 (北側)
- ・ クラブハウス解体

2029年11月～2030年1月 (3ヶ月)

※仮囲い等は必要に応じて、学校関係者と綿密な協議・調整の上、適宜盛替えを行うこと。

仮移転範囲

機械設備工事での対応
室内機 改修機器リスト

室名	改修内容	既存機器番号
北棟 3階		
CR-5 (1)	機器撤去・再取付	BMA-2-1×2
OS (5)	機器撤去・再取付	BMA-2-1×2
CR-5 (2)	機器撤去・再取付	BMA-2-1×2
東棟 3階		
OS (6)	機器撤去・再取付	BMA-7-1×2
CR-6 (1)	機器撤去・再取付	BMA-7-1×2
CR-6 (2)	機器撤去・再取付	BMA-7-1×2

機械設備工事での対応
室内機 改修機器リスト

室名	改修内容	既存機器番号
北棟 2階		
CR-2 (1)	機器撤去・再取付	BMA-11-1×2
OS (2)	機器撤去・再取付	BMA-11-1×2
CR-2 (2)	機器撤去・再取付	BMA-11-1×2
東棟 2階		
OS (1)	機器撤去・再取付	BMA-8-1×2
CR-1 (1)	機器撤去・再取付	BMA-8-1×2
CR-1 (2)	機器撤去・再取付	BMA-8-1×2
多目的 (4)	機器撤去・再取付	BMA-8-1×2
特別支援 (2-3)	機器撤去・再取付	PAC-1
特別支援 (2-4)	機器撤去・再取付	PAC-1
生徒会	機器撤去・再取付	AC-4
相談室 (3)	機器撤去・再取付	AC-2
相談室 (4)	機器撤去・再取付	AC-1



2階平面図



3階平面図

- ・仮設昇降口解体
- ・グラウンド整備 (北側)
- ・クラブハウス解体


2029年11月～2030年1月 (3ヶ月)




仮移転範囲

機械設備工事での対応
室内機 改修機器リスト

室名	改修内容	既存機器番号
北棟 4階		
CR-8(1)	機器撤去・再取付	BMA-4-1×2
OS(8)	機器撤去・再取付	BMA-4-1×2
CR-8(2)	機器撤去・再取付	BMA-4-1×2
東棟 4階		
CR-7(2)	新設	-
OS(7)	新設	-
CR-7(1)	機器撤去・再取付	BMA-5-1×2
多目的室(10)	機器撤去・再取付	BMA-5-1×2

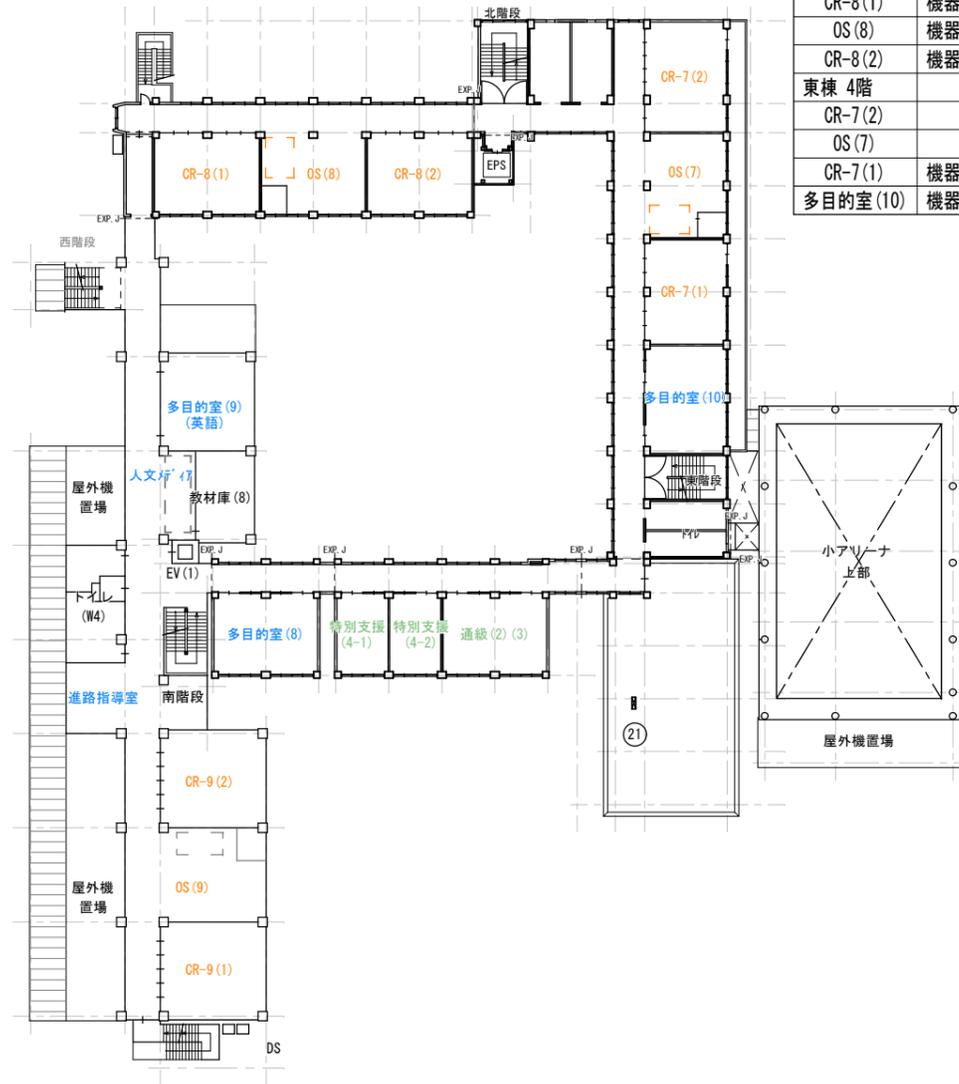

4階平面図

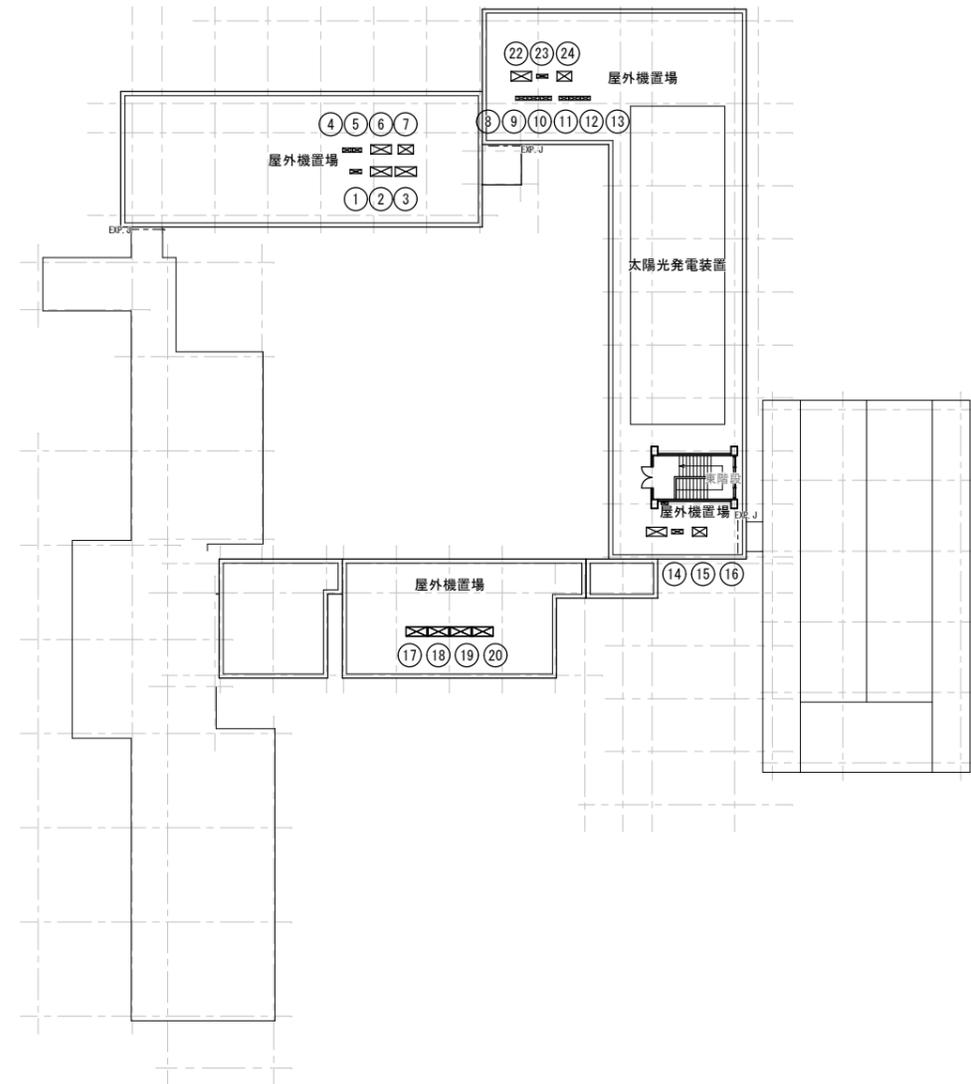


R階平面図

- ・仮設昇降口解体
- ・グラウンド整備（北側）
- ・クラブハウス解体


2029年11月～2030年1月（3ヶ月）



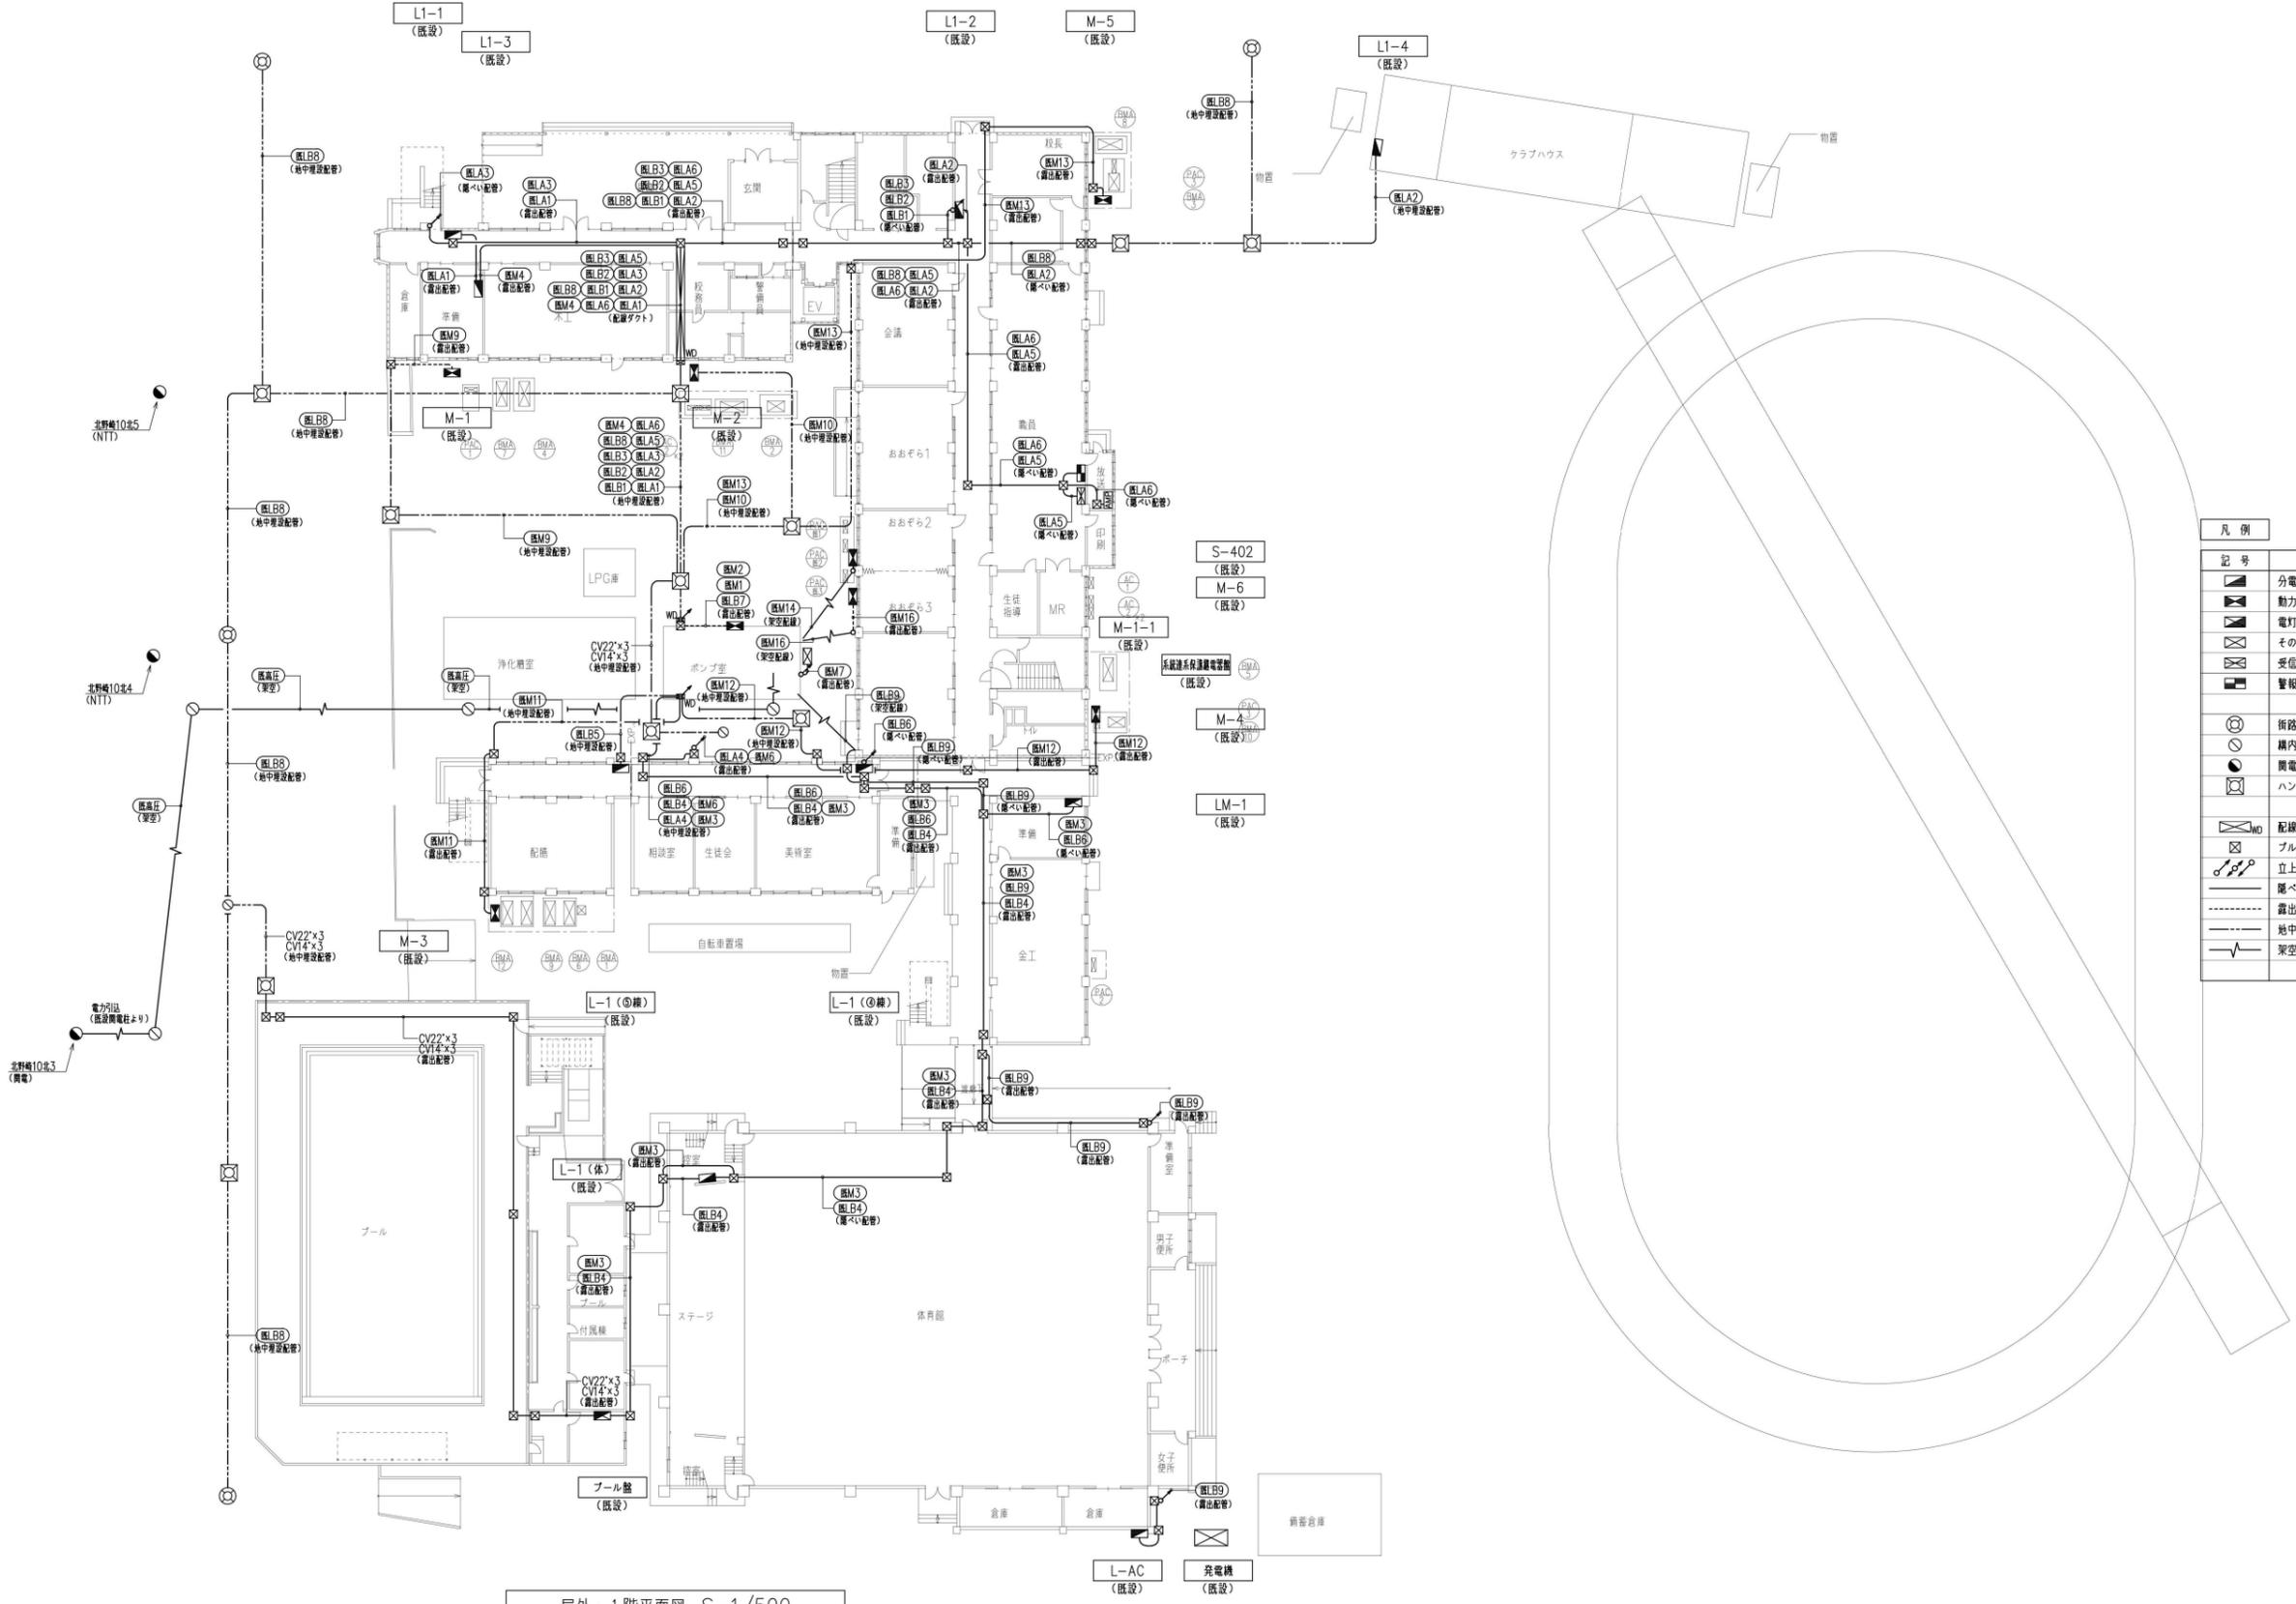


凡例		
記号	名称	備考
⏏	分電盤	
⏏	動力盤	
⏏	電灯動力盤	
⏏	その他制御盤	
⏏	受信機	
⏏	警報盤	
⊙	街路灯	
⊙	構内柱	
⊙	賣電柱・NTT柱	
⊙	ハンドホール	
WD	配線ダクト	
⊠	プルボックス	
↕	立上げ、未通し、立下げ	
---	隠ぺい配管配線	
---	露出配管配線	
---	地中埋設配管配線	
---	架空配線	

屋外・1階平面図 S=1/500

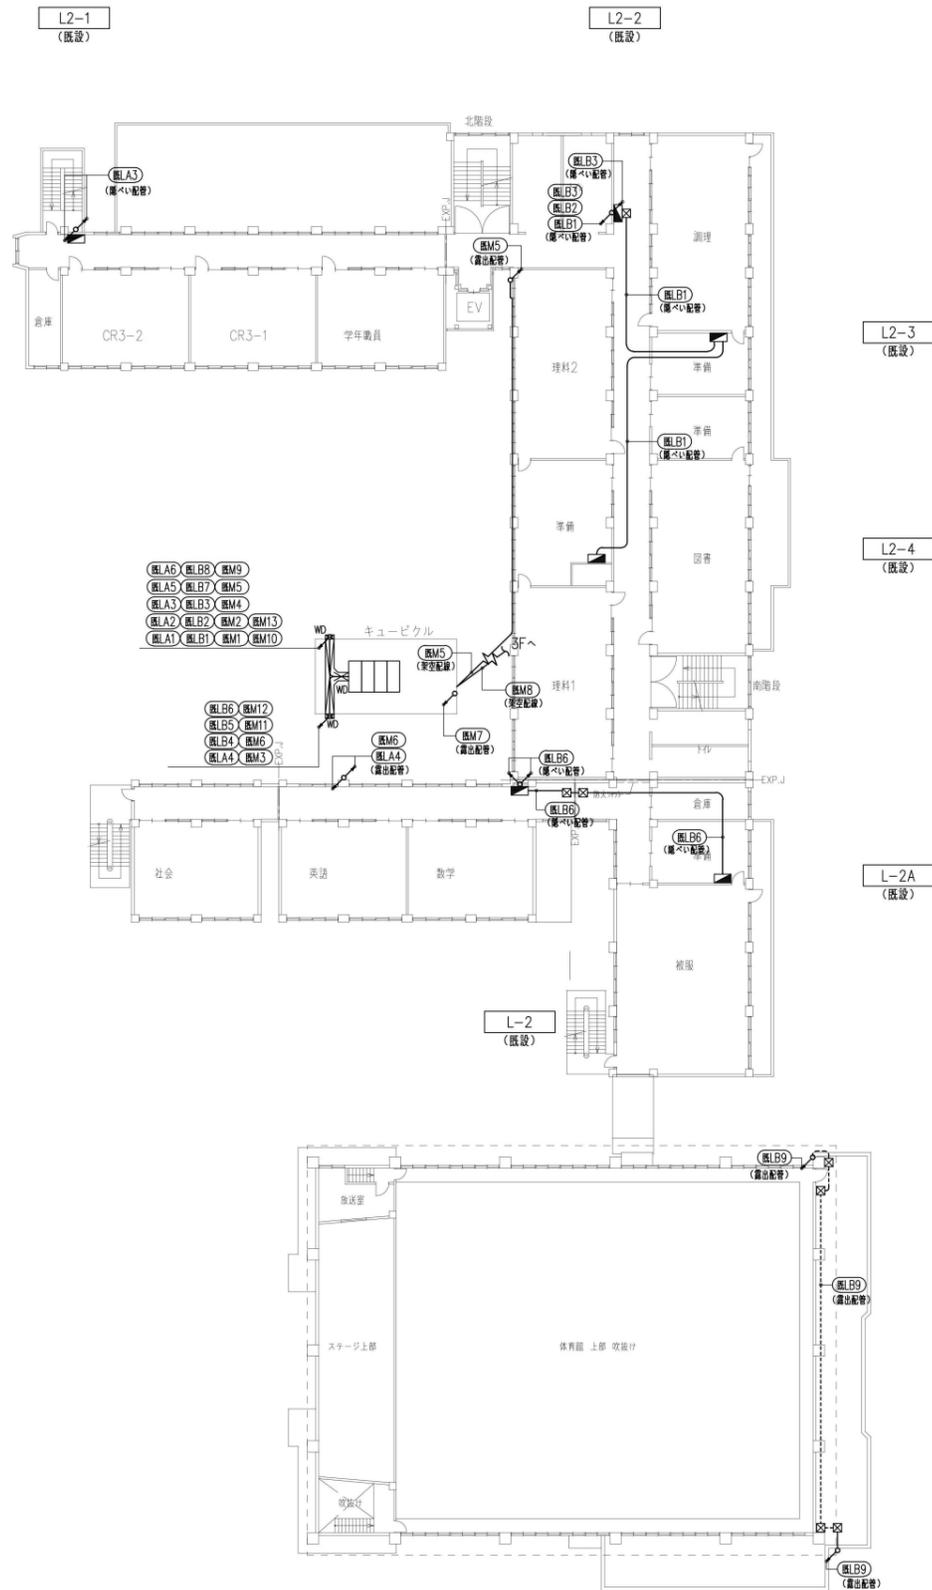


2階平面図 S=1/500

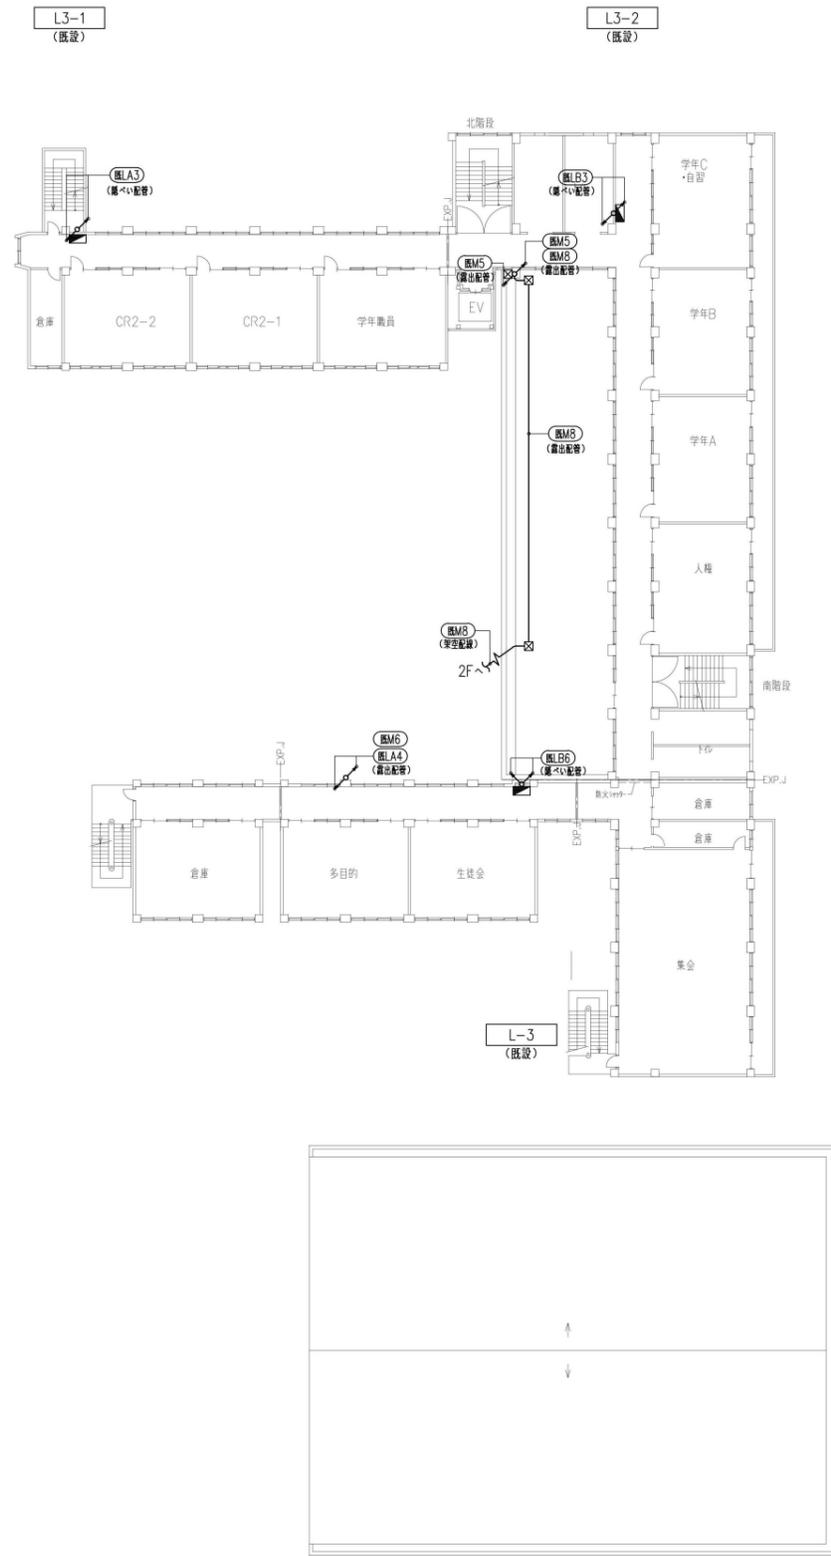


3階平面図 S=1/500




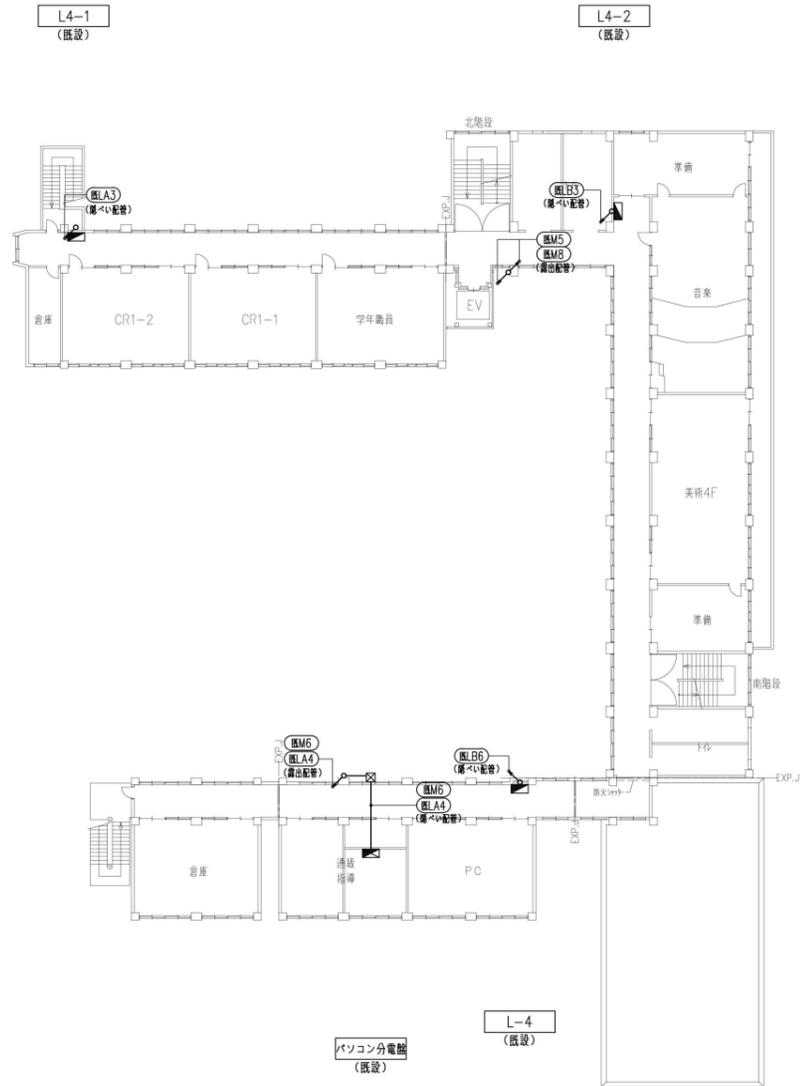


4階平面図 S=1/500

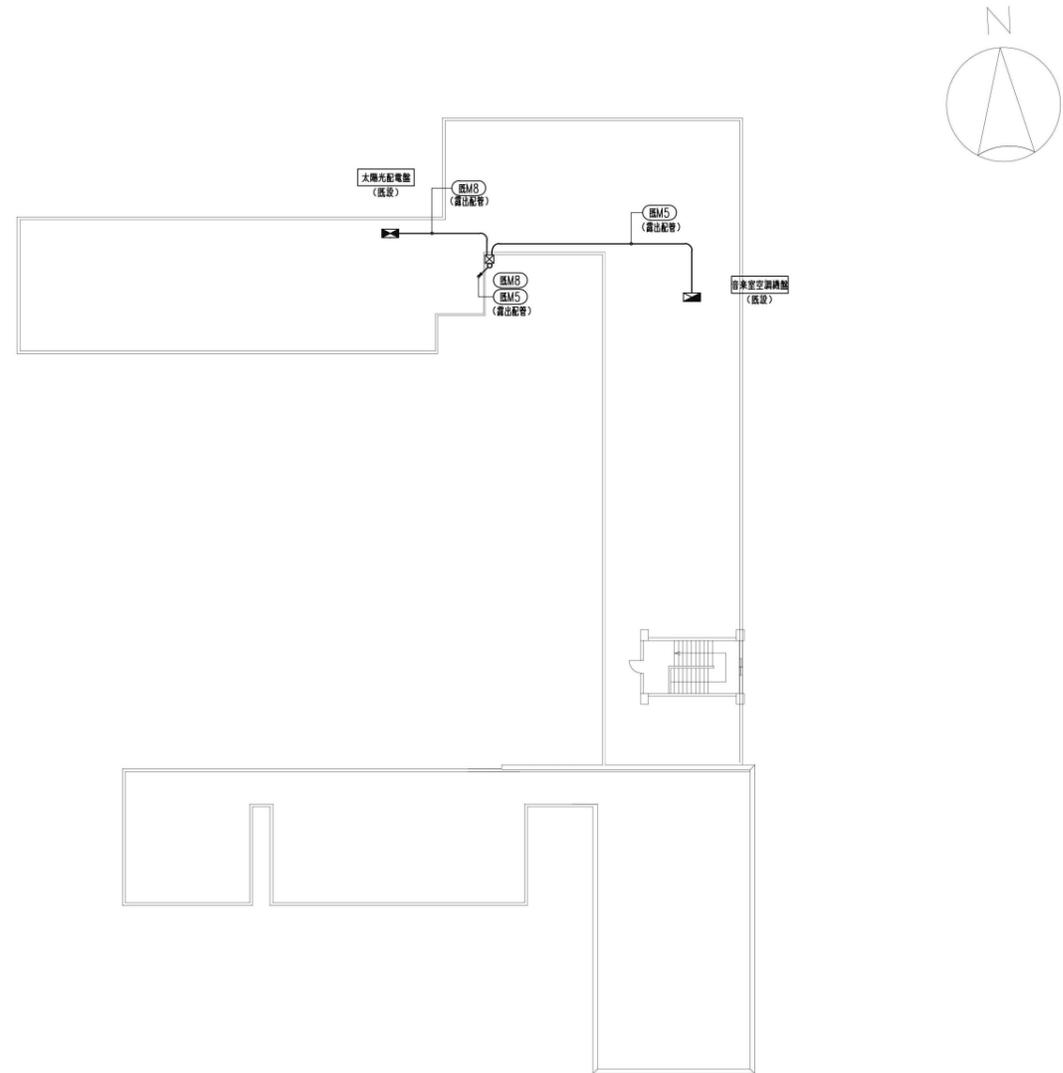

R階平面図 S=1/500


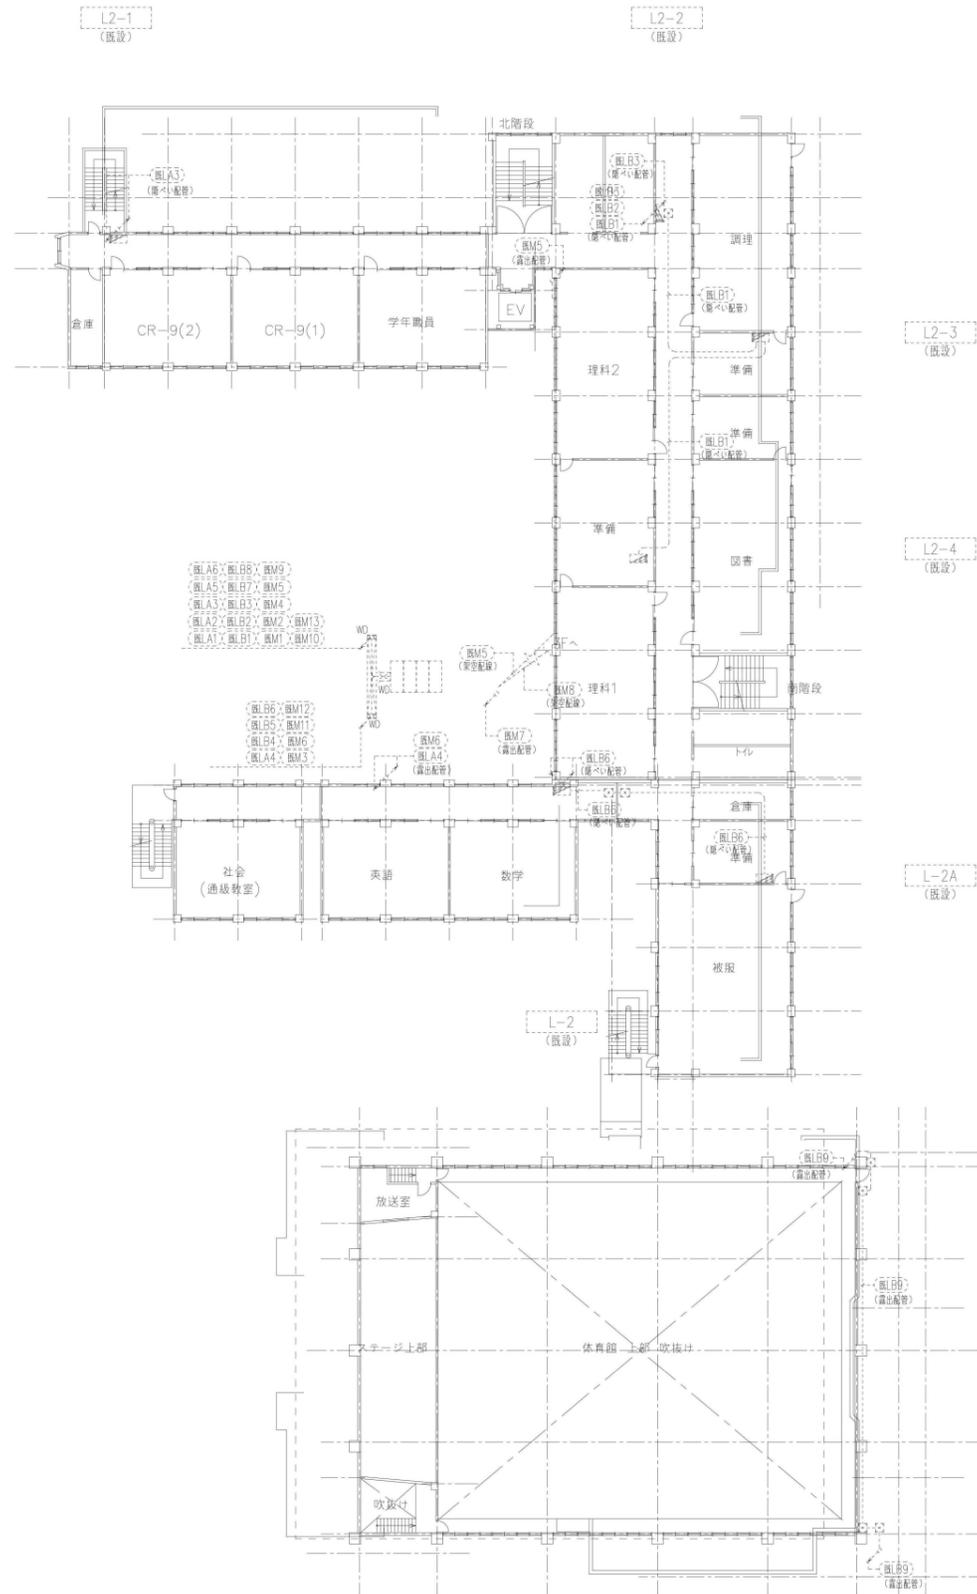



2階平面図 S=1/500

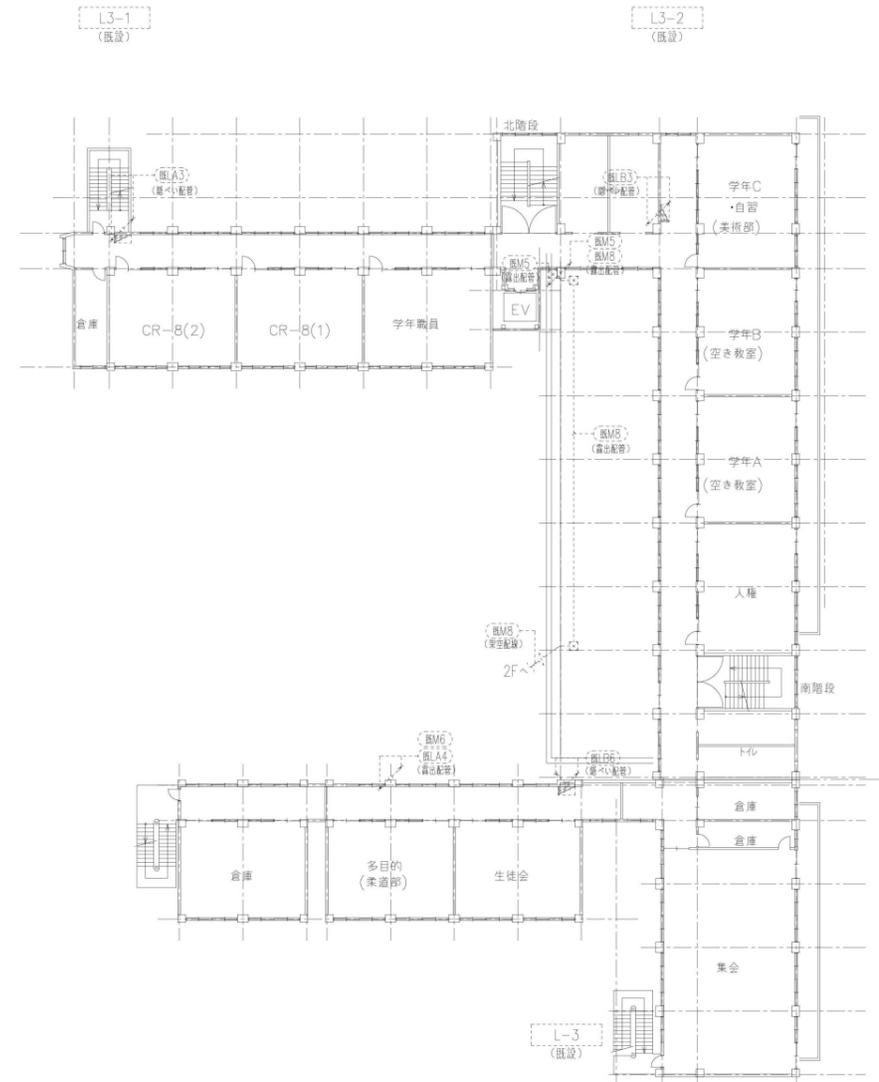

3階平面図 S=1/500


- 注記
1. 図中赤太線は新設、青太線は既設撤去、細線は既設を示す。
 ■は工事対象エリアを示す。
 2. 1-1期工事の主な工事内容は下記とする。
 - ・屋上、音楽室空調機盤及び幹線の撤去
 - ・屋上、太陽光モジュール及び付属盤の移設
 - ・太陽光送り幹線の切換（屋上のプルボックスで切り離してプルボックス以降を新設）
 3. 図面の色の種別は下記を示す。
 - ・赤：新設
 - ・青：既設撤去
 - ・緑：別送引込会社工事（関西電力・NTT等）にて撤去
 - ・オレンジ：別送引込会社工事（関西電力・NTT等）にて新設

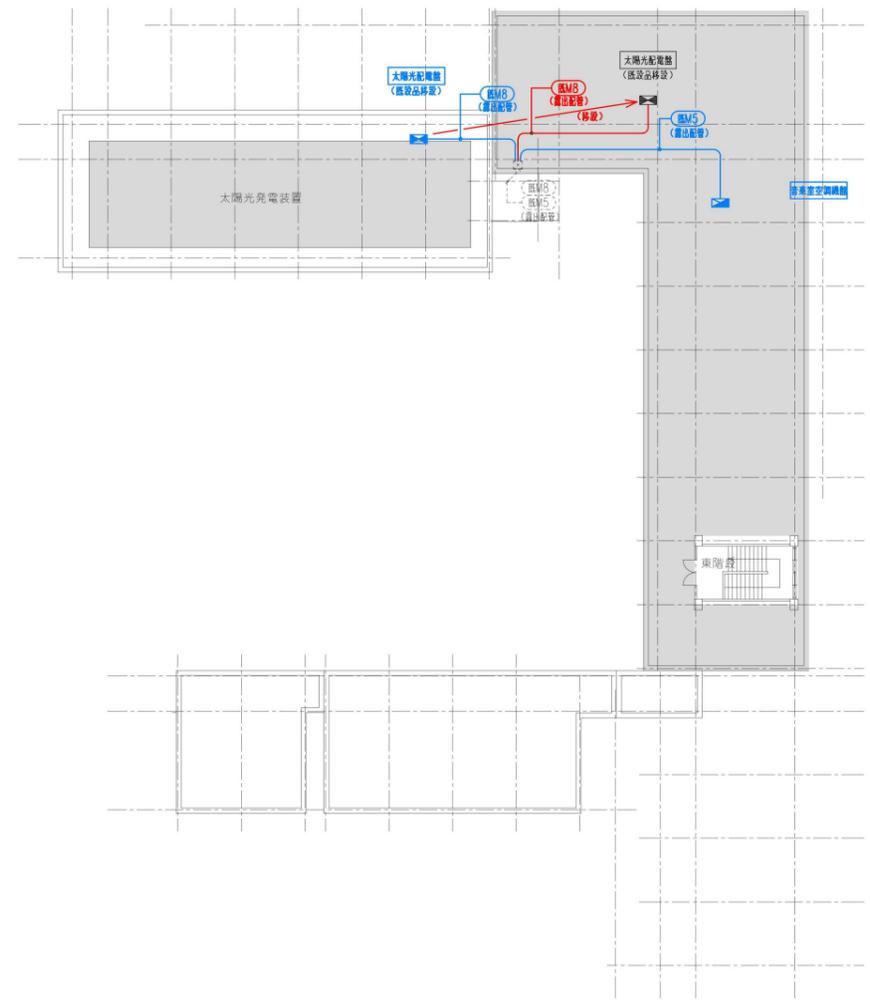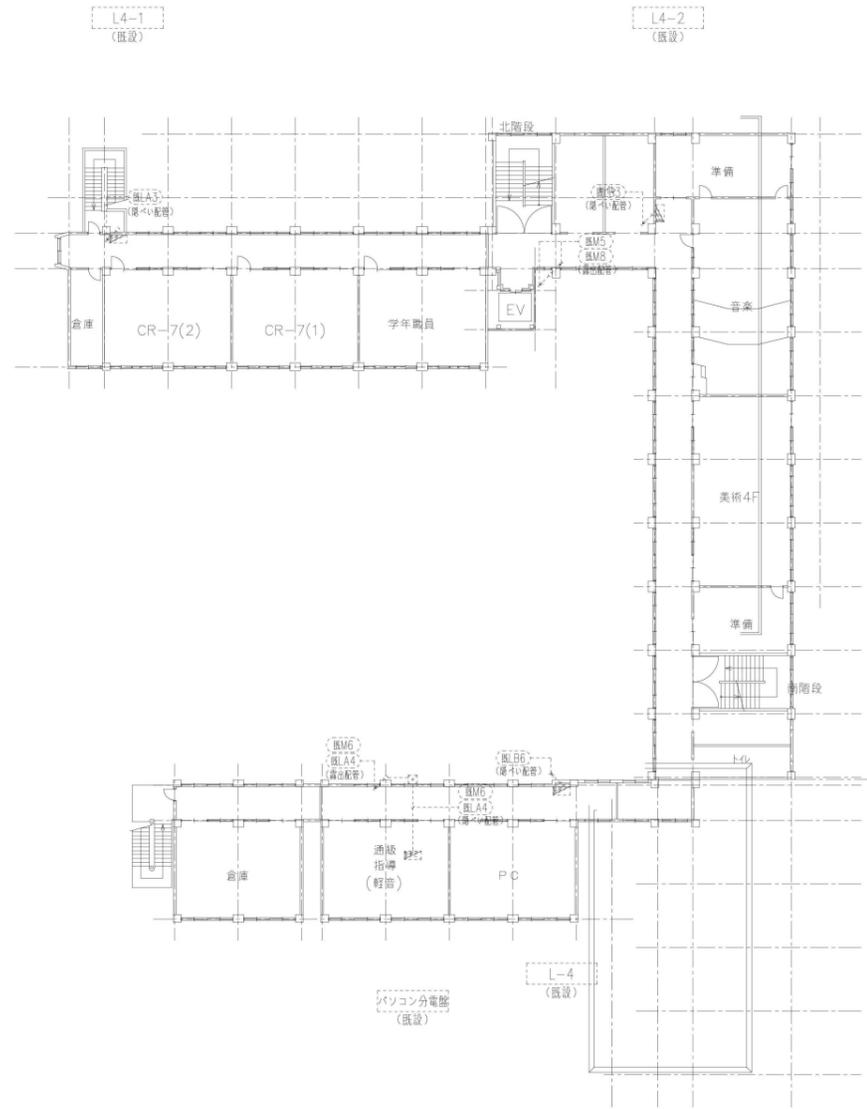

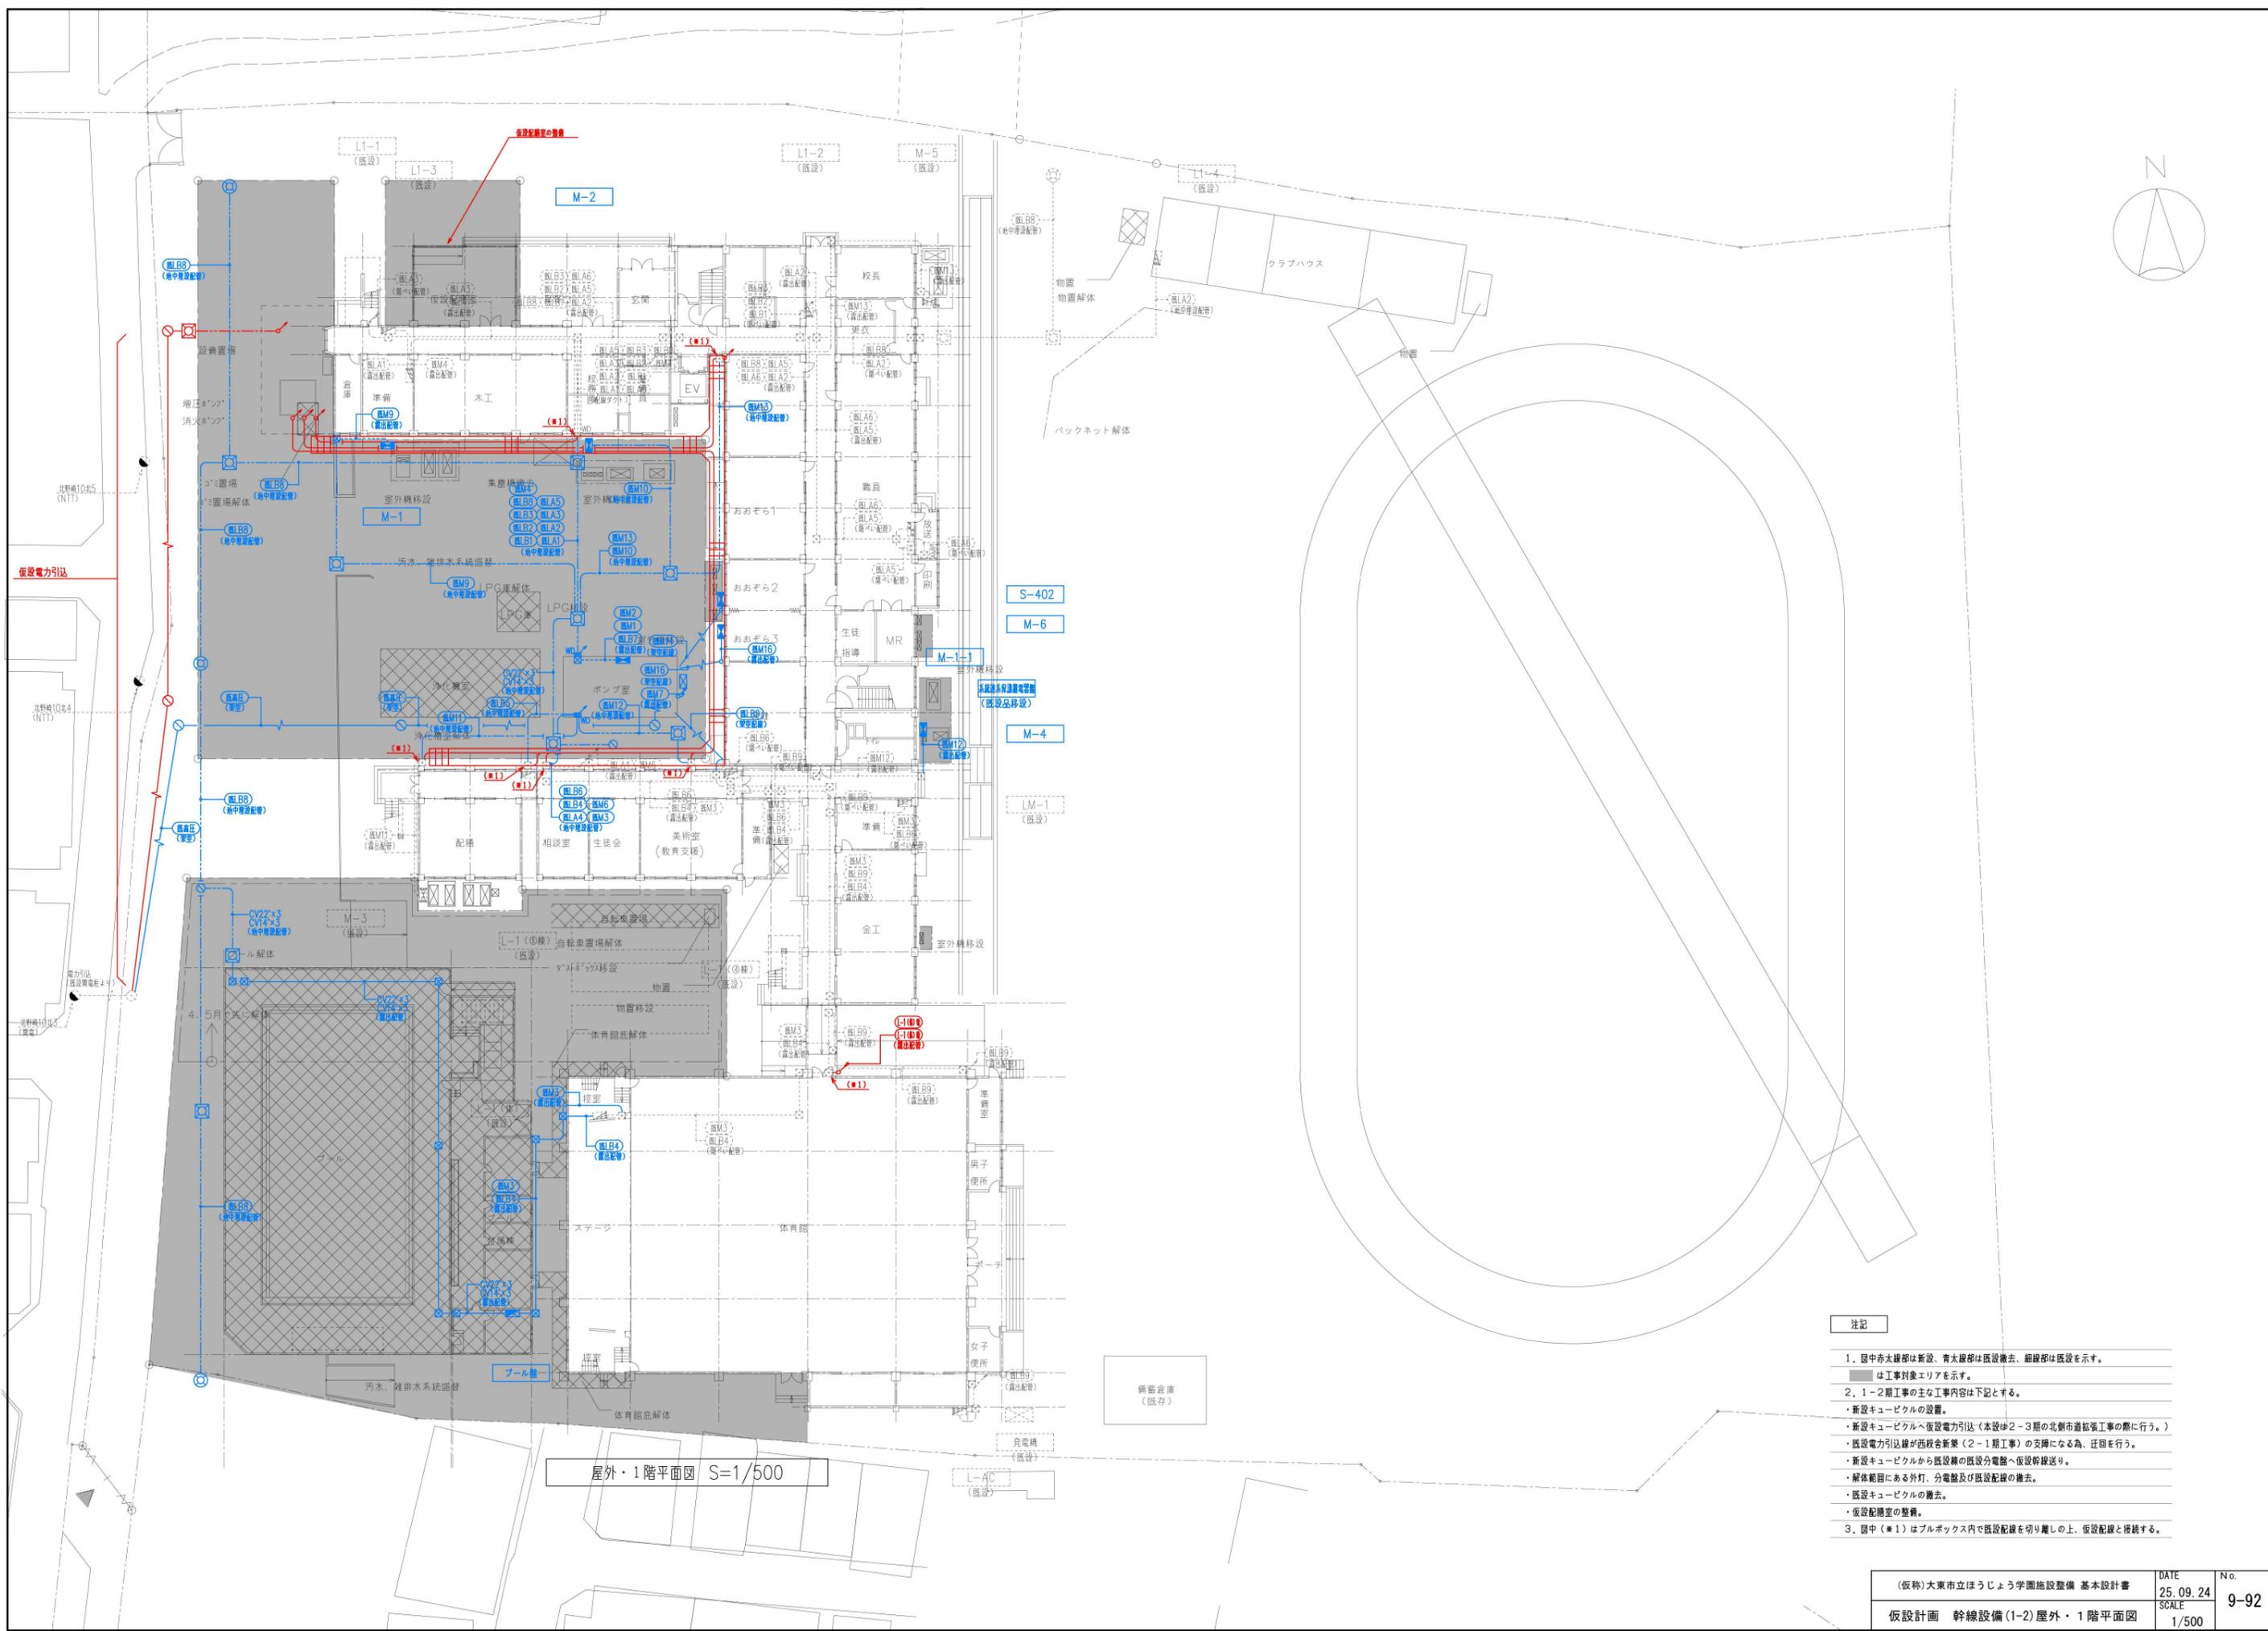


屋外・1階平面図 S=1/500


- 注記
1. 図中赤太線部は新設、青太線部は既設撤去、細線部は既設を示す。
■は工事対象エリアを示す。
 2. 1-2期工事の主な工事内容は下記とする。
 - ・新設キュービクルの設置。
 - ・新設キュービクルへ仮設電力引込（本設は2-3期の北創市道拡張工事の際に行う。）
 - ・既設電力引込線が西校舎新築（2-1期工事）の支障になる為、迂回を行う。
 - ・新設キュービクルから既設線の既設分電盤へ仮設幹線送り。
 - ・解体範囲にある外灯、分電盤及び既設配線の撤去。
 - ・既設キュービクルの撤去。
 - ・仮設配膳室の整備。
 3. 図中（●1）はプルボックス内で既設配線を切り離しの上、仮設配線と接続する。

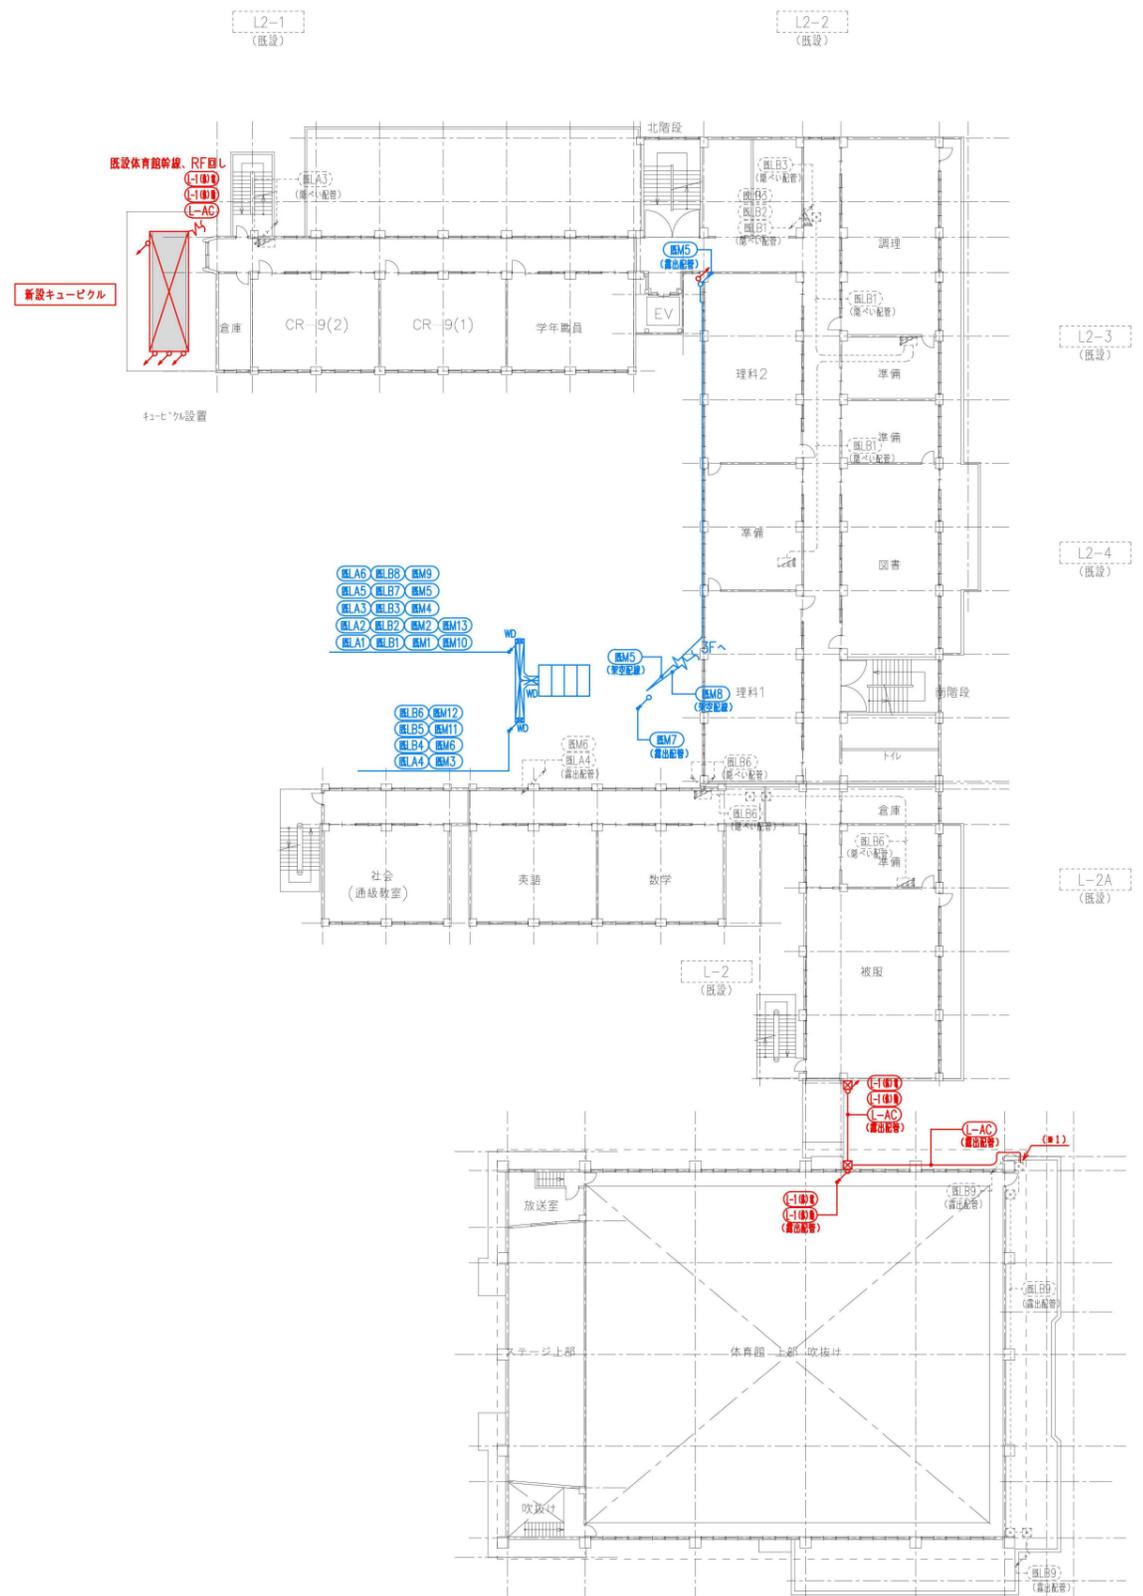


2階平面図 S=1/500

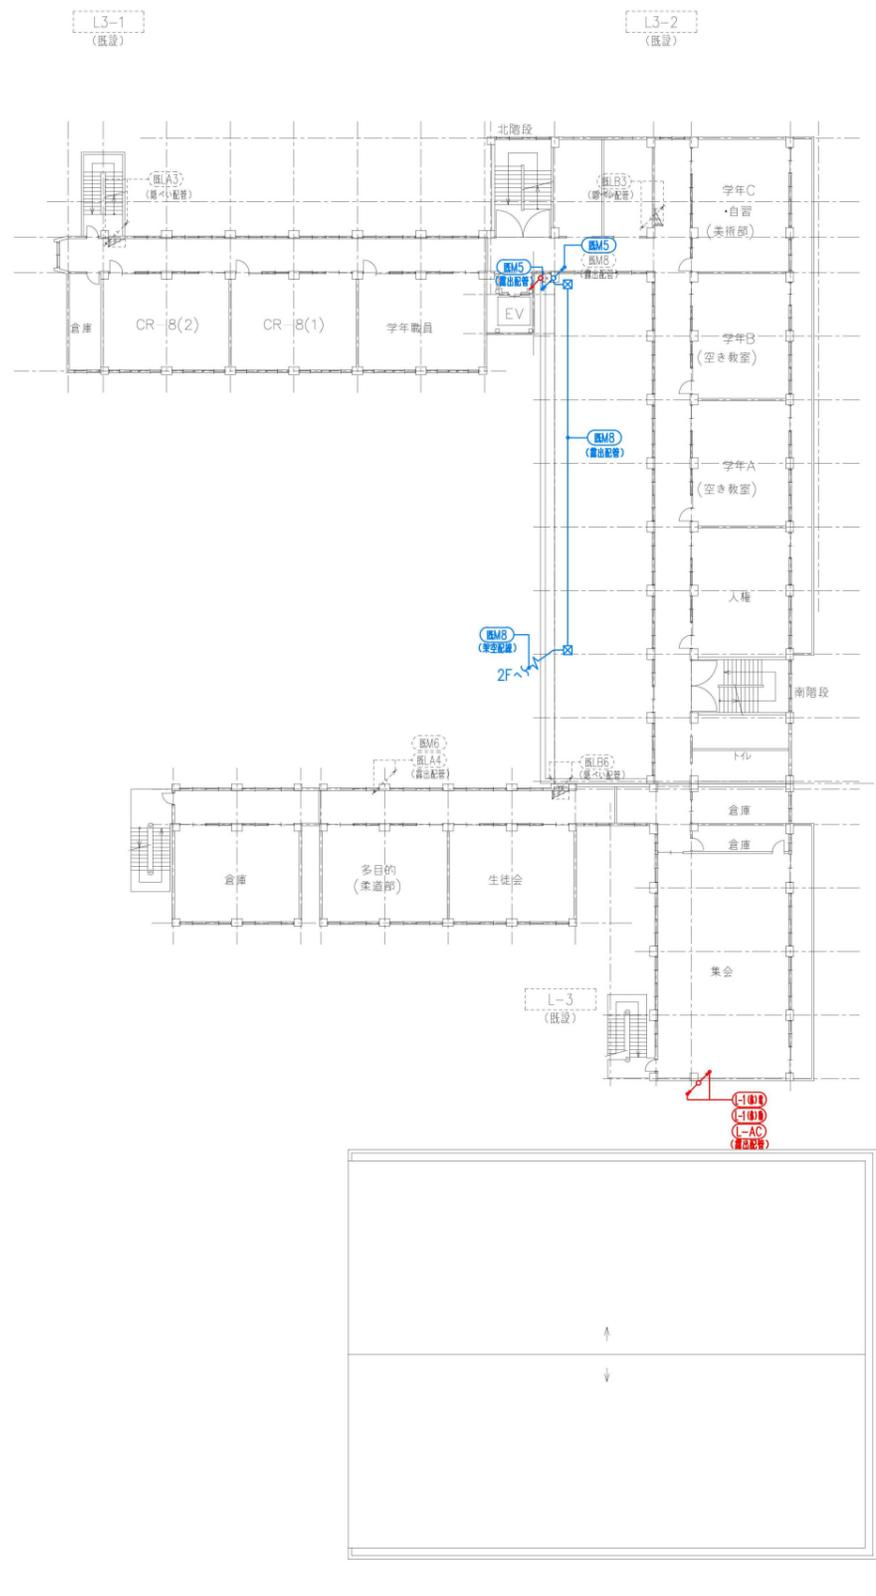


3階平面図 S=1/500

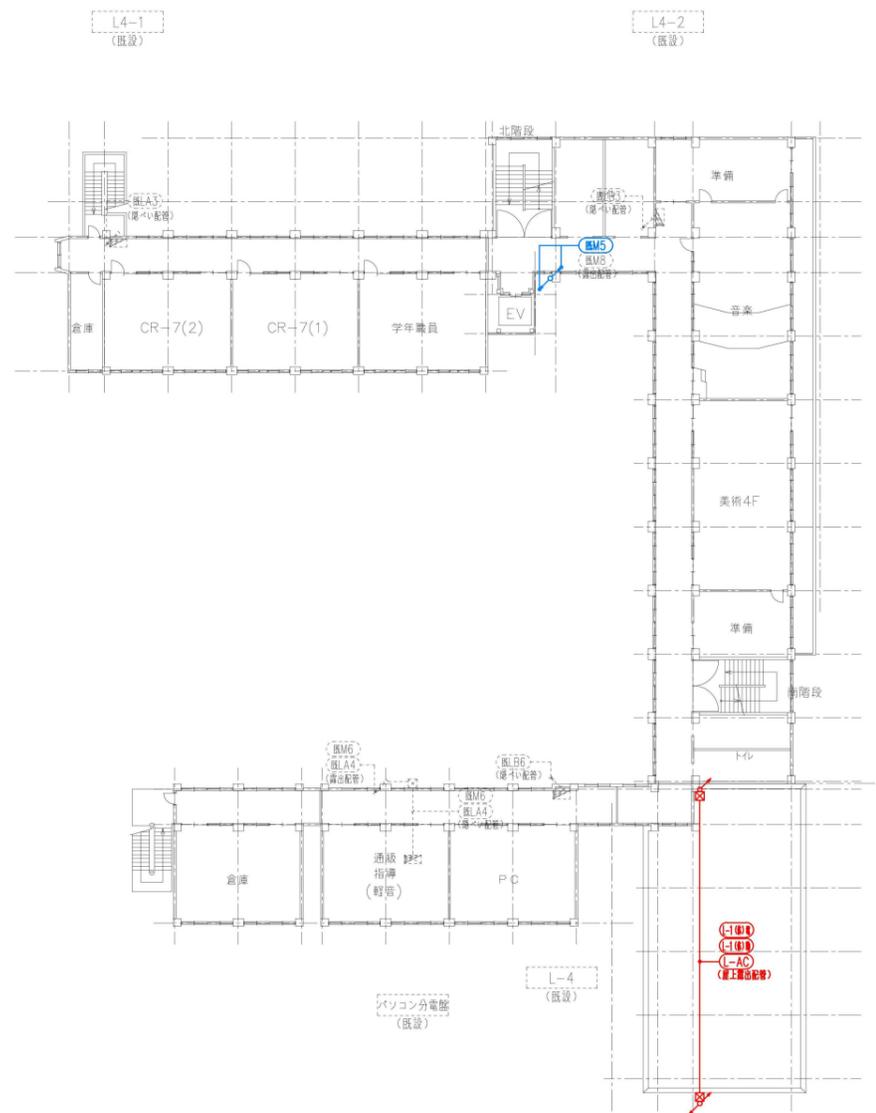

4階平面図 S=1/500

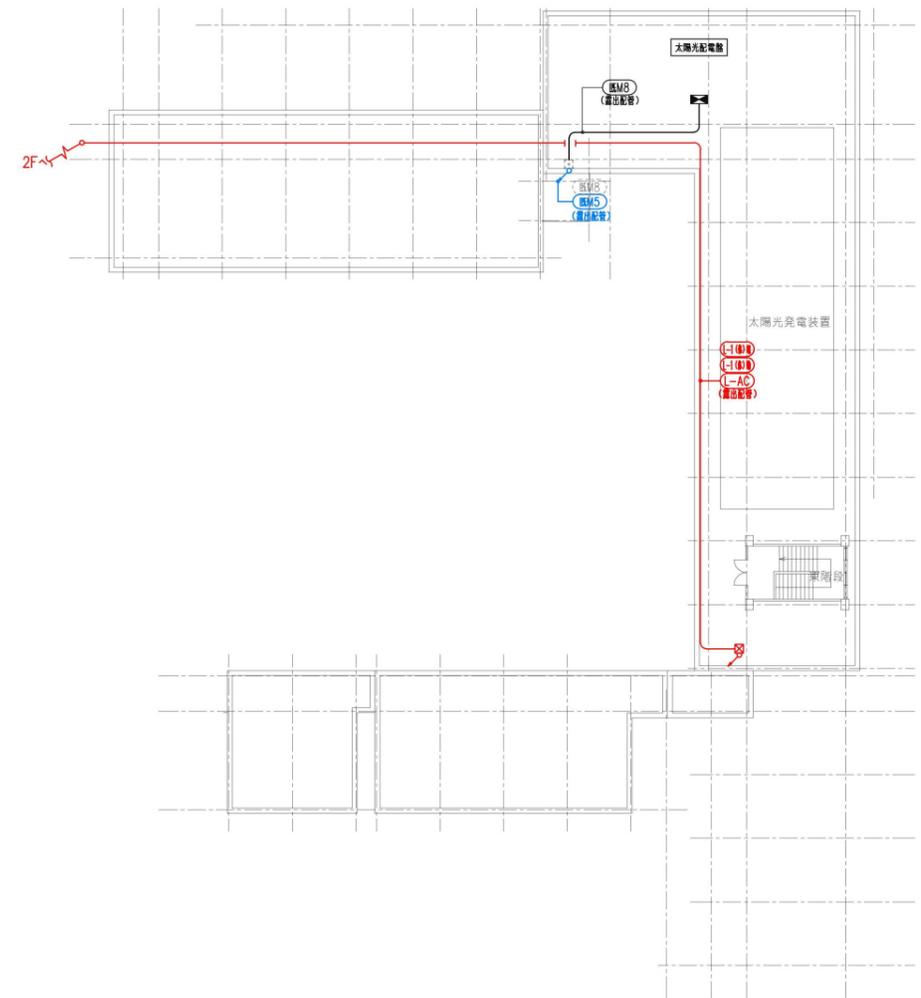



R階平面図 S=1/500

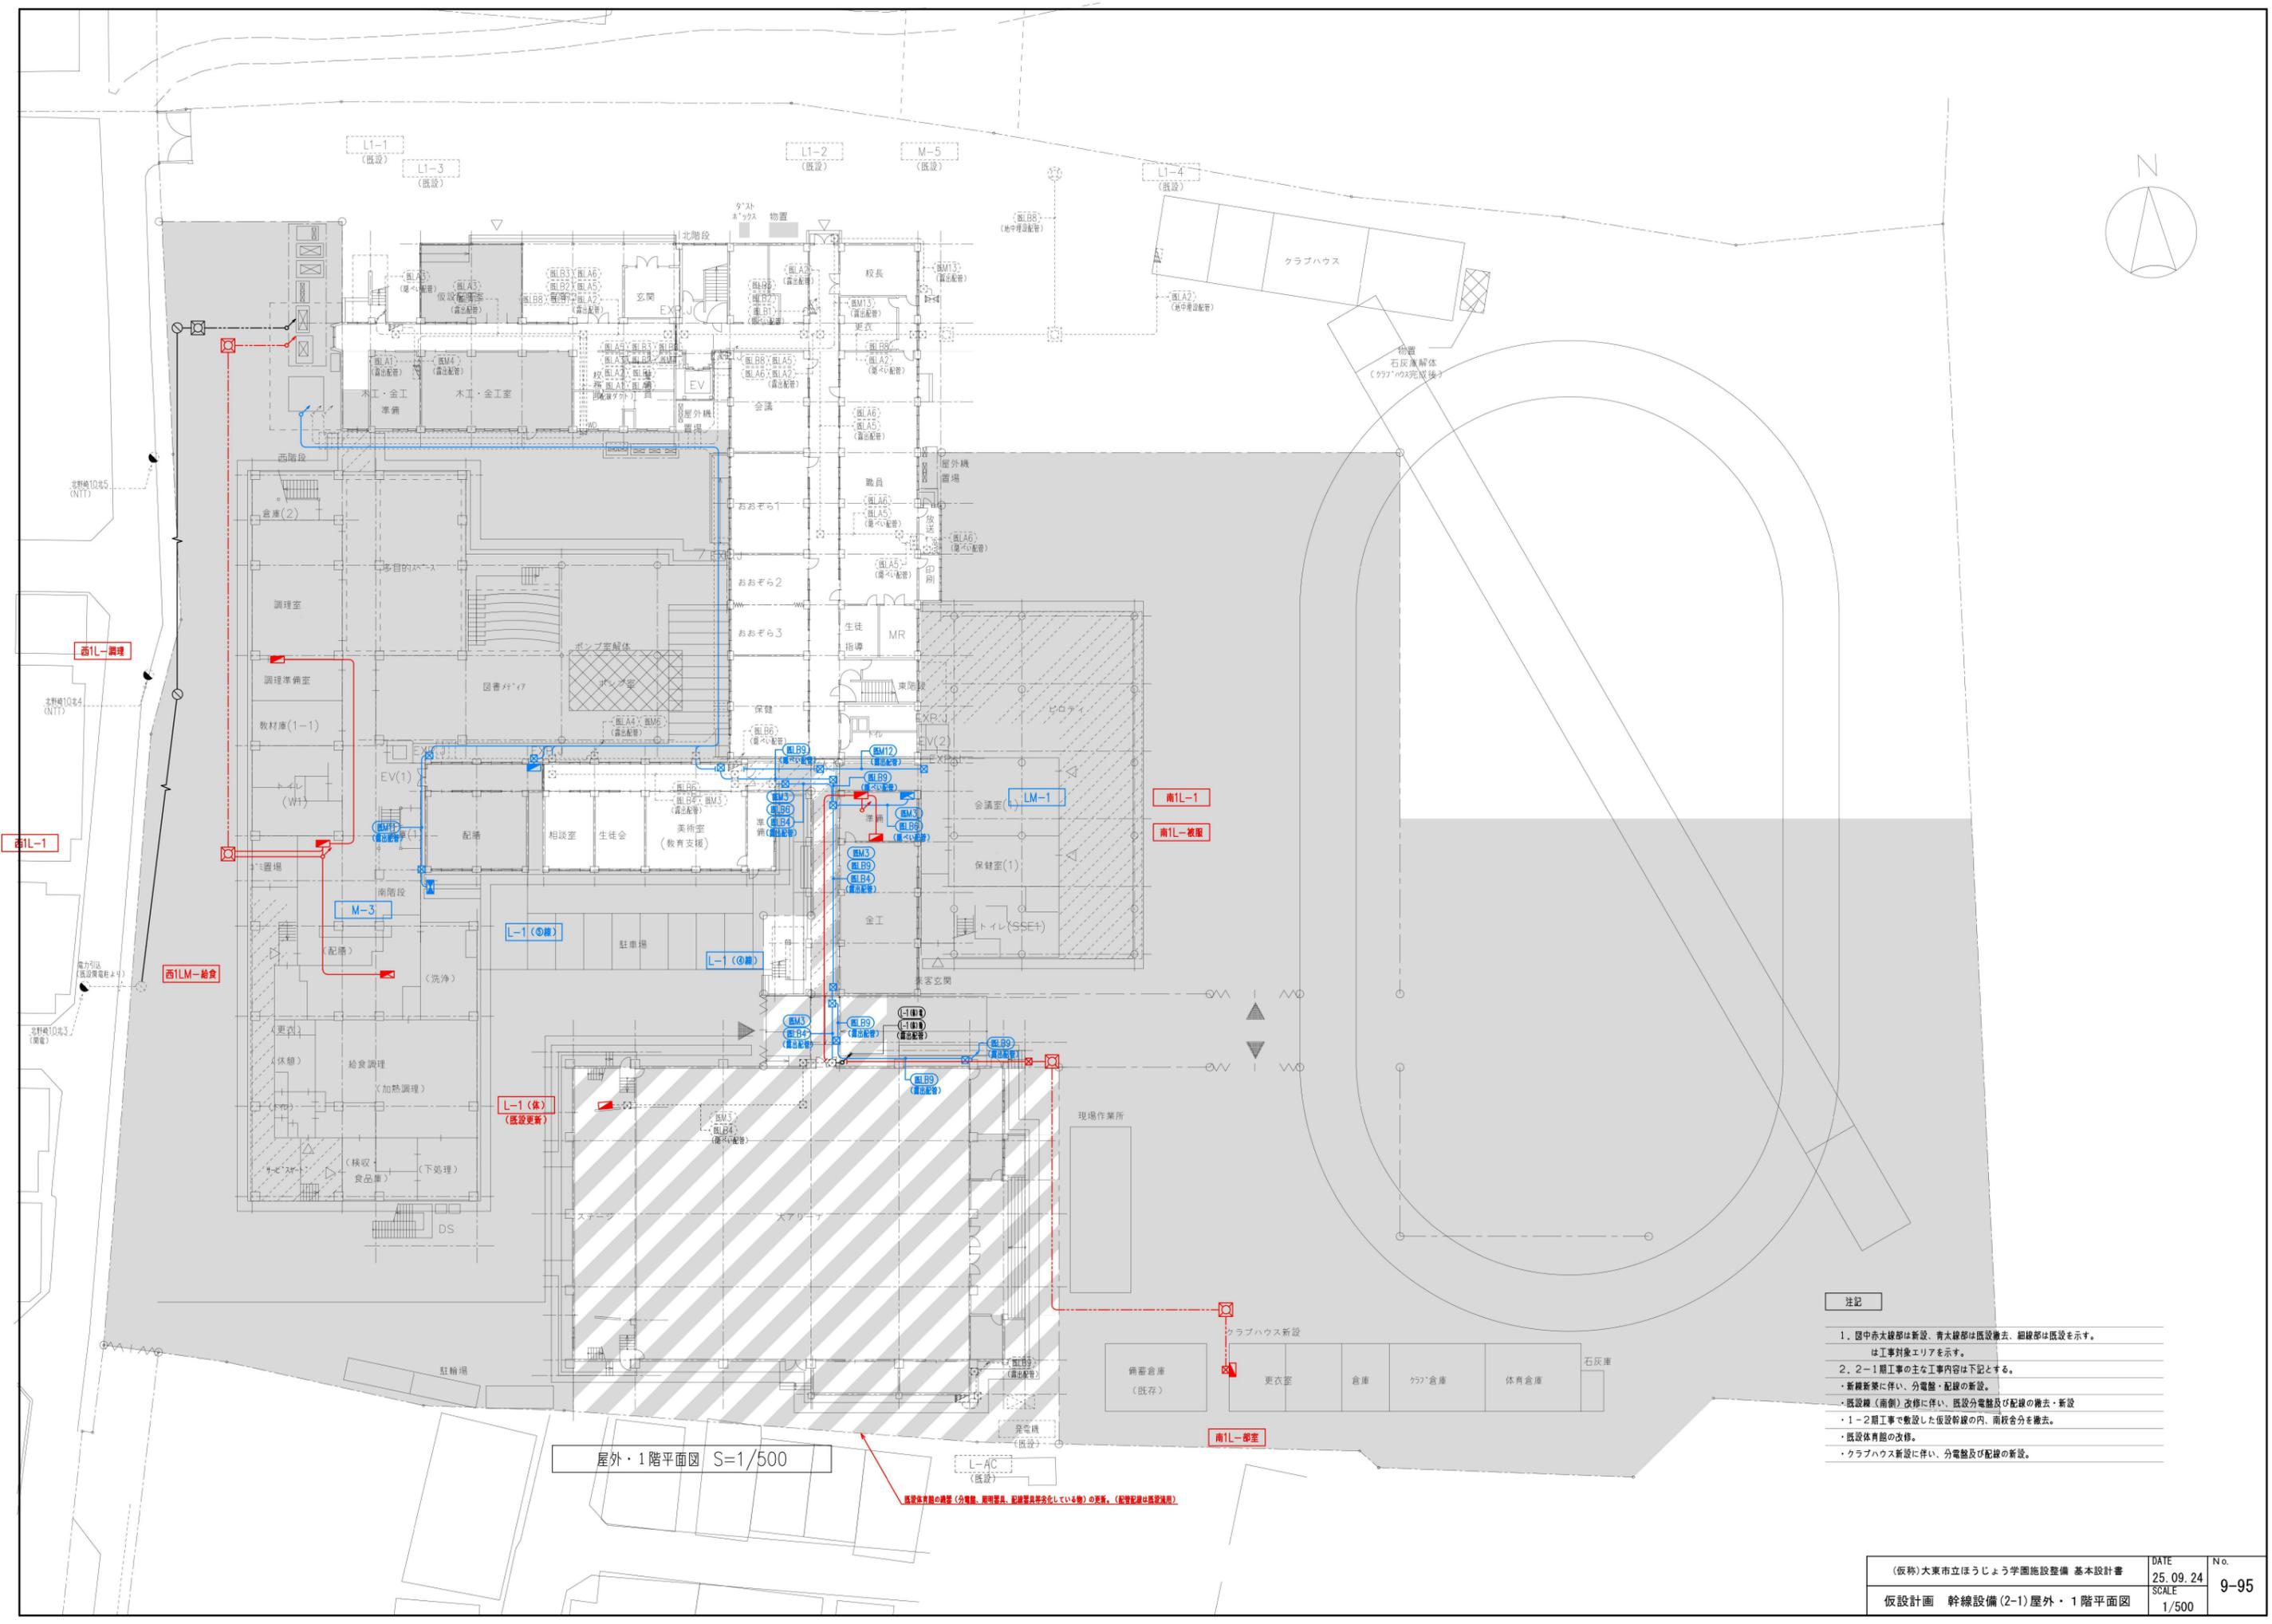


屋外・1階平面図 S=1/500

※図中赤太線部は新設、青太線部は既設撤去、細線部は既設を示す。


- 注記
1. 図中赤太線部は新設、青太線部は既設撤去、細線部は既設を示す。
は工事対象エリアを示す。
 2. 2-1期工事の主な工事内容は下記とする。
 - ・新棟新築に伴い、分電盤・配線の新設。
 - ・既設棟(南側)改修に伴い、既設分電盤及び配線の撤去・新設
 - ・1-2期工事で敷設した仮設幹線の内、南校舎分を撤去。
 - ・既設体育館の改修。
 - ・クラブハウス新設に伴い、分電盤及び配線の新設。

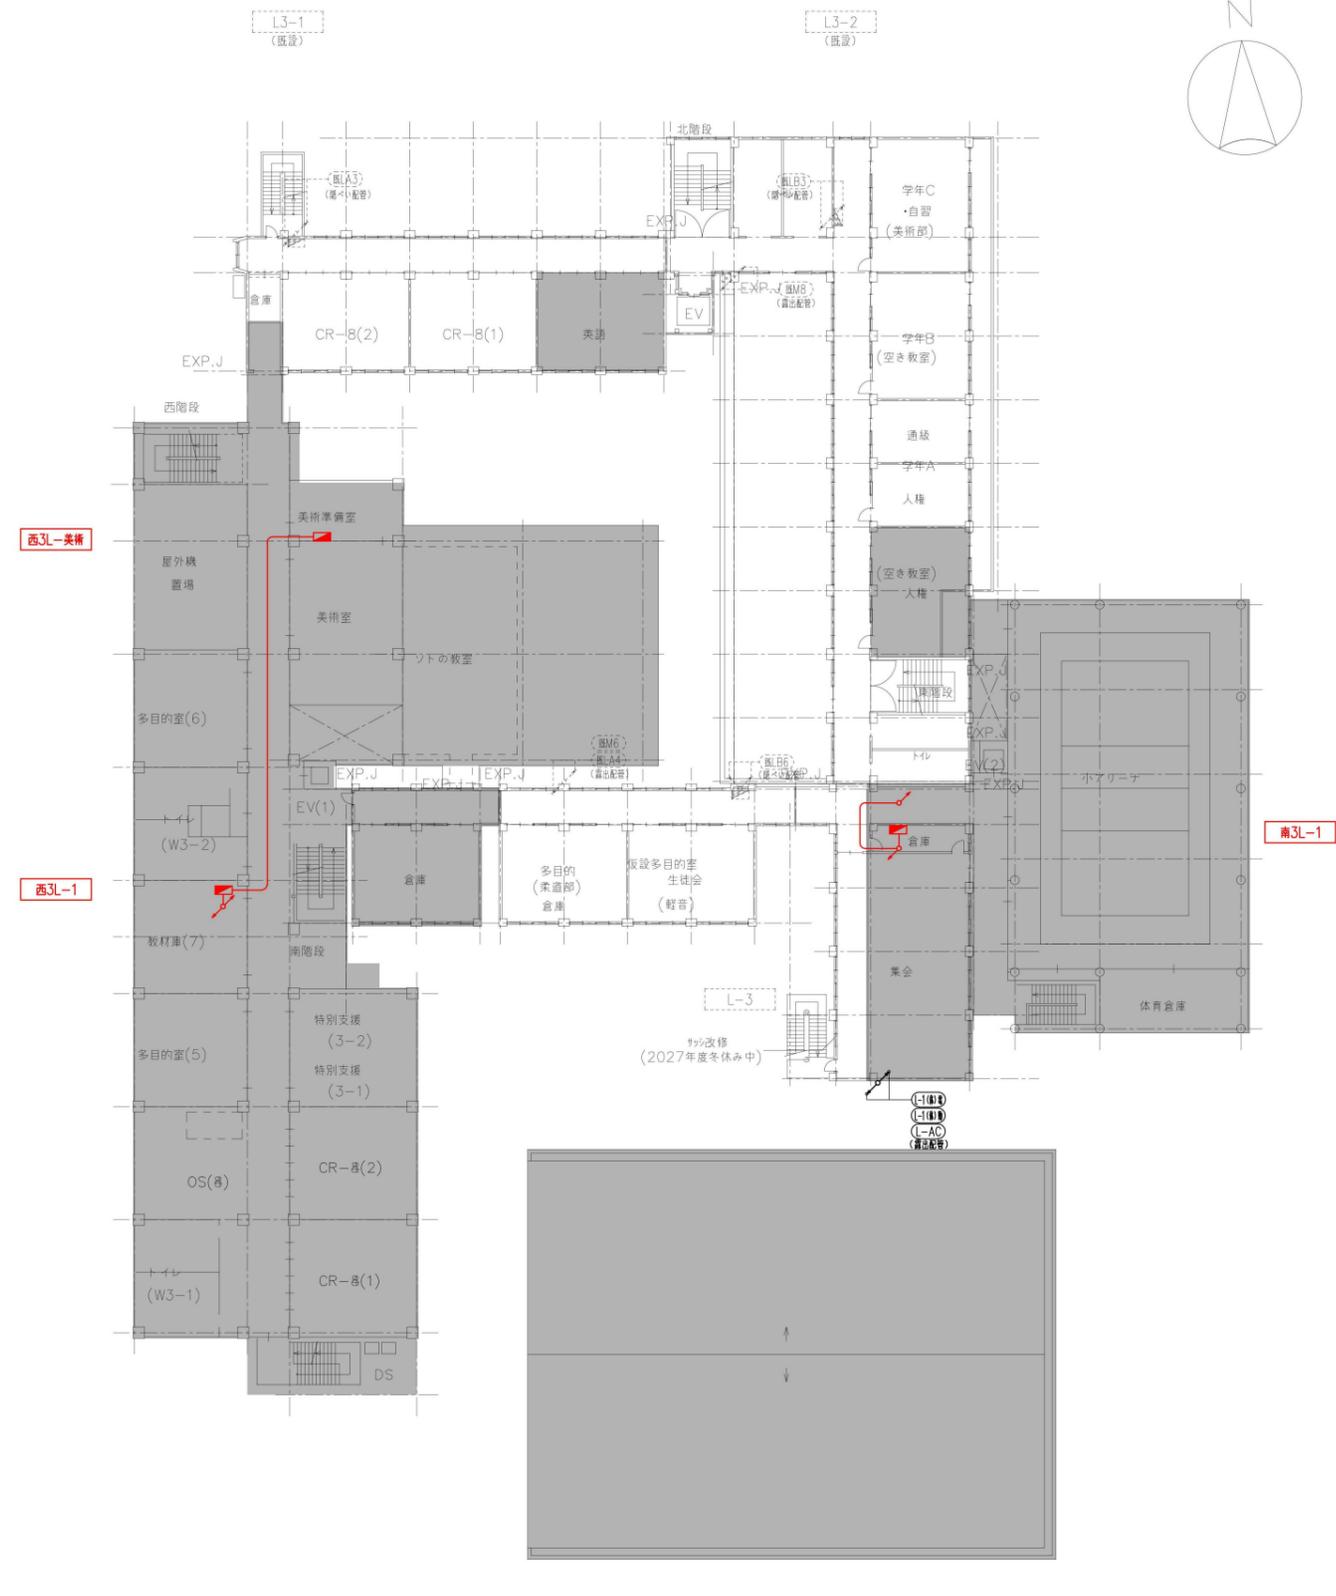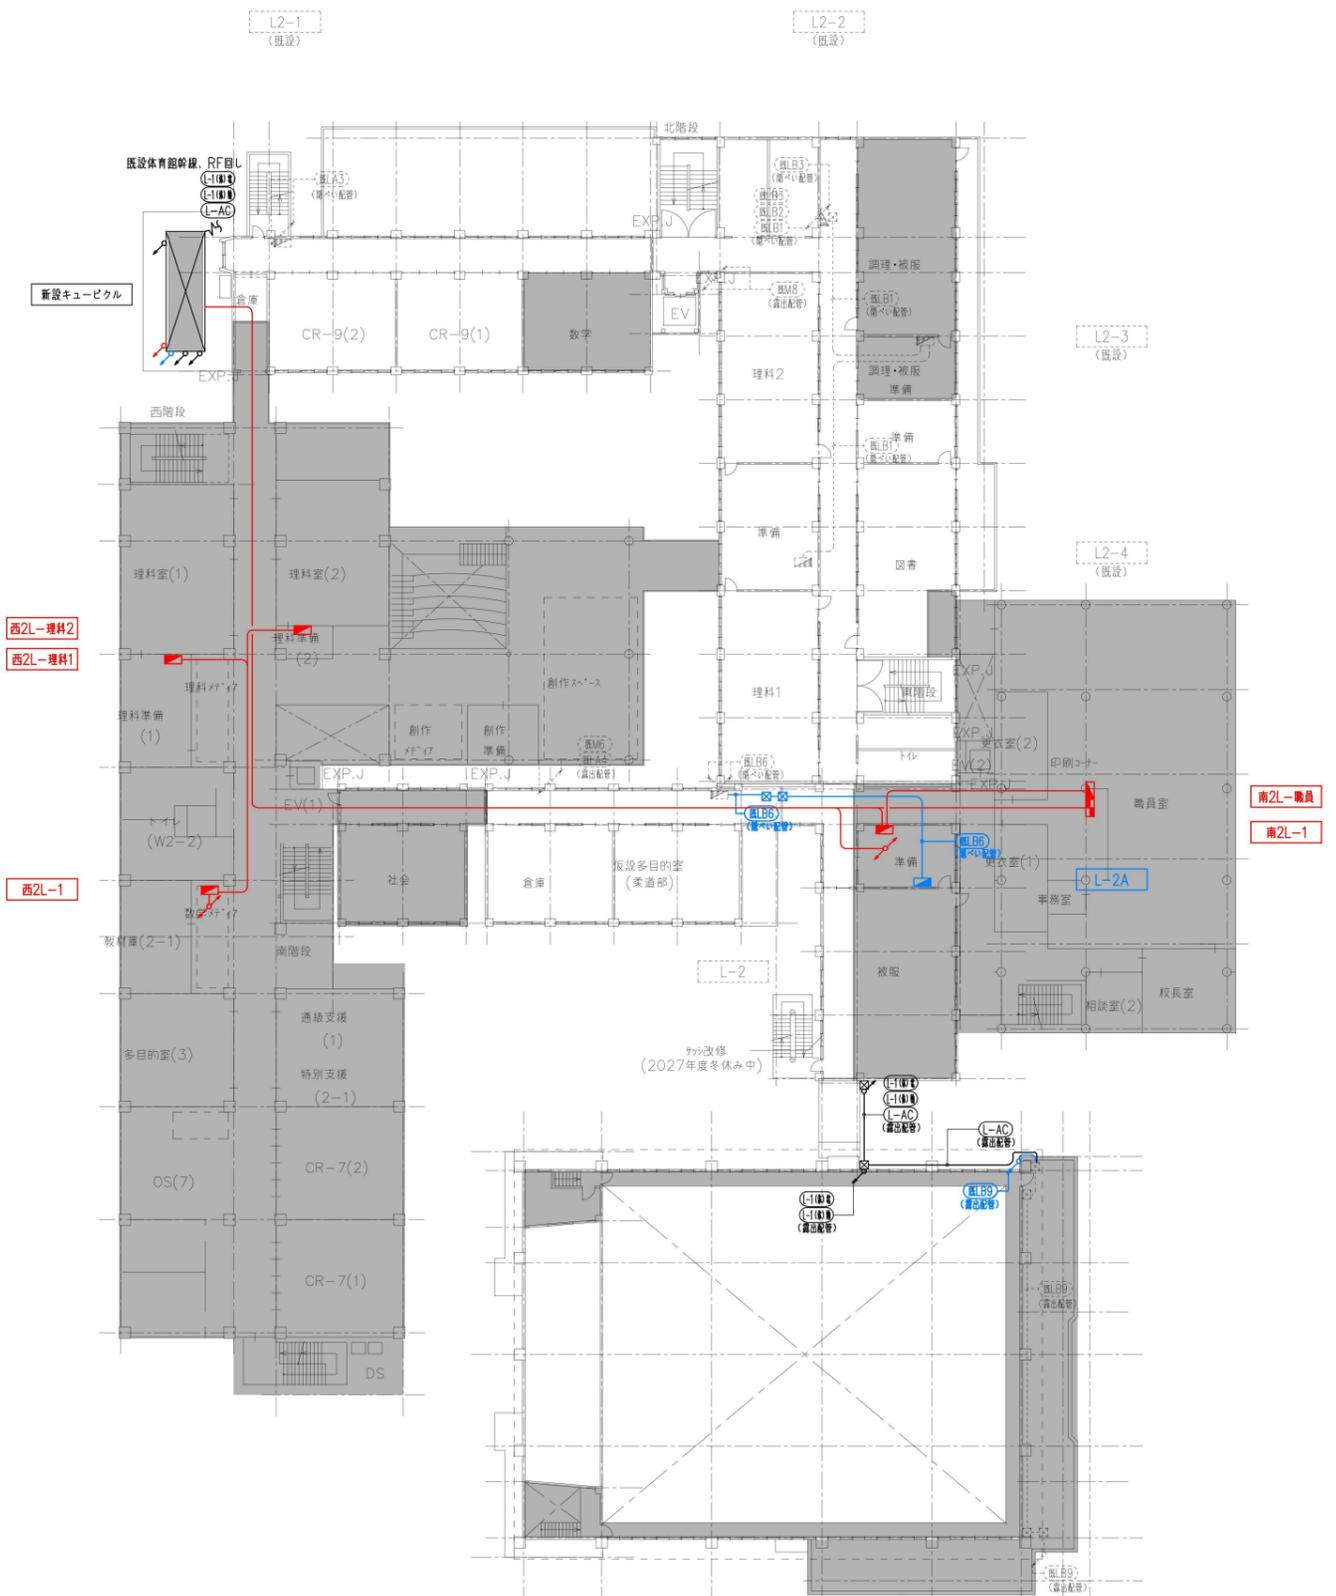


既設体育館幹線（分電盤、照明器具、配線器具等）の更新。（配線図は既設用）

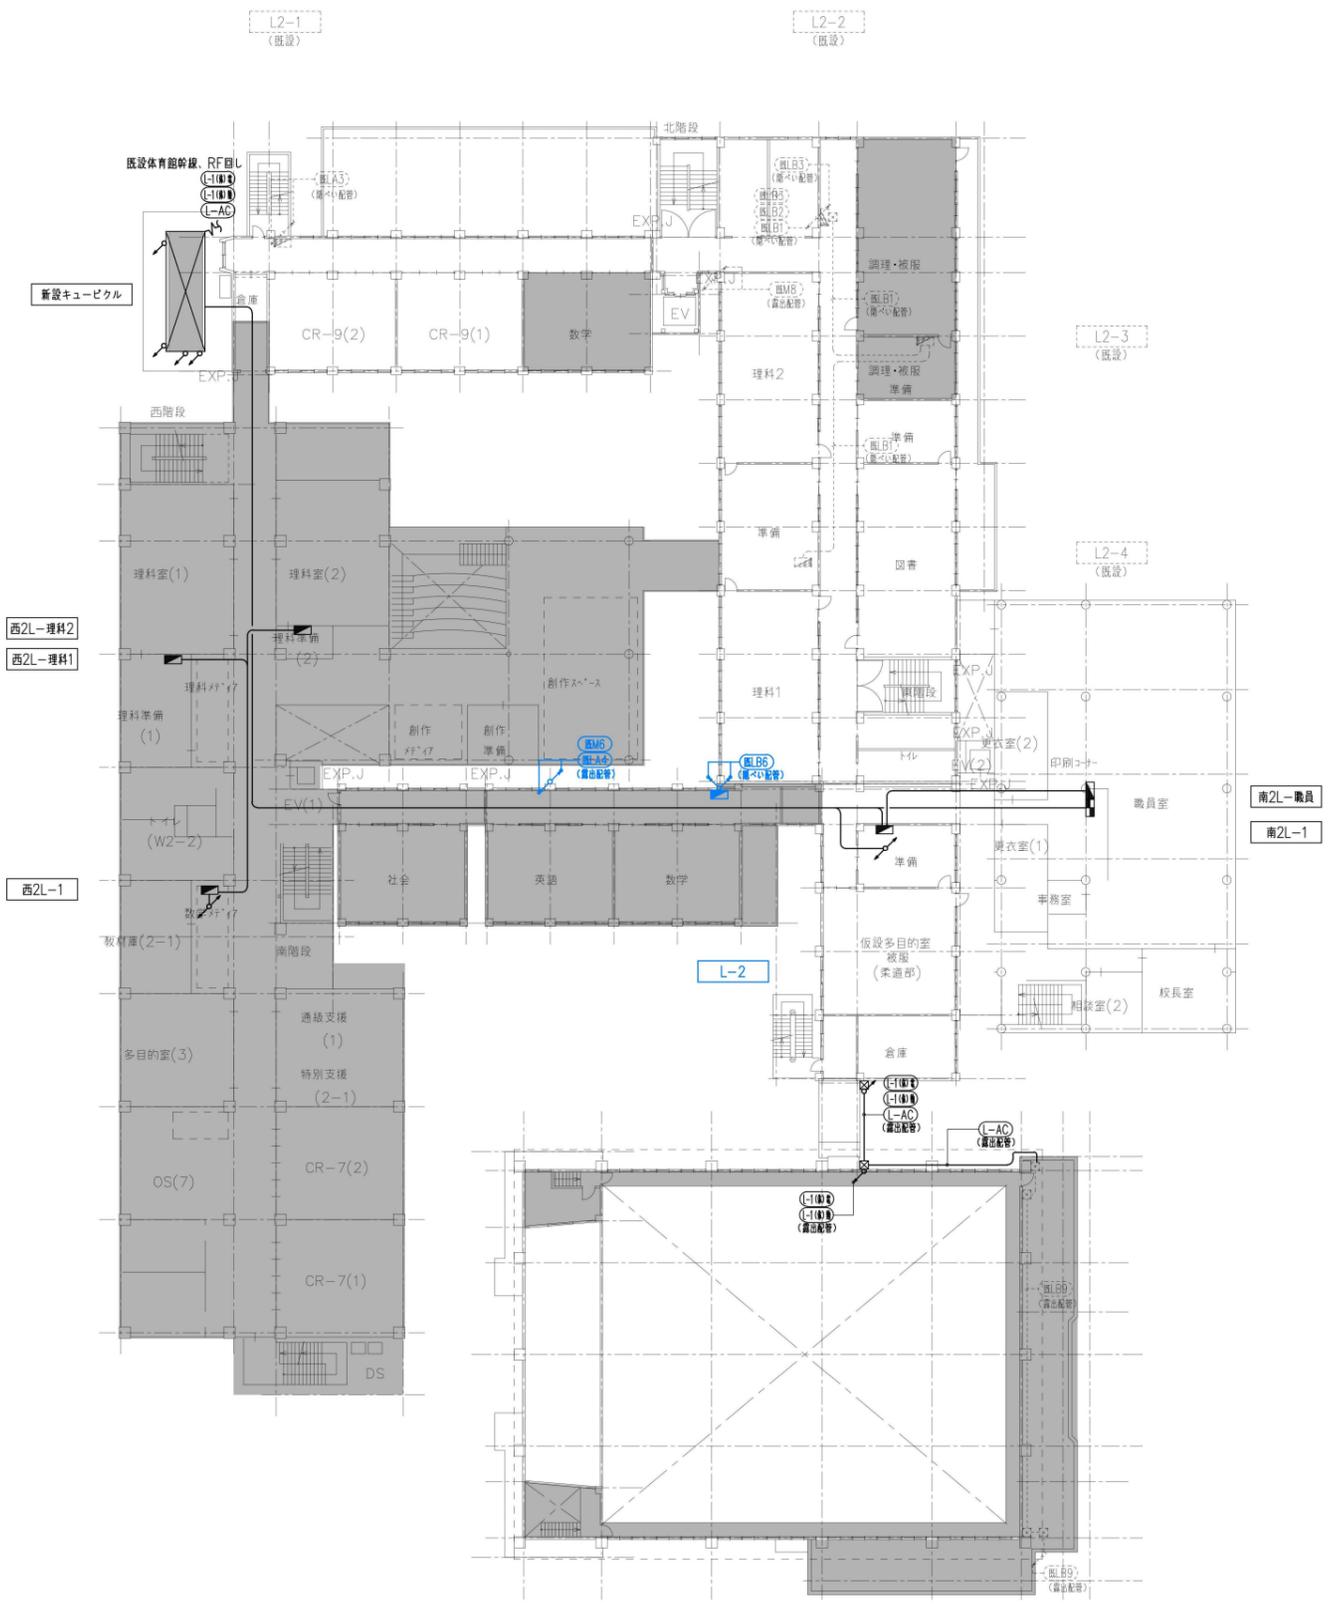


2階平面図 S=1/500

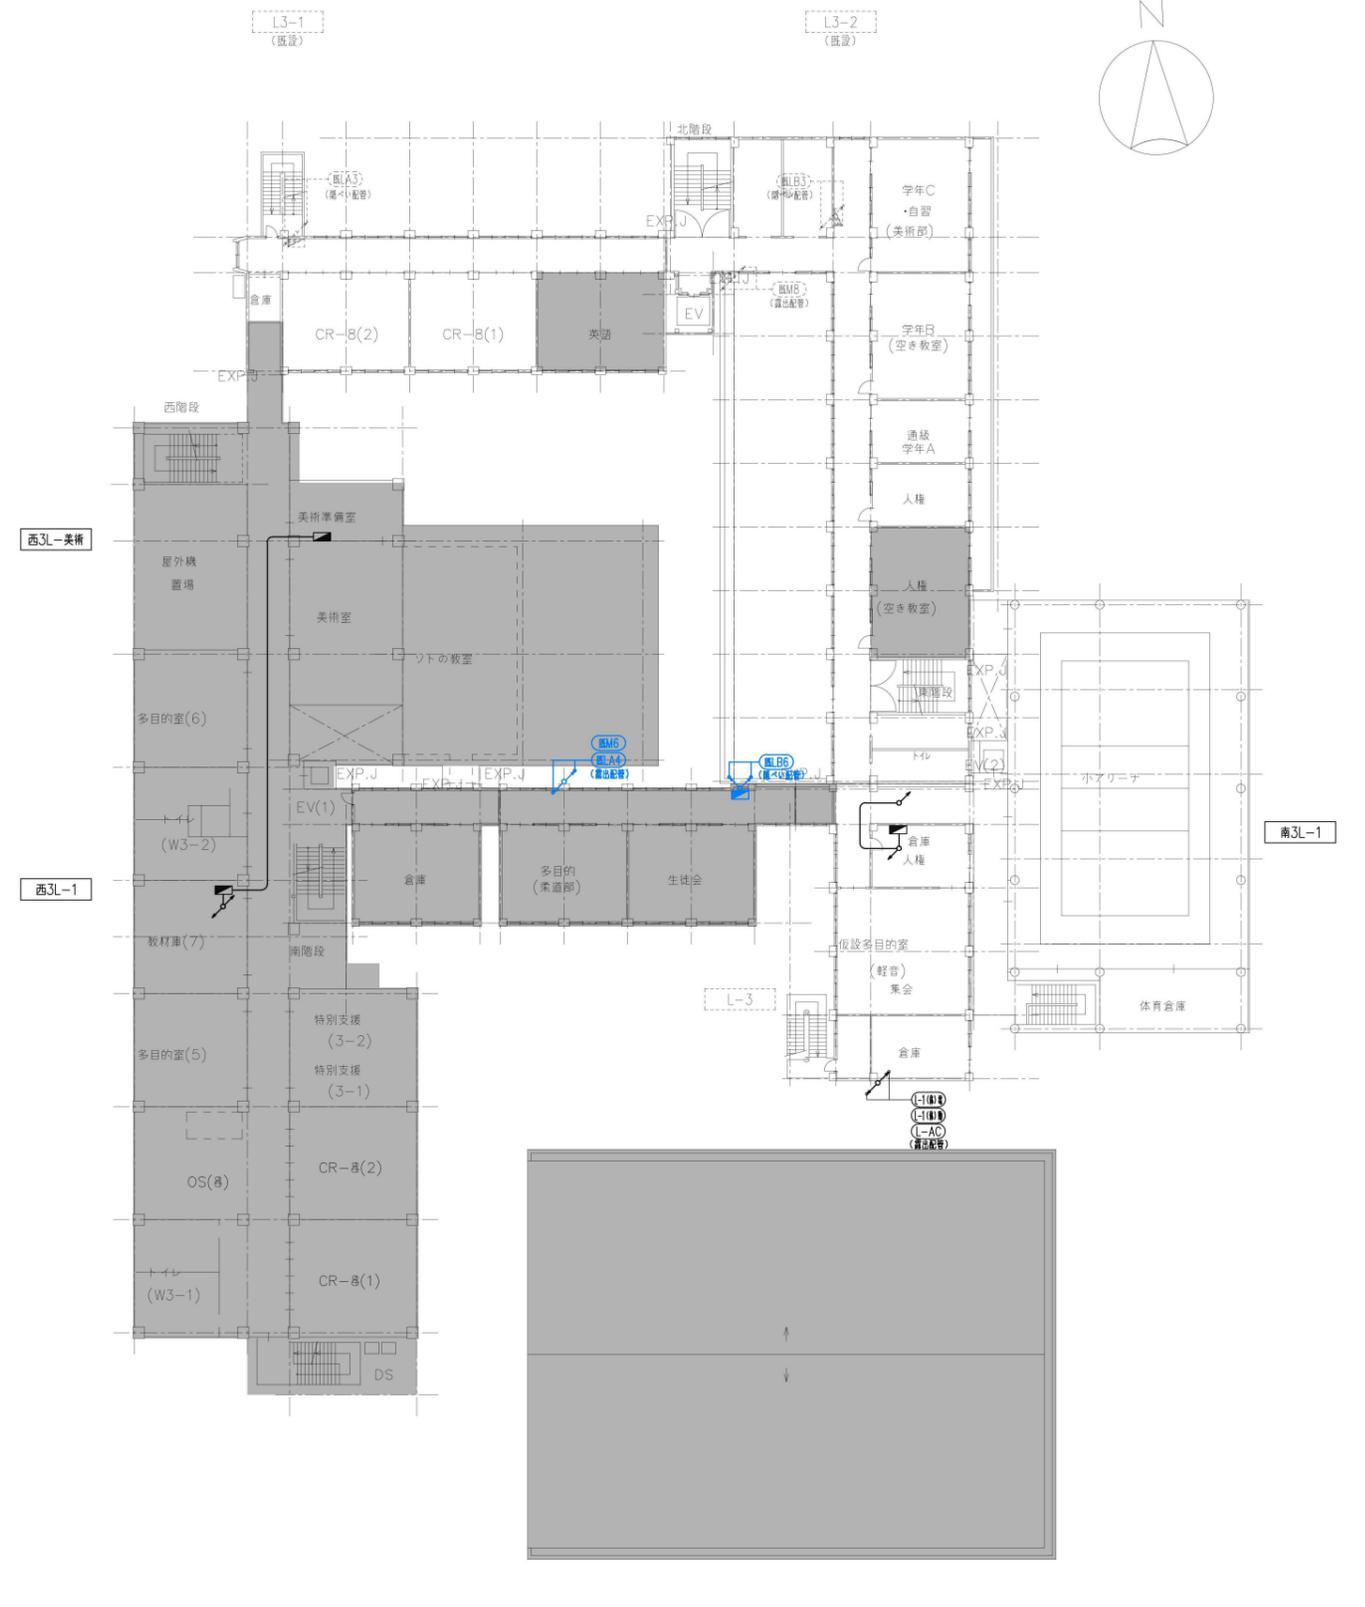


3階平面図 S=1/500

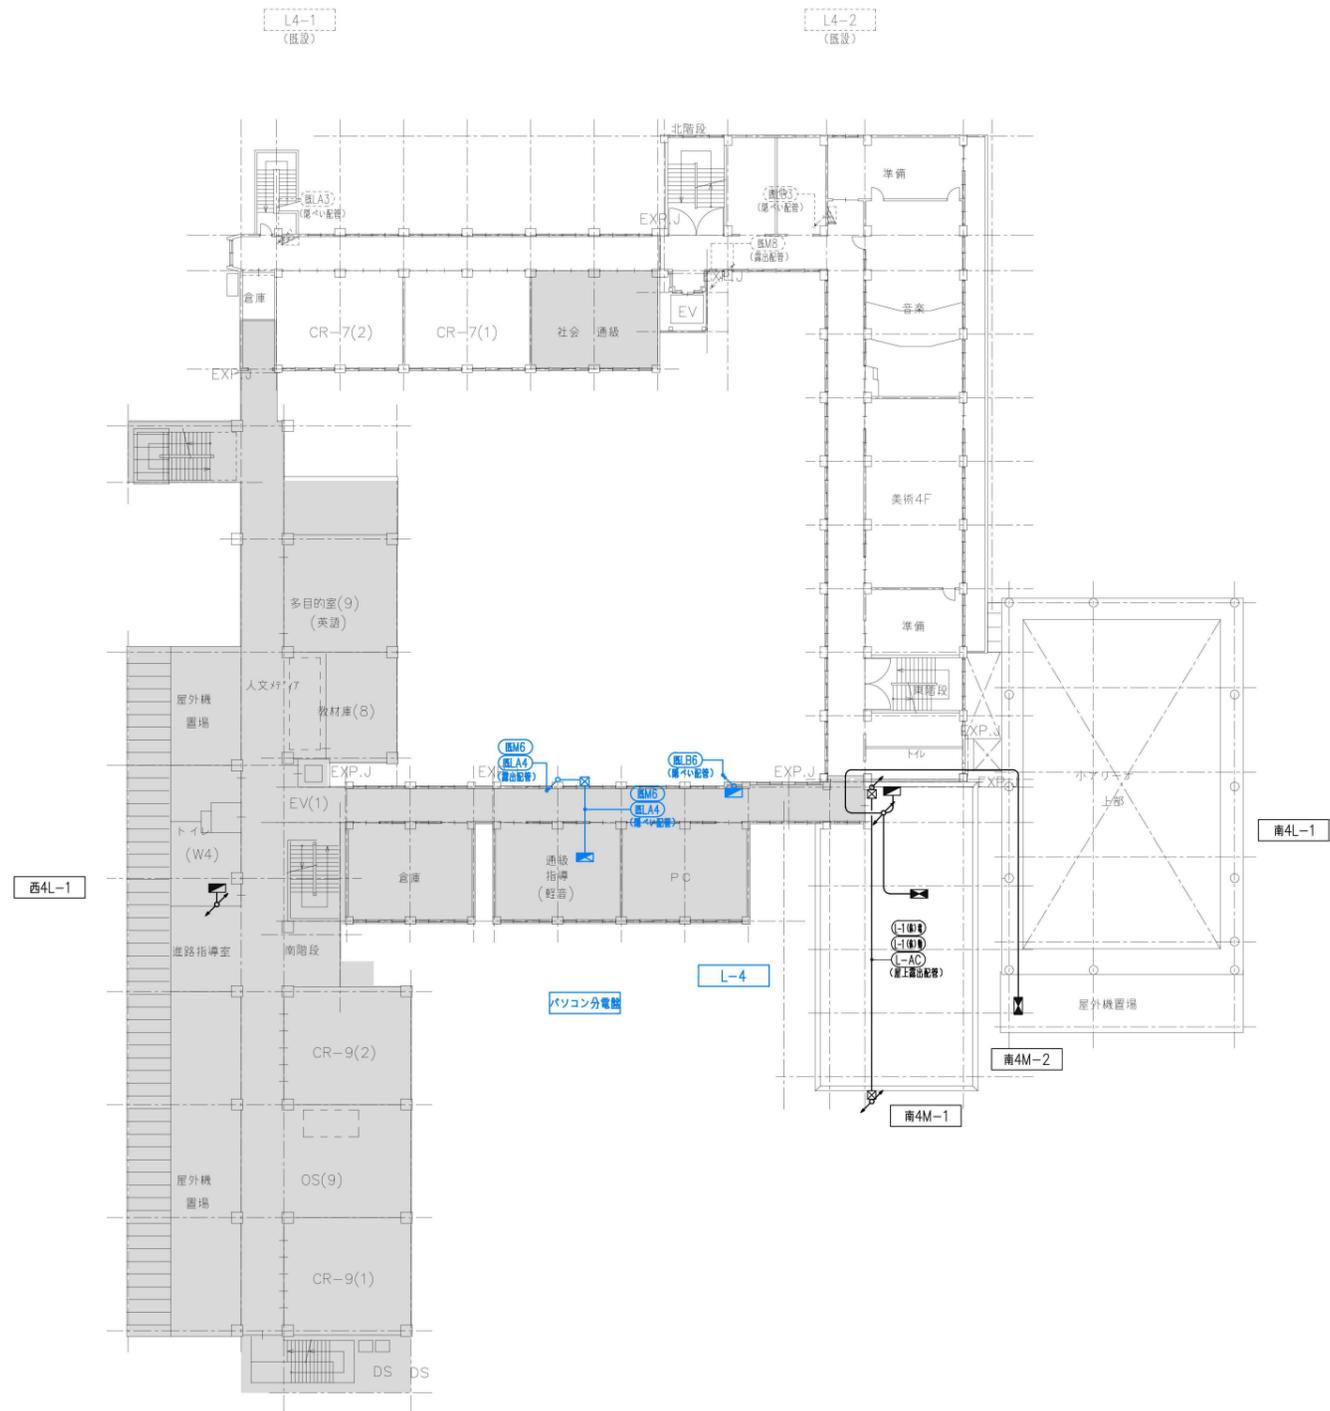

4階平面図 S=1/500

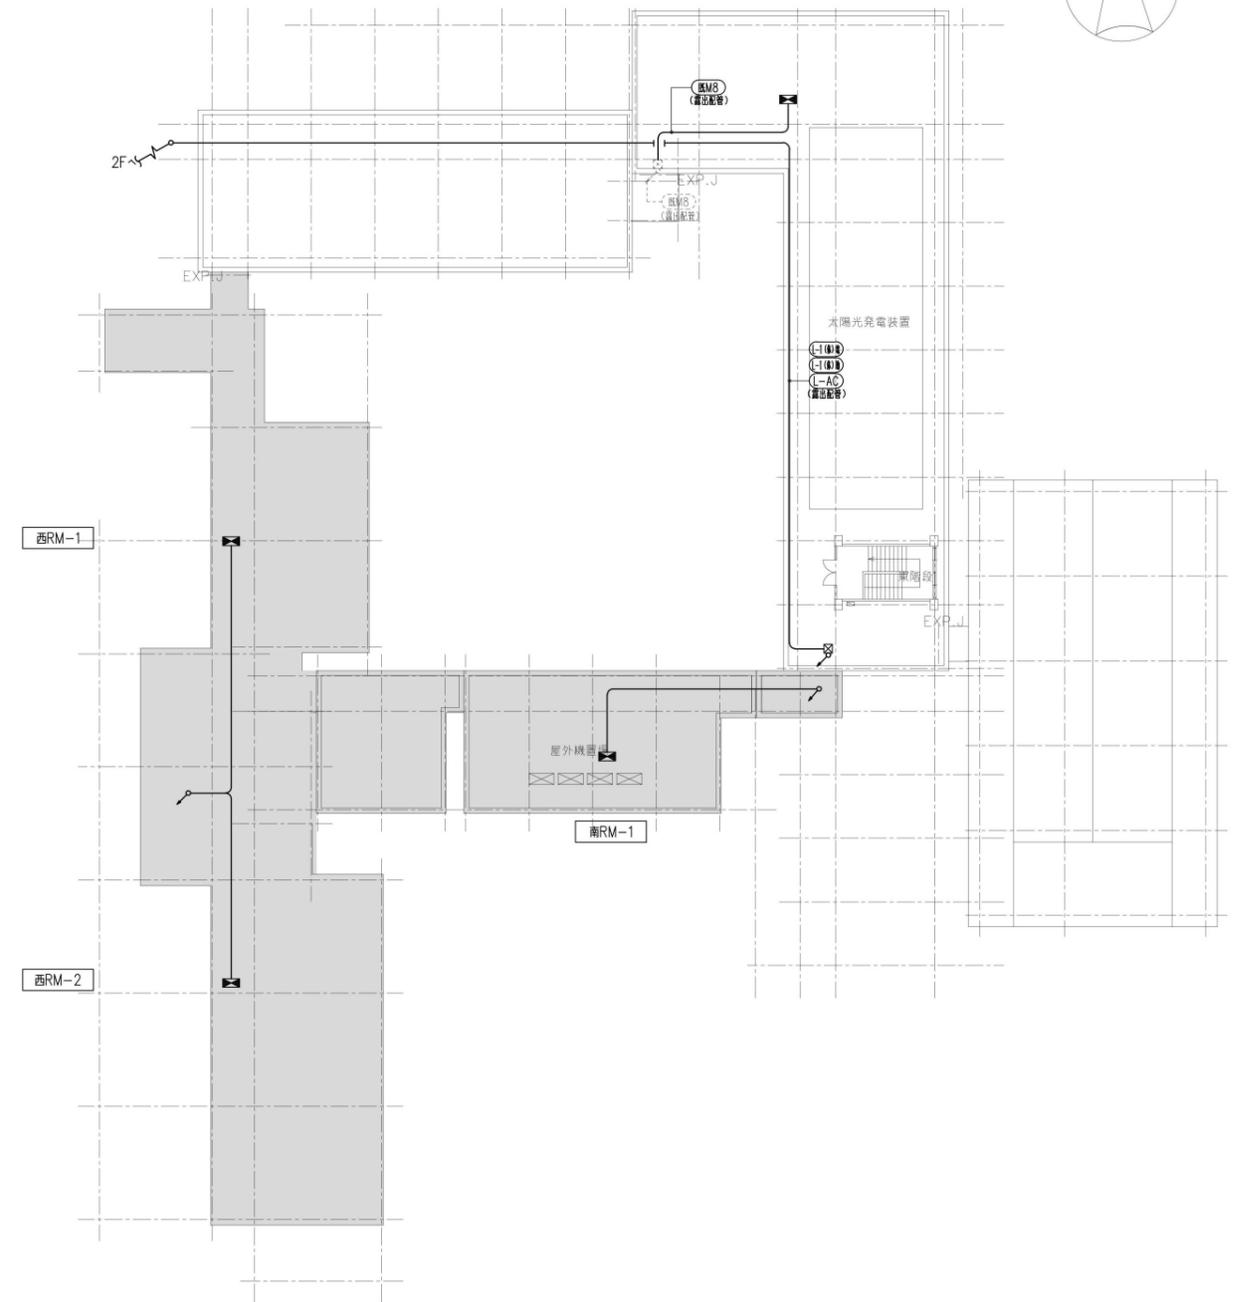


R階平面図 S=1/500

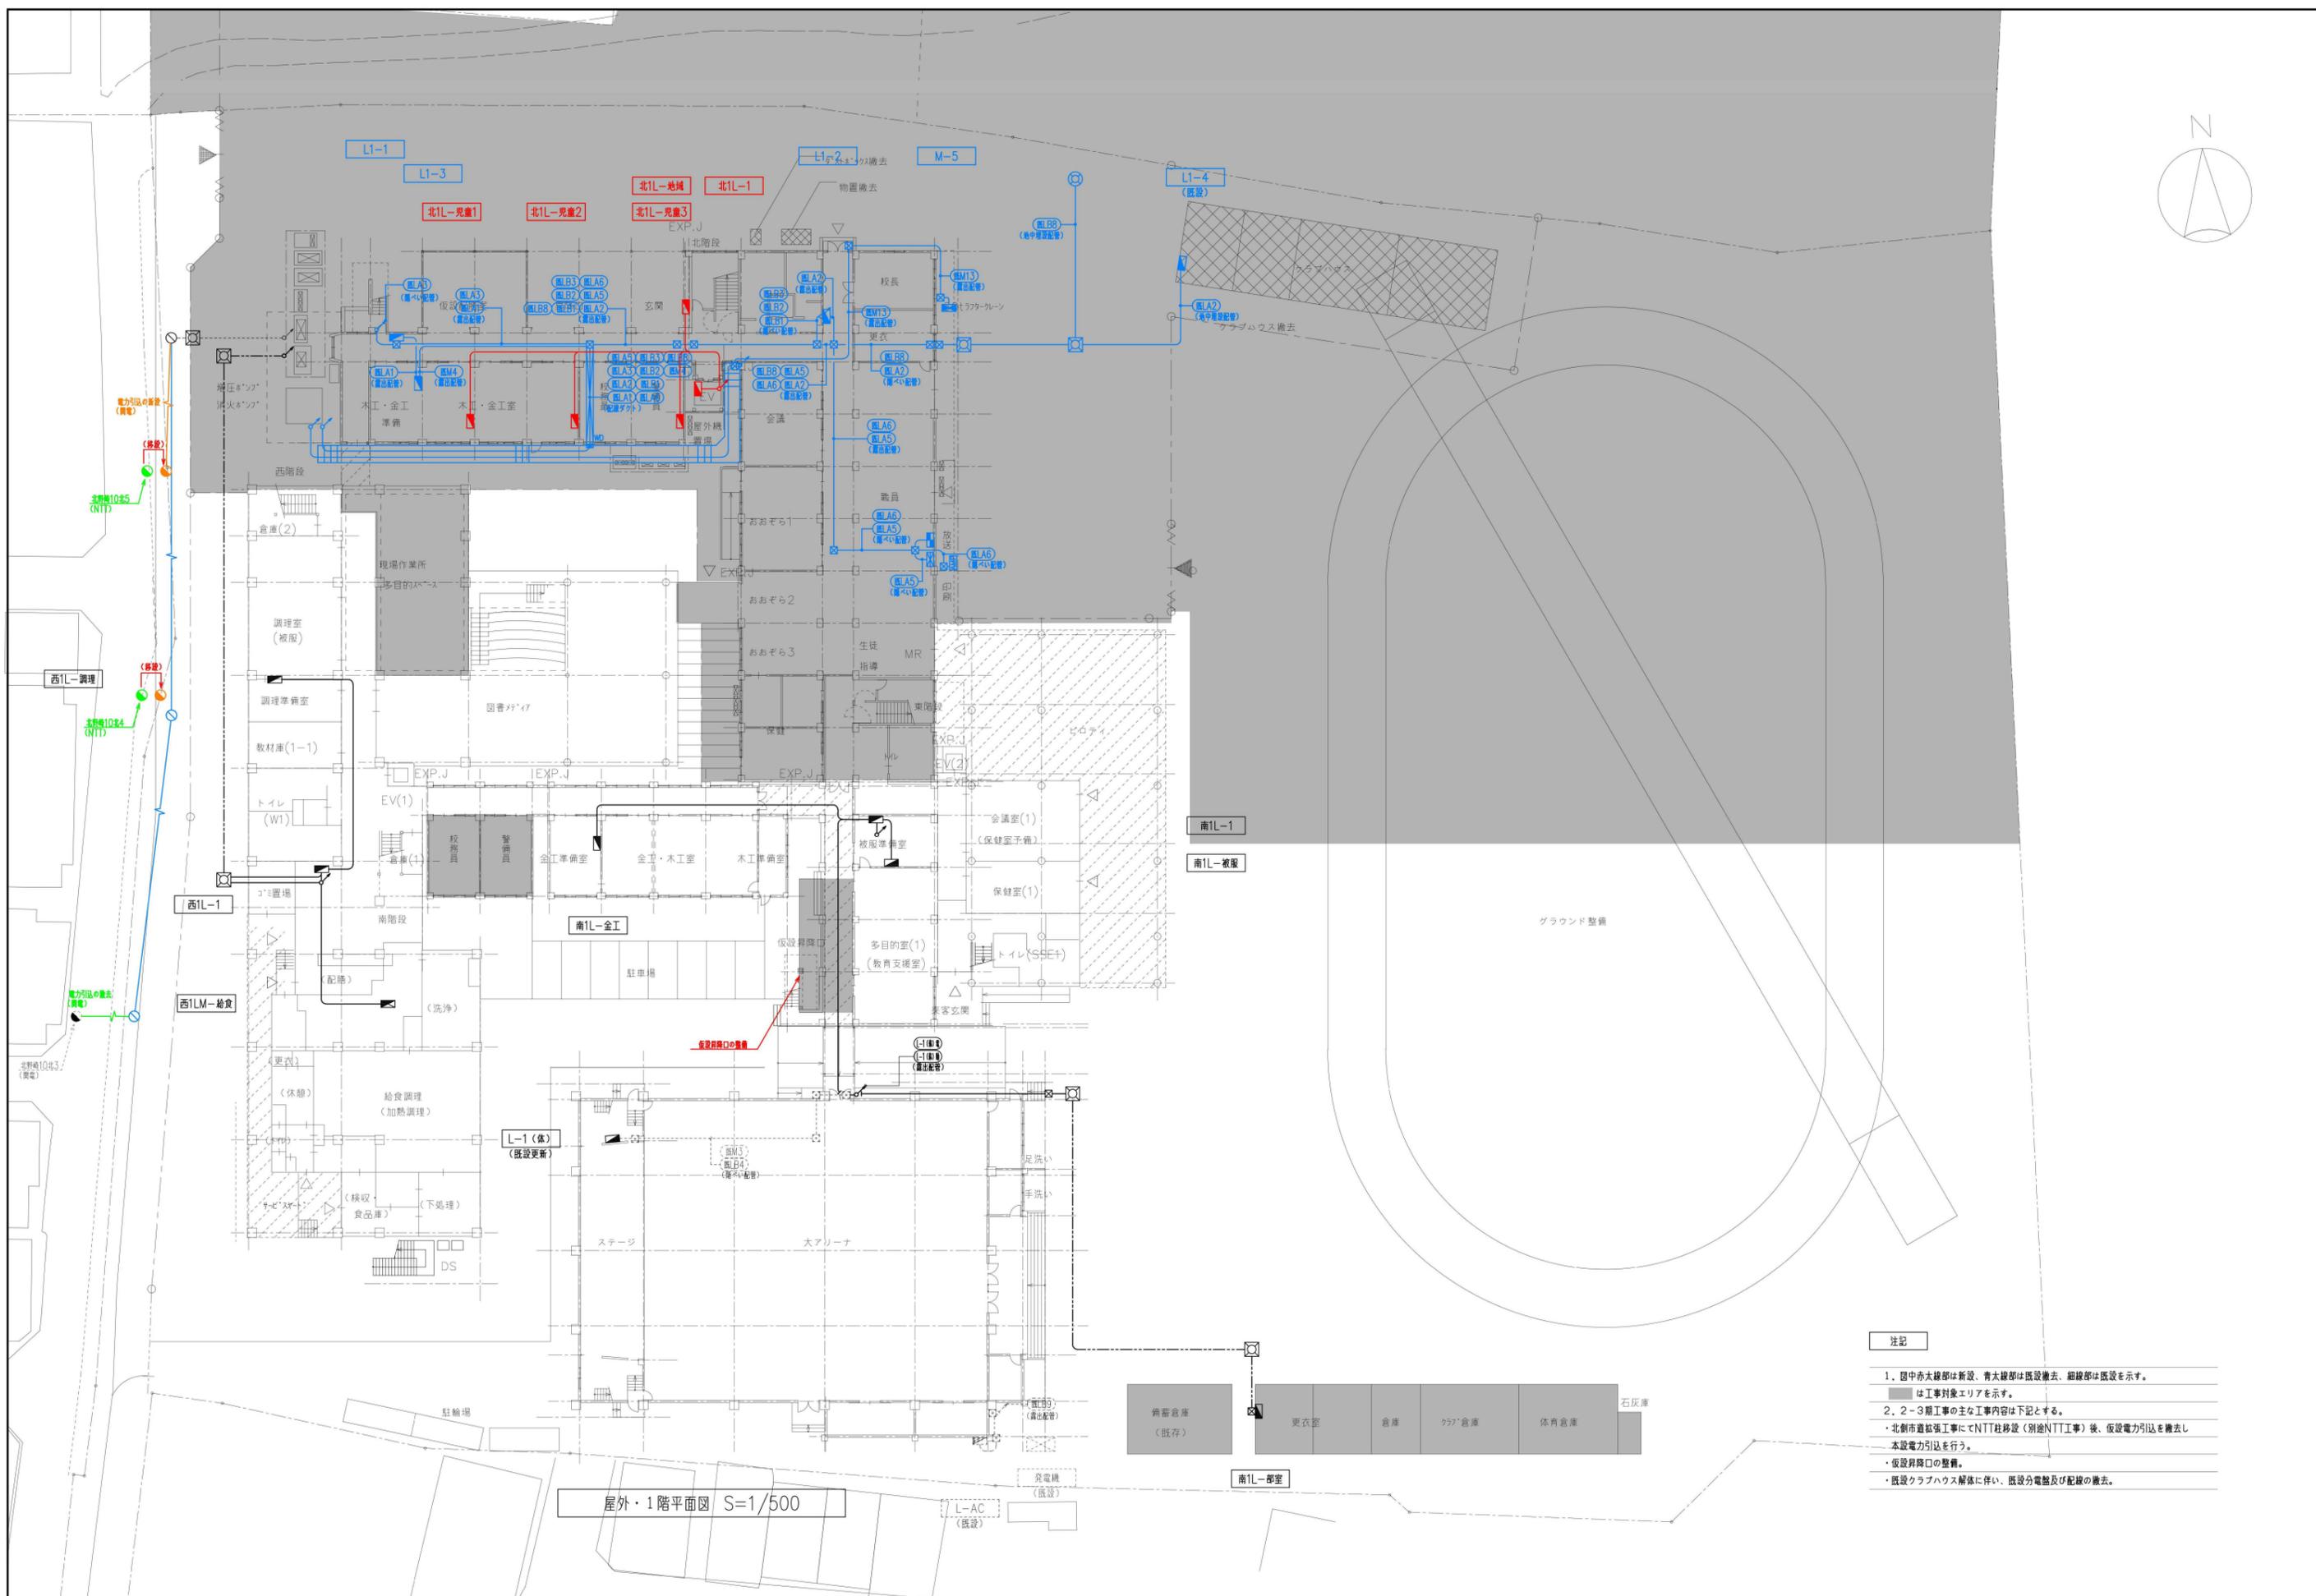


屋外・1階平面図 S=1/500


- 注記
1. 図中赤大線部は新設、青大線部は既設撤去、細線部は既設を示す。
 ■ は工事対象エリアを示す。
 2. 2-3階工事の主な工事内容は下記とする。
 ・北制市道拡張工事にてNTT社移設(別紙NTT工事)後、仮設電力引込を撤去し本設電力引込を行う。
 ・仮設昇降口の整備。
 ・既設クラブハウス解体に伴い、既設分電盤及び配線の撤去。

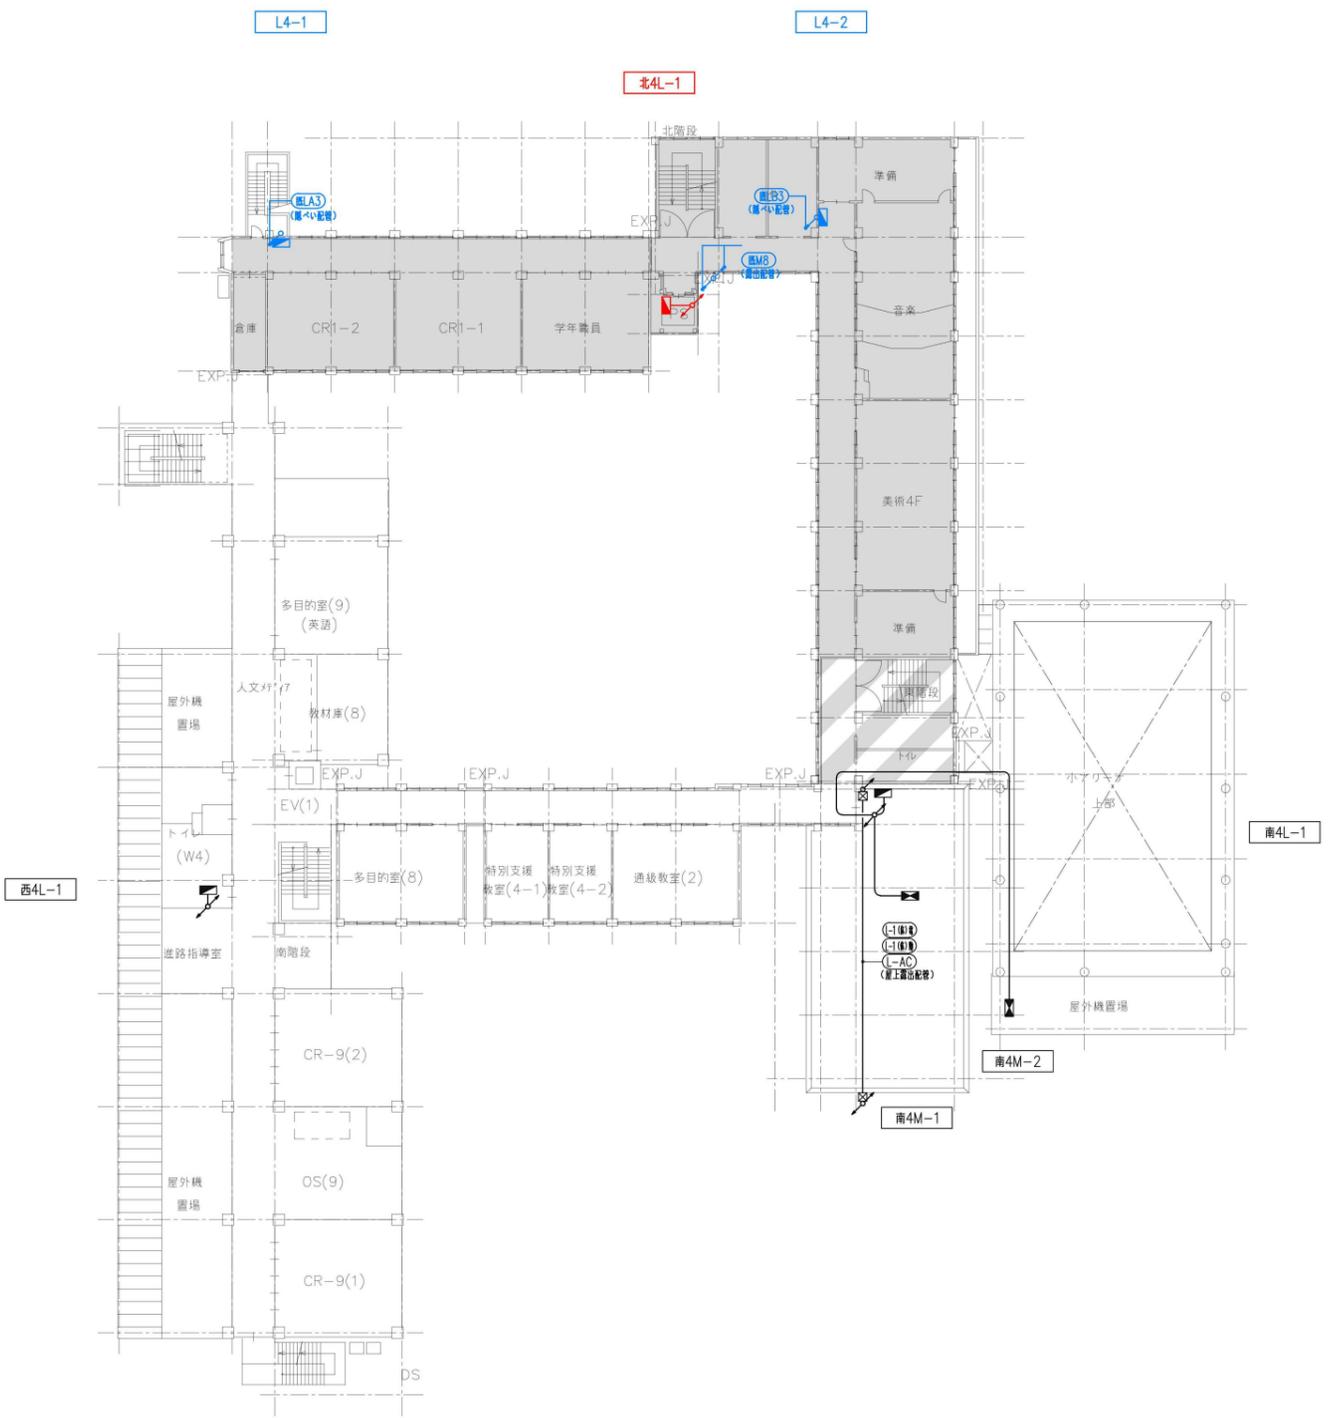

4階平面図 S=1/500

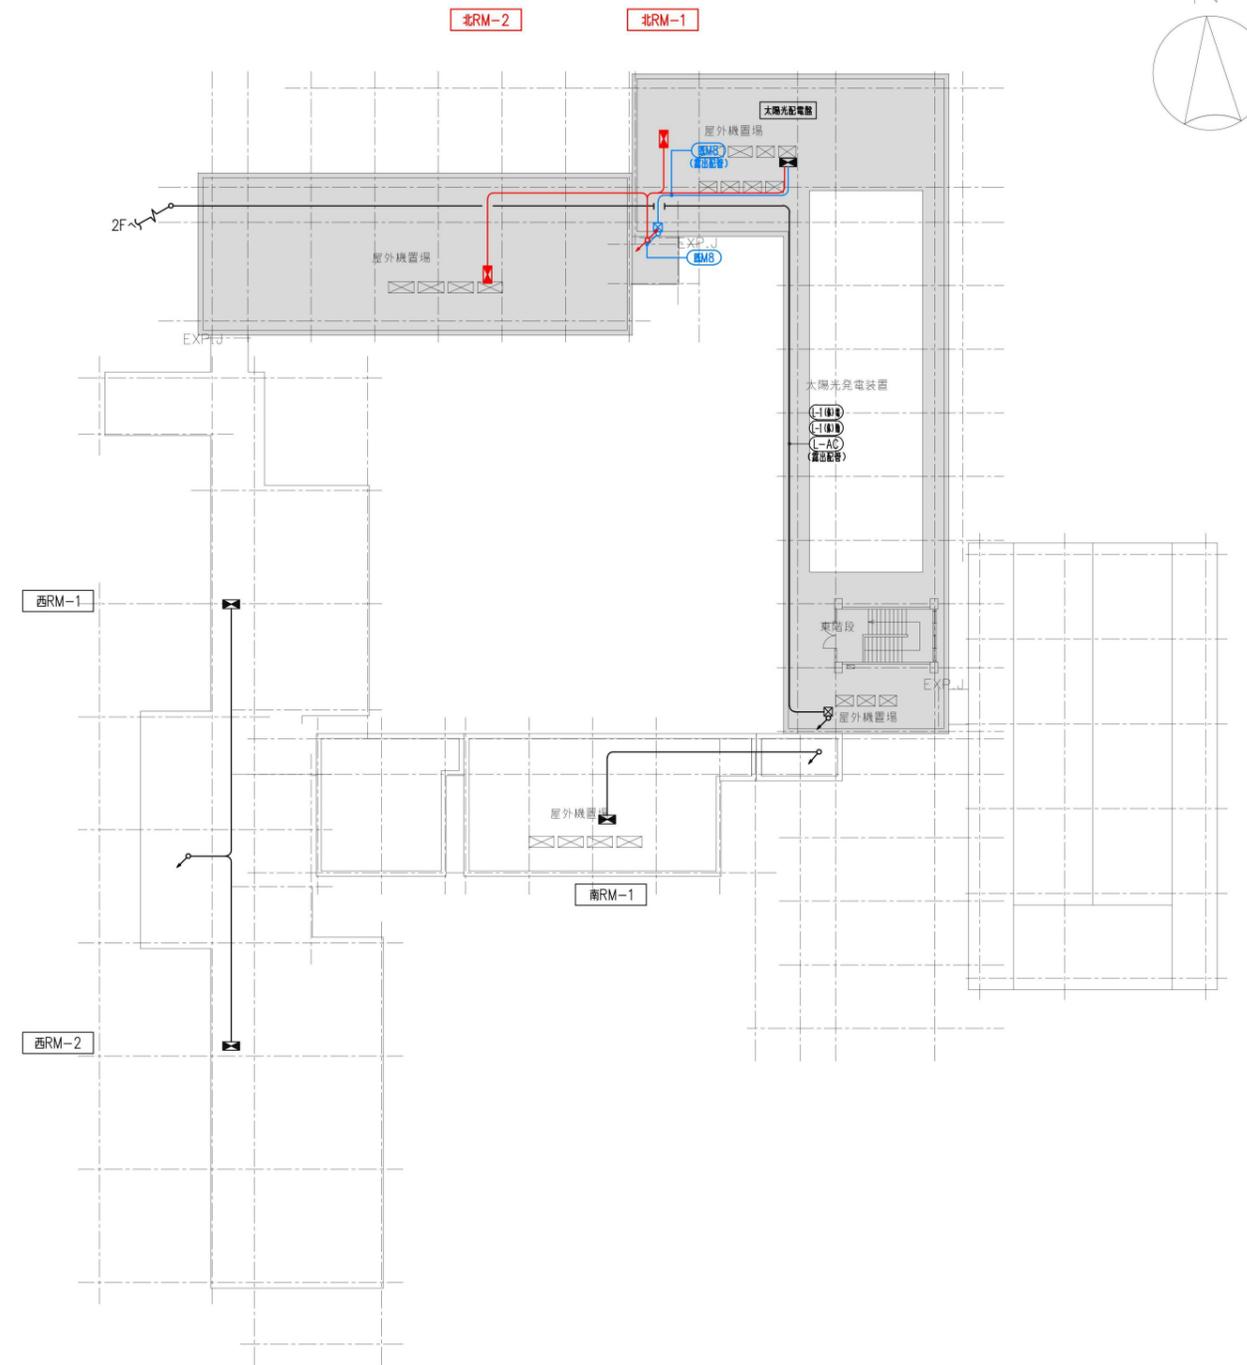

R階平面図 S=1/500

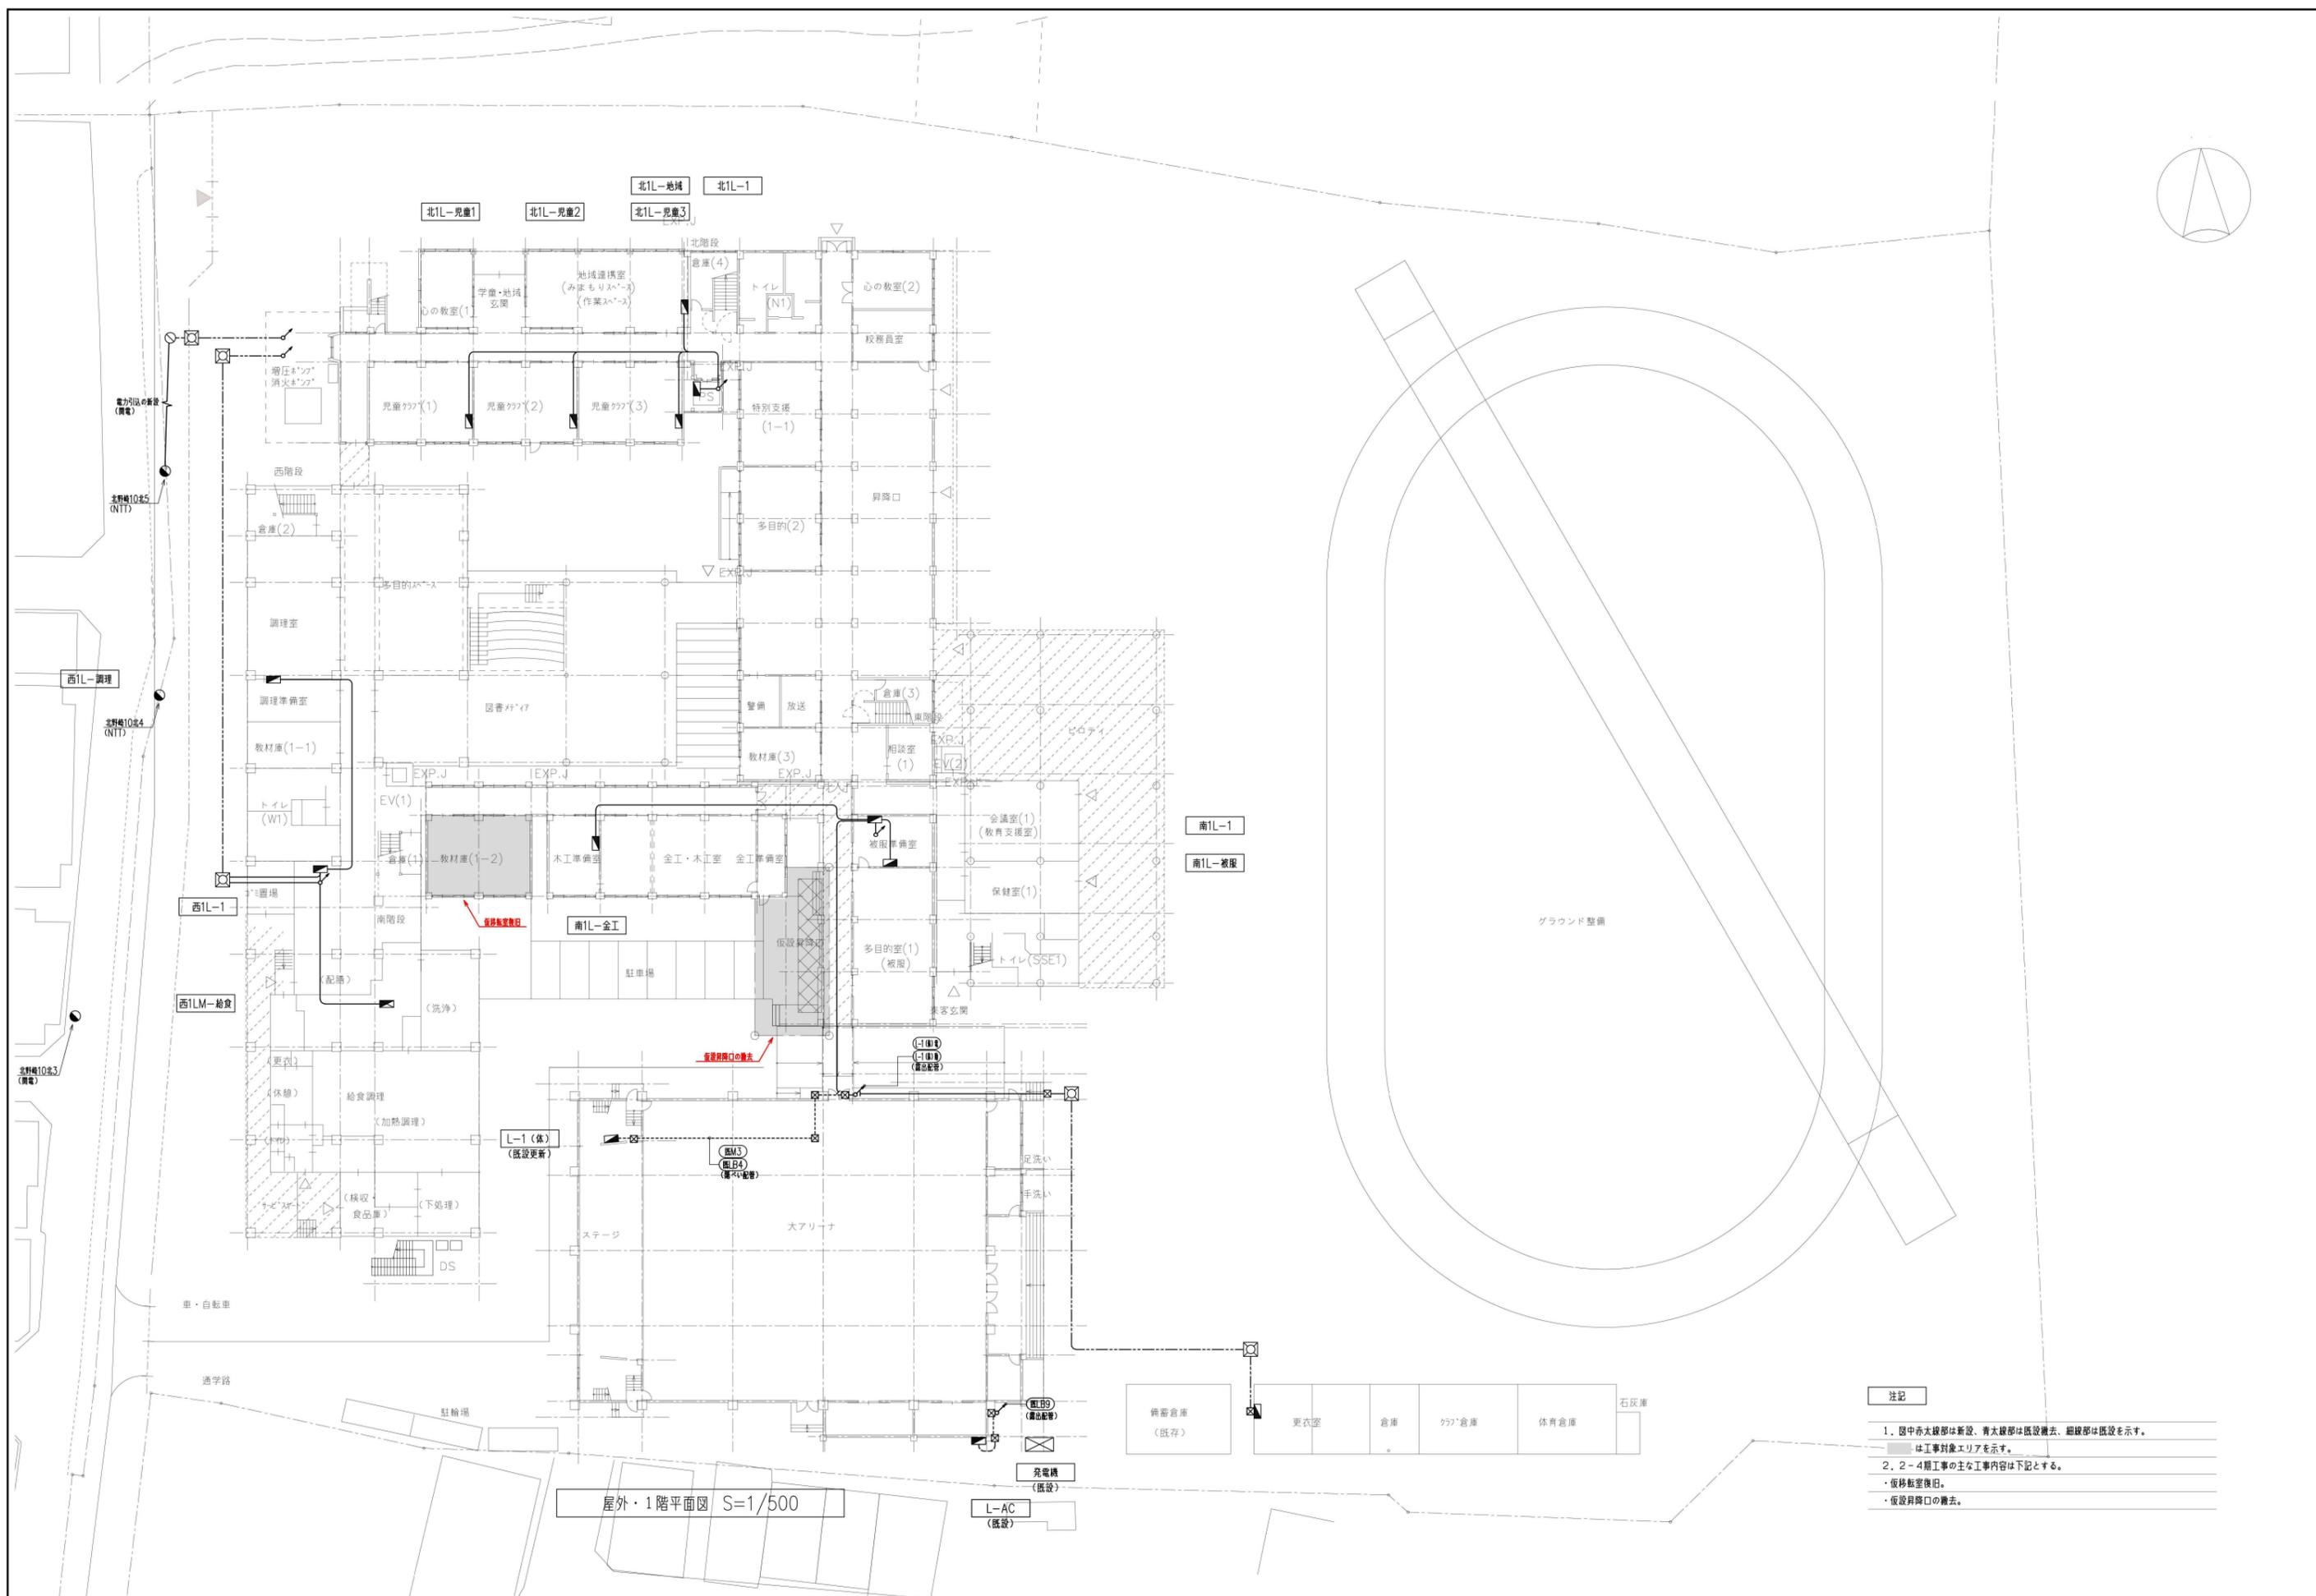

屋外・1階平面図 S=1/500

- 注記
1. 図中赤太線部は新設、青太線部は既設撤去、細線部は既設を示す。
 ■ は工事対象エリアを示す。
 2. 2-4期工事の主な工事内容は下記とする。
 ・仮移転室復旧。
 ・仮設昇降口の撤去。
